

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80120940666
Número de Referencia: 5369682
Cuenta Cargo: 65502576172
Titular: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Cuenta Abono/Móvil: 05832000000850940
Beneficiario: GRUPO CONSTRUCTOR HORUS SA DE CV
Importe: \$ 10,456.49
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: FACT 1808
Referencia Interbancaria:
Banco: BANREGIO
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 24/12/2019
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 24/12/2019
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar



Jocotepec
Gobierno Municipal

Jocotepec, Jal., a 17 de Diciembre de 2019

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago de Estimación No. "2 y finiquito"

Por este conducto le solicito realice los trámites de pago a nombre de; **Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.**, por la cantidad de **\$10,456.49 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.)** por concepto de pago de la estimación número 2 y finiquito del proyecto que describo:

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA:	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
PROGRAMA:	FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL/2019, , 6231-2.25.1-050-209
SE REALIZÓ EN:	EN UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO


Anexo:

1. Factura número
2. Verificación de factura
3. Estimación número 2 y finiquito

No. De Factura	Fecha de Factura	Cantidad de Factura	Sub total de factura	Retención del 5 al millar para contraloría	Neto a pagar
D-1808	27/11/2019	\$10,501.76	\$9,053.24	\$45.27	\$10,456.49

Sin más por agregar me despido enviándole un saludo.

ATENTAMENTE
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"


ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



c.p. Archivo
D.O.P./i.k.p.g.



Jocotepec
Gobierno Municipal

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago de Estimación No. "2 y finiquito"

Por este conducto le solicito realice los trámites de pago a nombre de; **Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.**, por la cantidad de **\$10,456.49 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.)** por concepto de pago de la estimación número 2 y finiquito del proyecto que describo:

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA:	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
PROGRAMA:	FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL/2019
SE REALIZÓ EN:	EN UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO

Anexo:

1. Factura número
2. Verificación de factura
3. Estimación número 2 y finiquito

No. De Factura	Fecha de Factura	Cantidad de Factura	Sub total de factura	Retención del 5 al millar para contraloría	Neto a pagar
D-1808	27/11/2019	\$10,501.76	\$9,053.24	\$45.27	\$10,456.49

Sin más por agregar me despido enviándole un saludo.

ATENTAMENTE
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"


ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



c.p. Archivo
D.O.P./i.k.p.g.

GRUPO CONSTRUCTOR
HORUS, S. A. DE C. V.

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

FACTURA ELECTRÓNICA



GCH9111273J4
(601) General de Ley Personas Morales
Manuel Rivera Cambas No. 3266
Col. Jardines De La Paz. C.P. 44860.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México.

Folio: D-1808

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (44860)

No. Certificado: 00001000000401177925

Receptor

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

IJJ850101KP8

Domicilio: PALACIO NACIONAL No. S/N

ol. Jocotepec Centro. C.P. 45800.

Jocotepec. Jocotepec, Jalisco, MEX.

Clave de CFI: (I01) Construcciones

Fecha de emisión: 2019-11-27T13:46:48

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o

diferido

Total del CFDI: \$ 10,501.76

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
AGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE GUA POTABLE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. No. DE CONTRATO GMJ 029C-OP/2019 CON CARGO AL PROGRAMA FAIS RAMO-33-2019 PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FAIS RAMO 33/2019 (231-2.25.1-050-209) RETENCIÓN .005 PARA CONTRALORIA \$45.27 NETO A PAGAR \$10,456.49	1	\$ 9,053.24	\$ 9,053.24

Clave de producto o servicio: 72151901 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 9,053.24	\$ 1,448.52

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,448.52

Subtotal	\$ 9,053.24
Total de impuestos trasladados	\$ 1,448.52
Total	\$ 10,501.76

Importe con letra:

DIEZ MIL QUINIENTOS UN PESOS 76/100 MXN



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-11-27T13:46:49 UUID: 54A6A816-30F5-487C-A808-B111ADAB467A

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

CraopV99MhXrrqYKHP71JoJe+z/x0f0GJiQpar4d5kMgnQeH262geLFP/Hv+1MplMVz+ITFcvogJW8M7TC148nt5uOBHxu181WtpjTTaHznU+vsV2L2Bdkq3H2luscW5yIfd8f3RhDCXVqD+ujucyv6iQjKX7nfwkNsTRsiM1b7Yc0RH5K8E9YLgo6YkgEuBEER5sdbq9flqnR4i/DX4kKNY0aeJv4i+0nDymPnuk8cdUyQq0ceU70bFyp4t9gxdXfwGsvFXniTqaJw9gKQrpBoeuJQ+DhLuXCCLQUuNDIPkzcSFxT/rDmn6JJELTHIBHCHcZA+TmdnMzyqm5PQ==

Sello digital del SAT:

gHWrtlluN1UzY2fYEOZpoG/Q2gDIEv8gbY0VGRySrv+1Frc5htneh2/U4vrcXxJmVSWD3SBqLFAxZUIM9/qLIHBFQyeCbLj074+V3b3qG+cEDcr1L0UHF08GRSultzH8sv/hDPi0eUZXmea0LYk6JmMvtZ3ORGORymR5GEB1XMrF0kpp4Fz+5eMVYFICPYqhr+39bLYmbpMnaatMPpk6llRd50Ox/N6BppyQ3lLko7X4lEX9SqbR1zBuxqpCihHhA4fzge4J8WYPwPXAnH5J3vVnG571muEhNSjYrGhOn3WS0kba6zcvLOSgiiEQjBdFWqkz/pd2Sy4chxzlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54A6A816-30F5-487C-A808-B111ADAB467A|2019-11-27T13:46:49|FCG840618N51|CraopV99MhXrrqYKHP71JoJe+z/x0f0GJiQpar4d5kMgnQeH262geLFP/Hv+1MplMVz+ITFcvogJW8M7TC148nt5uOBHxu181WtpjTTaHznU+vsV2L2Bdkq3H2luscW5yIfd8f3RhDCXVqD+ujucyv6iQjKX7nfwkNsTRsiM1b7Yc0RH5K8E9YLgo6YkgEuBEER5sdbq9flqnR4i/DX4kKNY0aeJv4i+0nDymPnuk8cdUyQq0ceU70bFyp4t9gxdXfwGsvFXniTqaJw9gKQrpBoeuJQ+DhLuXCCLQUuNDIPkzcSFxT/rDmn6JJELTHIBHCHcZA+TmdnMzyqm5PQ==||00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 44860 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 10,501.76 (DIEZ MIL QUINIENTOS UN PESOS 76/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (UESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

OMBRE: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO RFC: MJJ850101KP8

FACTURA: D-1808

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>




* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCH9111273J4	Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54A6A816-30F5-487C-A808-B111ADAB467A	2019-11-27T13:46:48	2019-11-27T13:46:49	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,501.76	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

Enlaces



GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.
 PASEO DE LAS PALMERAS 1432, RINCONADAS TABACHINES, TABACHINES, 45188, ZAPOPAN, JAL.
 RFC: GAC051206TQ3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
 PERÍODO: 13 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2019
 OBRA : REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 UBICACIÓN : JOCOTEPEC
 CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.
 FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIOROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA	M2	42.0000	42.0000	0.0000	42.0000	0.0000	\$7.75	\$325.50	\$0.00	\$325.50	\$0.00
EXCAVACIONES												
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.: INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	52.2000	52.2000	0.0000	52.2000	0.0000	\$97.99	\$5,115.08	\$0.00	\$5,115.08	\$0.00
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE: EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	25.2000	25.0000	0.0000	25.0000	0.2000	\$12.89	\$324.83	\$0.00	\$322.25	\$2.58
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES												
4	PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	25.2000	25.2000	0.0000	25.2000	0.0000	\$76.11	\$1,917.97	\$0.00	\$1,917.97	\$0.00
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR.; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	42.0000	42.0000	0.0000	42.0000	0.0000	\$270.34	\$11,354.28	\$0.00	\$11,354.28	\$0.00
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	52.2000	52.2000	0.0000	52.2000	0.0000	\$652.16	\$34,042.75	\$0.00	\$34,042.75	\$0.00
INSTALACION DE TUBERIA												
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO: INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	42.0000	42.0000	0.0000	42.0000	0.0000	\$169.01	\$7,098.42	\$0.00	\$7,098.42	\$0.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	24.0000	17.0000	7.0000	24.0000	0.0000	\$1,245.74	\$29,897.76	\$8,720.18	\$21,177.58	\$0.00
COMPLEMENTARIOS												
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	42.0000	0.0000	42.0000	42.0000	0.0000	\$7.93	\$333.06	\$333.06	\$0.00	\$0.00
SUMA								\$90,409.65	\$9,053.24	\$81,353.83	\$2.58	
IVA								\$14,465.54	\$1,448.52	\$13,016.61	\$0.41	
TOTAL								\$104,875.19	\$10,501.76	\$94,370.45	\$2.99	

ING. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS
 CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO
 LOCALIDAD: JOCOTEPEC
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
 GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.

CONTRATO:
 GMJ 029C-OP/2019

PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN:
 DEL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
 AL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA:
 24 DE NOVIEMBRE 2019

NÚMEROS GENERADORES

NUMERO DE ESTIMACIÓN:
 02 (DOS) FINIQUITO


NUMERO DE PAGINA:

1 DE 2

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
8	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.							7.00	7.00	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO									7.00	UNIDAD PZA

CROQUIS:

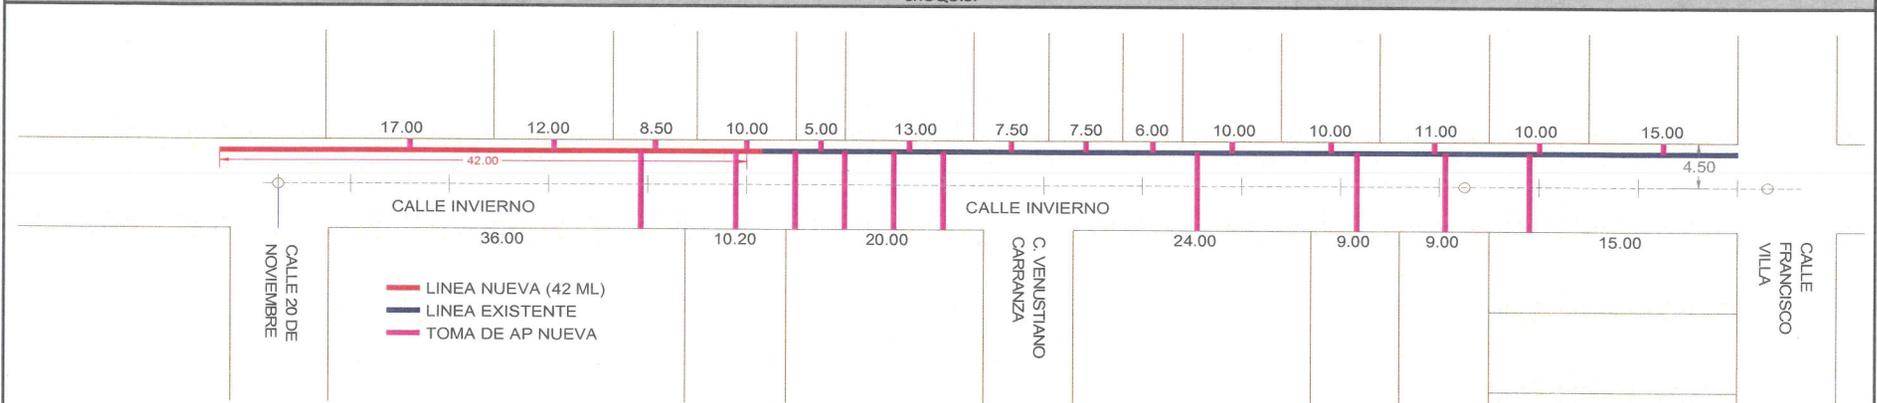

FOTOGRAFIAS:





ARQ. ARTURO DISTANCIA SÁNCHEZ
 RESIDENTE

GOBIERNO MUNICIPAL
 JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO LOCALIDAD: JOCOTEPEC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.	CONTRATO: GMJ 029C-OP/2019	NÚMEROS GENERADORES
	PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN: DEL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	NUMERO DE ESTIMACIÓN: 02 (DOS) FINIQUITO
	FECHA: 24 DE NOVIEMBRE 2019	NUMERO DE PAGINA: 2 DE 2

NÚMEROS GENERADORES										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA				42.00	1.00			42.00	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO									42.00	UNIDAD M2

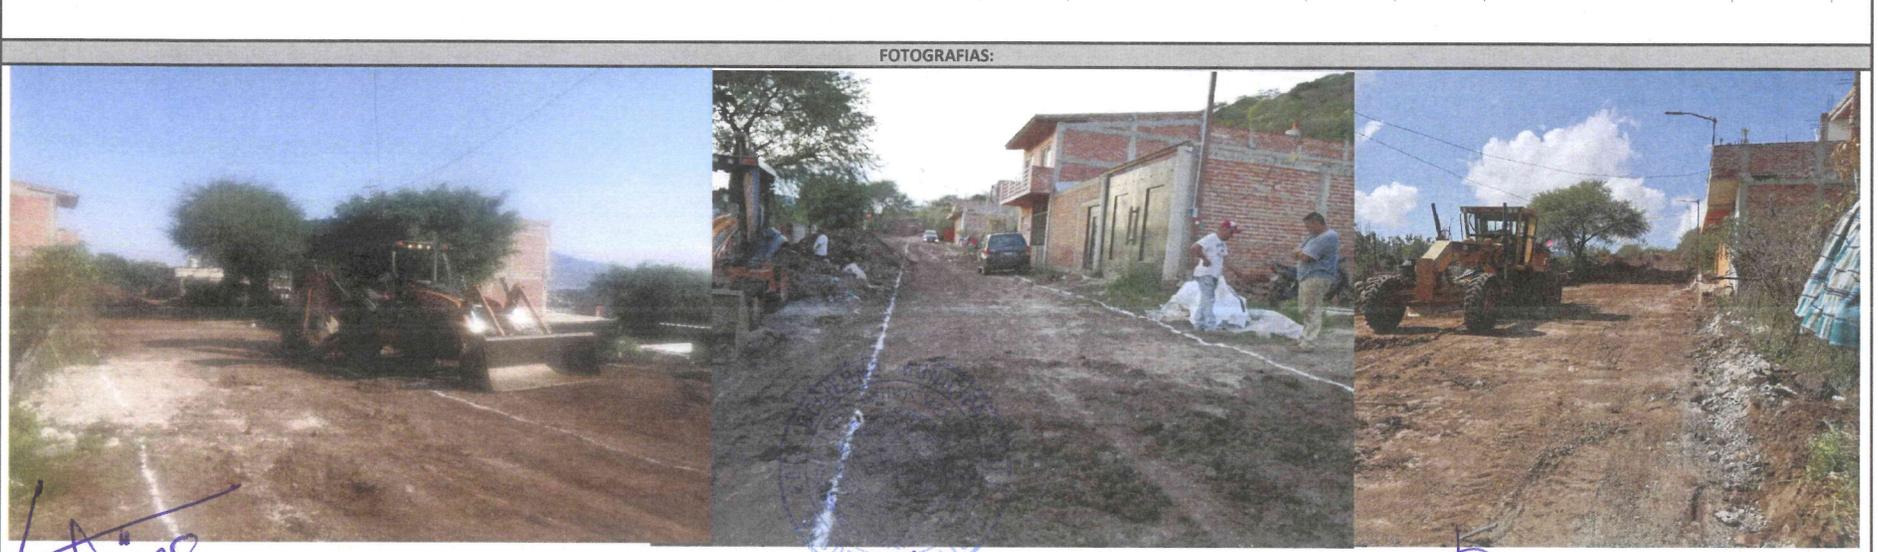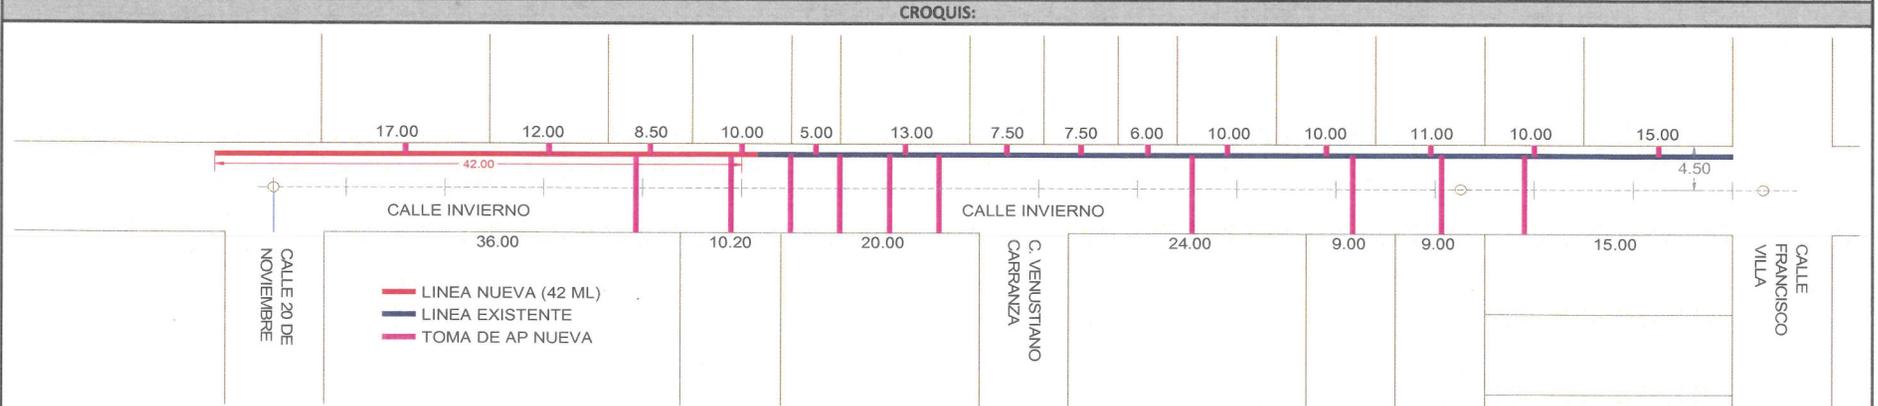

Arturo
 ARQ. ARTURO VISTANCIA SÁNCHEZ
 RESIDENTE


 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
