

Jocotepec
Gobierno Municipal

Administración-2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO NUMERO: 954/2019

Jocotepec, Jal., a 08 de Noviembre de 2019.

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago de Estimación No. "2" Finiquito.

Por este conducto le solicito realice los trámites de pago a nombre de; **Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.**, por la cantidad de **\$60,717.83 (SESENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 83/100 M.N.)** por concepto de pago de la estimación número 2 del proyecto que describo:

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE.
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
PROGRAMA:	FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL/2019
CODIFICACIÓN CONTABLE:	241-2-25.1-050-210 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
SE REALIZÓ EN:	EN UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO

Anexo:

1. Factura número D-1805
2. Verificación de factura
3. Estimación número 2 finiquito
4. Fianza de cumplimiento
5. Fianza de vicios ocultos
6. Minuta de terminación de obra
7. Acta de entrega y recepción de obra
8. Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones
9. Formato D32 de cumplimiento y obligaciones ante el SAT

No. De Factura	Fecha de Factura	Cantidad de Factura	Sub total de factura	Retención del 5 al millar para contraloría	Neto a pagar
D-1805	06/11/2019	\$60,980.68	\$52,569.55	\$262.85	\$60,717.83

Sin más por agregar me despido enviándole un saludo.

ATENTAMENTE
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"


ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

c.p. Archivo
D.O.P./i.k.p.g.

Página 1 | 1

GRUPO CONSTRUCTOR
HORUS, S. A. DE C. V.



Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

GCH9111273J4
(601) General de Ley Personas Morales
Manuel Rivera Cambas No. 3266
Col. Jardines De La Paz. C.P. 44860.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: D-1805

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (44860)

No. Certificado: 00001000000401177925

Receptor

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

IJJ850101KP8

Oficilio: PALACIO NACIONAL No. S/N

Ol. Jocotepec Centro. C.P. 45800.

Jocotepec. Jocotepec, Jalisco, MEX.

So de CFDI: (I01) Construcciones

Fecha de emisión: 2019-11-06T23:50:22

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 60,980.68

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
AGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LINEA DE PAVIMENTO EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.. No. DE CONTRATO GMJ 028 C-OP/2019 CON CARGO AL PROGRAMA RAMO 33-2019 PARTIDA PRESUPUESTAL 33/2019 (6241-2.25.1-050-210) RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$262.85 NETO A PAGAR \$60,717.83	1	\$ 52,569.55	\$ 52,569.55

Clave de producto o servicio: 72151906 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 52,569.55	\$ 8,411.13

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 8,411.13

Importe con letra:

SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 MXN

Subtotal	\$ 52,569.55
Total de impuestos trasladados	\$ 8,411.13
Total	\$ 60,980.68



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-11-06T23:50:23 UUID: ADD6C46D-CB14-417E-9B5E-928D59CA8312

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

ah9fcRTsxbtDgQfX0zk3+IT9sFjCE5jgRrHq+hv6D0I50P139JVAOSbQlhXuB4BmKwelpkw3Ym1Y5bcKFymOaerOhq8tzhhkeA3dMBaPhUJlJ62lQcNQMyWlqfzA/fF0ejn8U
XBvGxqPj2v+MOBF5gomxzHXOo5hmOnn10/vB4sJdQIWc2u3Ju3eYIMUMjmYC0eWvCjx12YBjDsfpxul/+SWXyQgdF5aqPQSw09eWZLjJQ75qfOPqZ++xK5ZogGT7WU
En/83m4AAJOZYHvPZFTyEVTq8ym1IESxANqLSNPwUkuHRbtsfgmWTi1zeolTaxRp4VyXRm1pSxw==

Sello digital del SAT:

TDQw9TklqcX/EXsgJ0aKDHkmlp9CBv4Lg5kETLjWzPofguOToutoGINAJEPIVMJunOd1NkxVhPHuwREGPwLvkMja9nX1VqMwTuuiMTkfTL4Blm6nML9KD07PXho
J/TTCV8J/10ya5ybYAlDgJreXNJ6DKrzVQJp7gGDwwJAJgqKETUX/XocdYhhi7BDI653T7f85nTpzAdSsRzhYiqpaeRQPdUaYVOJUAsxLhJ9rxRGnSig/2gZeeUEAQIUR8Z
wlafoIEVewDmJWEp1tK/kqsTuVIA6MLegLLVM+zipwG0/IMacQ1WEWRGJVYkp8DLaf04S9rUZ3zHB8yQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADD6C46D-CB14-417E-9B5E-928D59CA8312|2019-11-06T23:50:23|FCG840618N51|ah9fcRTsxbtDgQfX0zk3+IT9sFjCE5jgRrHq+hv6D0I50P139JVAOSbQlhXuB4BmKwelpkw3Ym1Y5bcKFymOaerOhq8tzhhkeA3dMBaPhUJlJ62lQcNQMyWlqfzA/fF0ejn8U
XBvGxqPj2v+MOBF5gomxzHXOo5hmOnn10/vB4sJdQIWc2u3Ju3eYIMUMjmYC0eWvCjx12YBjDsfpxul/+SWXyQgdF5aqPQSw09eWZLjJQ75qfOPqZ++xK5ZogGT7WUEn/83m4AAJOZYHvPZFTyEVTq8ym1IESxANqLSNPwUkuHRbtsfgmWTi1zeolTaxRp4VyXRm1pSxw==|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 44860 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 60,980.68 (SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 MXN) VALOR RECIBIDO MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

OMBRE: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO RFC: MJJ850101KP8

FACTURA: D-1805

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

MANUEL RIVERA CAMBAS No. 3266, COL. JARDINES DE LA PAZ TELS. 36-57-46-72 X 38-38-1389 FAX 36-57-46-72 C.P. 44860 GUADALAJARA, JAL. E-mail: gpothorus@hotmail.com
RFC: GCH911127314

[illegible]

GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.

MANUEL RIVERA CAMBAS No. 3266, COL. JARDINES DE LA PAZ TELS. 36-57-46-72 X 38-38-1389 FAX 36-57-46-72 C.P. 44860 GUADALAJARA, JAL. E-mail: gphorus@hotmail.com
RFC: GCH911127314

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINQUITO

PERÍODO: 23 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN: JOCOTEPEC

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.


FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRELIMINARES	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA ACTUAL		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA	M2	156.0000	166.0000	0.0000	166.0000	-10.0000	\$7.75	\$1,209.00	\$0.00	\$1,286.50	-\$77.50
EXCAVACIONES												
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	168.8400	233.4300	84.2400	317.6700	-148.8300	\$93.32	\$15,756.15	\$7,861.28	\$21,783.69	-\$13,888.82
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	109.2000	107.9000	64.8000	172.7000	-63.5000	\$11.72	\$1,279.82	\$759.46	\$1,264.59	-\$744.22
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES												
4	PLANTILLA DE 10 CM. ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SUPERVISION.	M2	109.2000	107.9000	0.0000	107.9000	1.3000	\$76.11	\$8,311.21	\$0.00	\$8,212.27	\$98.94
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM D ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL DE MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	156.0000	166.0000	54.0000	220.0000	-64.0000	\$270.34	\$42,173.04	\$14,598.36	\$44,876.44	-\$17,301.76
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	118.65	69.8100	12.2400	82.0500	36.5999	\$652.16	\$77,378.69	\$7,982.44	\$45,527.29	\$23,868.96
INSTALACION DE TUBERIA												
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	156.0000	166.0000	0.0000	166.0000	-10.0000	\$332.93	\$51,937.08	\$0.00	\$55,266.38	-\$3,329.30
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PIEZA	15.0000	9.0000	15.0000	24.0000	-9.0000	\$1,259.59	\$18,893.85	\$18,893.85	\$11,336.31	-\$11,336.31
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM; INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PIEZA	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$6,100.99	\$12,201.98	\$0.00	\$12,201.98	\$0.00
10	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR Y RESANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$807.26	\$807.26	\$0.00	\$807.26	\$0.00
COMPLEMENTARIOS												
11	LIMPIEZA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA	M2	312.0000	0.0000	312.0000	312.0000	0.0000	\$7.93	\$2,474.16	\$2,474.16	\$0.00	\$0.00


ING. FRANCISCO JAVIER RINCÓN FARIAS
CONTRATISTA


ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESOTO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

	MUNICIPIO: JUCOTEPEC, JALISCO		CONTRATO: GMJ 028C-07/2019		NÚMEROS GENERADORES	
	LOCALIDAD: JUCOTEPEC					
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					
	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:					
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE JUCOTEPEC, JALISCO.			PERIODO DE ESTA ESTIMACION: DEL: 23 DE OCTUBRE DE 2019 AL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019		NUMERO DE ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.			FECHA: 06 DE NOVIEMBRE 2019		NUMERO DE PAGINA: 2 DE 6	


NUMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
		EJE	TRAMO						
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.				4.50	0.60		24.00	64.80
TOTAL DE ESTE CONCEPTO									64.80
UNIDAD M2									

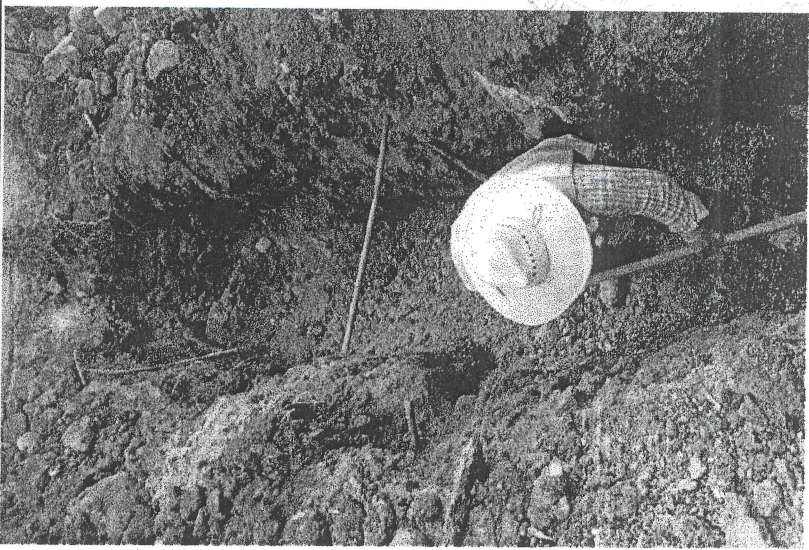

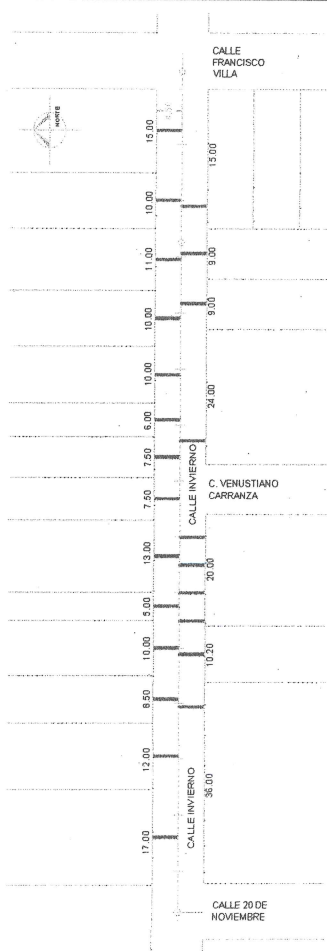


FOTOGRAFIAS:



CROQUIS:


 ARQ. ARTURO DISTANCIA SÁNCHEZ
 RESIDENTE


 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO		CONTRATO: GMAJ 028C-OP/2019		NÚMEROS GENERADORES	
	LOCALIDAD: JOCOTEPEC		PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN: DEL: 23 DE OCTUBRE DE 2019 AL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019		NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 02 (FINQUITO)	
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		FECHA: 08 DE NOVIEMBRE 2019		NÚMERO DE PÁGINA: 6 DE 6	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.						

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA			156.00			2.00	312.00	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO									312.00
CROQUIS:									UNIDAD M2

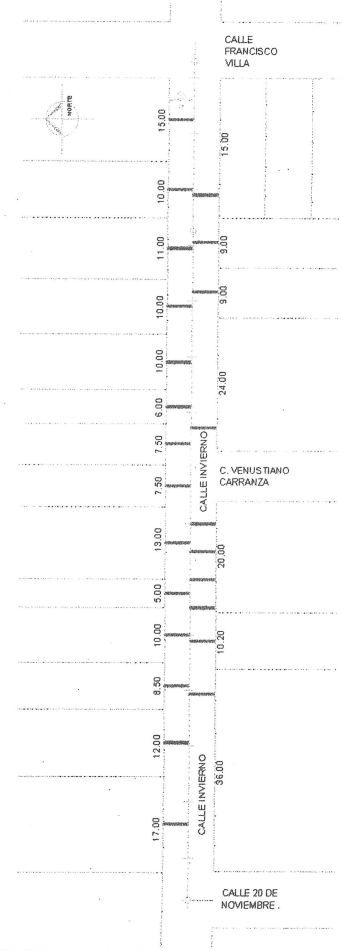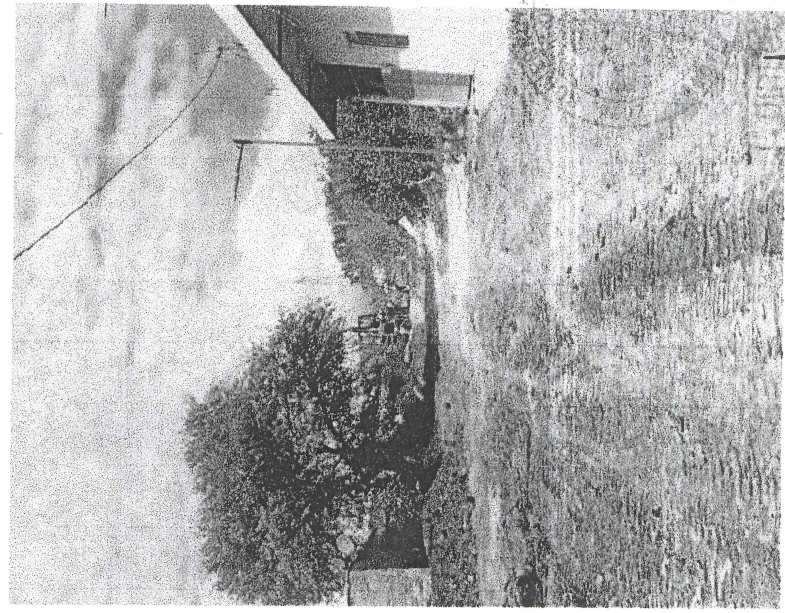

ARQ. ARTURO DISTANCIA SÁNCHEZ
 RESIDENTE

ING. AGUSTÍN IBARRA RAMÍREZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
