

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	6E985FAB-8E9E-40E3-93A5-AE5C208FBB48
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000412111132
Fecha y hora de certificación	2019-10-24T13:35:21
Régimen fiscal	601. General de Ley Personas Morales
Expedición	44160

Folio/Serie	010686E
Fecha y hora de emisión	2019-10-24T13:35:21
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	03 TRANSFERENCIA
Condiciones de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3
No. de cuenta de pago	****



Emisor

IAM170306RP6 INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA DE CV

LOPEZ COTILLA, 1554, INT. 101
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

LOPEZ COTILLA, 1554, INT. 101
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

MJJB50101KP8 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

PALACIO MUNICIPAL, S/N,
COL. CENTRO, C.P. 45800
JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
72141700	E48	SERVICIO		1.00	PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2a. ETAPA, EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" No. CONTRATO GMJ034COP/2019 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$356.47 NETO A PAGAR \$82,343.61	\$0.00	\$71,293.17	\$71,293.17

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	71293.17	TASA	0.160000	11406.91

Importe con letra *** OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N. ***

Subtotal \$71,293.17

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	11406.91

Impuestos trasladados \$11,406.91

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$82,700.08

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6E985FAB-8E9E-40E3-93A5-AE5C208FBB48|2019-10-24T13:35:21|SFE0807172W8j|TnU7KqZn9BLasBlpccjrDwRCKVfnD+uZOMLmqP4Mlz6muZOP9BFGAbMuJugyvWExYw8vT2H6St49SztXKMjar7NHq6nOKs6wxRVpvggFndjoXwpUp8tOc54GVV1gPEK/RWUyKv9J|erLyVDD8G|KT8K55h|nBPL0nHbv+2D|UT05UCGwv9mXyT5a5+hKUE5WSIQGzsdwrallygUqFn8fYL9GKzYQwqWVj9omc+RqxUc3Xy5QgR+b5EUo5Uf/U5AZF32tU/8yrc3z0QZjPqTt/Uavif0r2kz+luBqqVGYofngngsRQbqQIUzsfBj9NPU4jowkzNKScXbBi8nAQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

TnU7KqZn9BLasBlpccjrDwRCKVfnD+uZOMLmqP4Mlz6muZOP9BFGAbMuJugyvWExYw8vT2H6St49SztXKMjar7NHq6nOKs6wxRVpvggFndjoXwpUp8tOc54GVV1gPEK/RWUyKv9J|erLyVDD8G|KT8K55h|nBPL0nHbv+2D|UT05UCGwv9mXyT5a5+hKUE5WSIQGzsdwrallygUqFn8fYL9GKzYQwqWVj9omc+RqxUc3Xy5QgR+b5EUo5Uf/U5AZF32tU/8yrc3z0QZjPqTt/Uavif0r2kz+luBqqVGYofngngsRQbqQIUzsfBj9NPU4jowkzNKScXbBi8nAQ==

Sello Digital del SAT

UotC6o+xiXLTBOPy6Z0gn7Gp3x4Z7ufbmt03XBAT7ofDf59C7zoAFye/dv34RwPzpA9PpmyusNRAScSbaGmWMCBAnFu8M25h8Qcnp5ZZDST4KsEPB9yRE1Hf650wTYaaLeOjjo5yJ5Y8lrs0Dt0jPajRpwci8fVx5730HpXSVWFotV914c5|Y|b|ON|H|N|e|Ar|9|ns|K|W|w|Y|0|k|Q|E|B|E|Rs|3|0|G|B|9|c|EN|w|5|5|tk|R|p|q|n|n|ov|7|kd|Y|gl|3|Q|Y|8|H|Y|2|y|D|y|9|b|L|O|a|J|os|Q|T|O|Q|sn|Se|E|B|O|Z|0|B|Y|H|T|N|D|v|r|O|u|B|G|U|H|3|6|9|W|P|3|b|B|U|K|1|q|5|2|w|c|c|H|C|7|ez|hs|B|Aw|0|1|Z|C|p|v|K|0|0|t|w|==



[Handwritten Signature]
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 0034C 0P/2019

DRENAJE

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

OBRA : OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.



UBICACIÓN : UBICACIÓN: DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

FECHA: 24 DE OCTUBRE

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
PRELIMINARES													
1	TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	55.00	0.0000	55.00	55.00	0.00	\$12.70	\$ 698.50	\$ 698.50	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES									\$ 698.50				
EXCAVACIONES													
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	61.81	0.0000	61.81	61.81	0.00	\$102.32	\$ 6,324.40	\$ 6,324.40	\$ -	\$ -	
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	38.50	0.0000	38.50	38.50	0.00	\$26.14	\$ 1,006.39	\$ 1,006.39	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES									\$ 7,330.79				
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES													
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	38.50	0.0000	38.50	38.50	0.00	\$90.14	\$ 3,470.39	\$ 3,470.39	\$ -	\$ -	
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	55.00	0.0000	55.00	55.00	0.00	\$156.79	\$ 8,623.45	\$ 8,623.45	\$ -	\$ -	
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	38.71	0.0000	38.71	38.71	0.00	\$217.00	\$ 8,400.07	\$ 8,400.07	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES									\$ 20,493.91				
INSTALACION DE TUBERIA													
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	55.00	0.0000	55.0000	55.00	0.00	\$ 279.93	\$ 15,396.15	\$ 15,396.15	\$ -	\$ -	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	8.00	0.0000	8.0000	8.00	0.00	\$ 1,427.29	\$ 11,418.32	\$ 11,418.32	\$ -	\$ -	
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	0.0000	2.0000	2.00	0.00	\$ 6,707.10	\$ 13,414.20	\$ 13,414.20	\$ -	\$ -	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 0034C 0P/2019

CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

UBICACIÓN: DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. UNICA FINIQUITO DRENAJE




FECHA: 24 DE OCTUBRE

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES	
1	PRELIMINARES					
2	EXCAVACIONES				\$	698.50
3	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$	7,330.79
4	INSTALACION DE TUBERIA				\$	20,493.91
5	COMPLEMENTARIOS				\$	41,625.97
					\$	1,144.00
					\$	71,293.17
					\$	-
	SUBTOTAL.				\$	71,293.17
	I. V. A. 16%				\$	11,406.91
	SUMA				\$	82,700.08
	MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)				\$	-
	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)				\$	356.47
	NETO A PAGAR				\$	82,343.61
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:		
ASIGNACIÓN		\$ 71,293.18	\$ 11,406.91	\$ 82,700.09		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN		\$ 71,293.17	\$ 11,406.91	\$ 82,700.08		
ACUMULADO ANTERIOR		\$ -	\$ -	\$ -		
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 71,293.17	\$ 11,406.91	\$ 82,700.08		
SALDO POR EJERCER		\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01		
SIN ANTICIPO						
ANTICIPO %		\$ -	\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.		\$ -	\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$ -	\$ -	\$ -		
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ -	\$ -	\$ -		
RESIDENTE DE OBRA					CONTRATISTA	
C. RAFAEL ASCENCIO					INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.	
SUPERVISOR DE OBRA					DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN					ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	



9	CONCEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE : ROMPER CONECTAR, Y REANAR, ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.00	0.00	\$ 1,397.30	\$ 1,397.30	\$ 1,397.30	\$ -	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE INSTALACION DE TUBERIA										\$ 41,625.97		
COMPLEMENTARIOS												
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INC. HERRAMIENTA. MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	110.00	0.0000	110.0000	110.00		\$ 10.40	\$ 1,144.00	\$ 1,144.00	\$ -	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS										\$ 1,144.00		
								TOTAL	\$ 71,293.17	\$ 71,293.17	\$ -	\$ -

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.
CONTRATISTA

LIQ. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 1/11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO



MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SECCION 1	LARGO	ANCHO	TOTAL
	55.00	1.0000	55.00

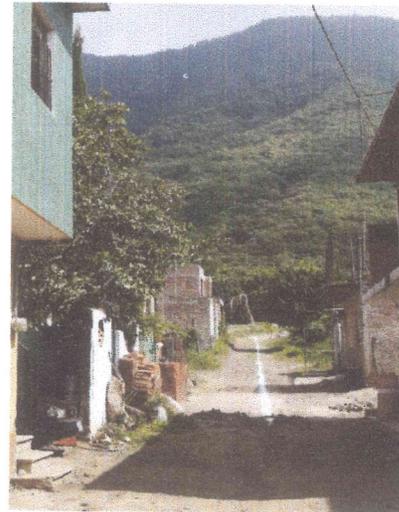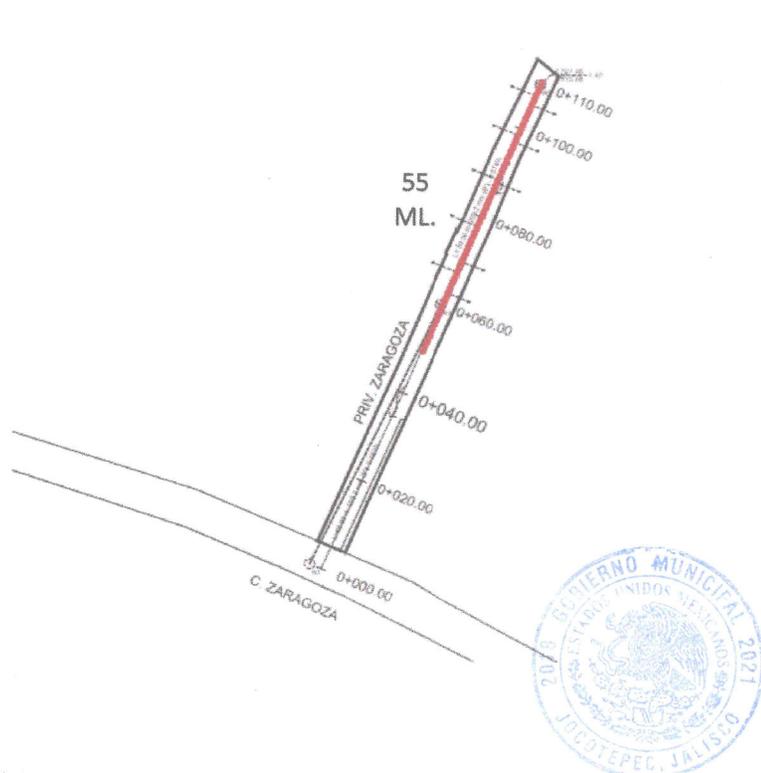

TOTAL M2: 55

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

SUPERVISOR DE OBRA

C. RAFAEL ASCENCIO

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 2 / 11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION

	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	TOTAL
SECCION 1	55.00	0.7000	1.3000		50.05
DESCARGAS	3.50	0.7000	0.6000	8.00	11.76

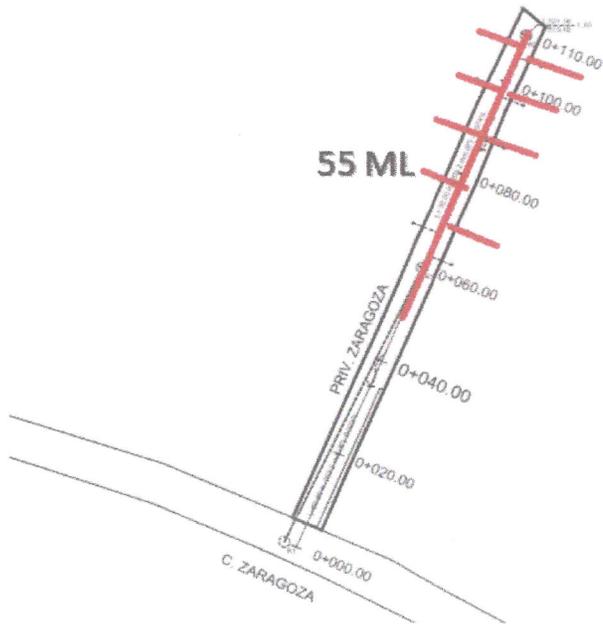

TOTAL M3: 61.81

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

C. RAFAEL ASCENCIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 3 / 11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA

SECCION 1	LARGO	ANCHO	TOTAL
	55.00	0.7000	38.50

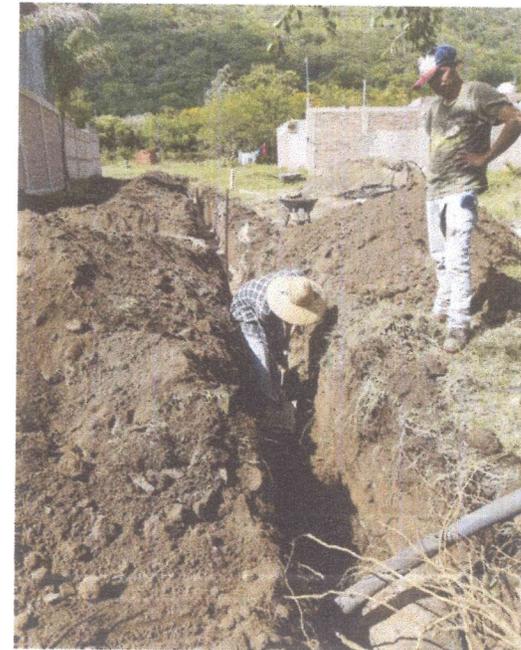

TOTAL M2: 38.5

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

SUPERVISOR DE OBRA

C. RAFAEL ASCENCIO

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 4 / 11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: ÚNICA
FINICILITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

SECCION 1	LARGO	ANCHO	TOTAL
	55.00	0.7000	38.50

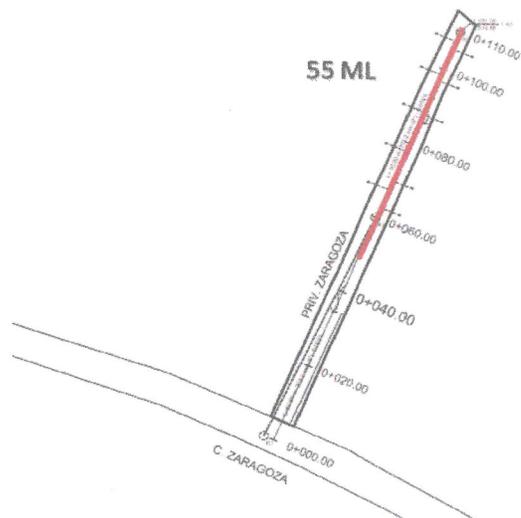

TOTAL M2: 38.5

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

SUPERVISOR DE OBRA

C. RAFAEL ASCENCIO

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 5 /11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO



MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019


NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

LARGO	ANCHO	TOTAL
55.00	1.0000	55.00

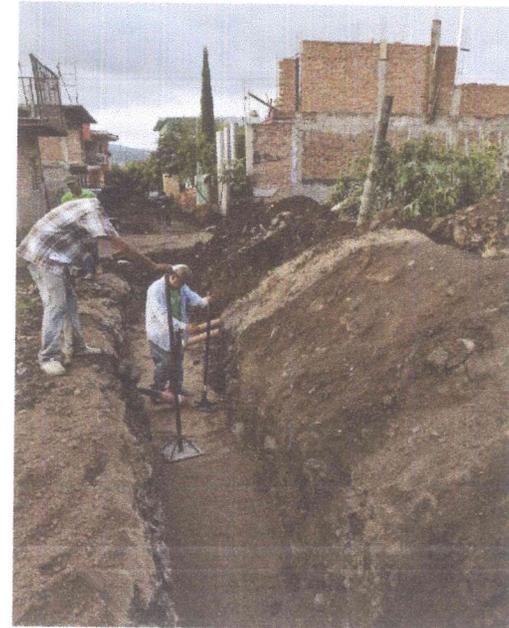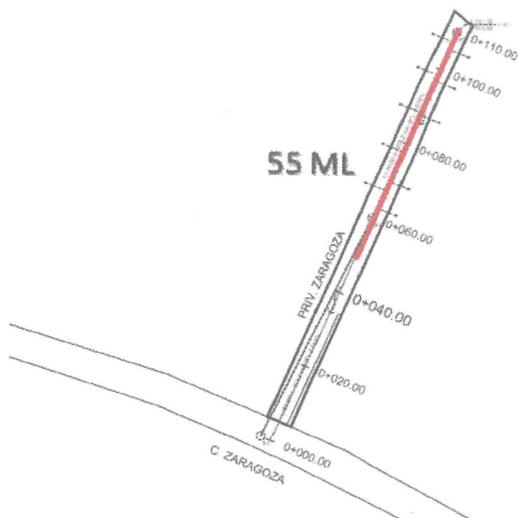

NIVEL DE TERRACERIA



TOTAL ML: 55.00

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

C. RAFAEL ASCENCIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 6 /11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: ÚNICA FINIQUITO



MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVIZION

	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	TOTAL
SECCION 1	50.00	0.7000	0.7000		24.50
DESCARGAS	3.63	0.7000	0.7000	8.00	14.23

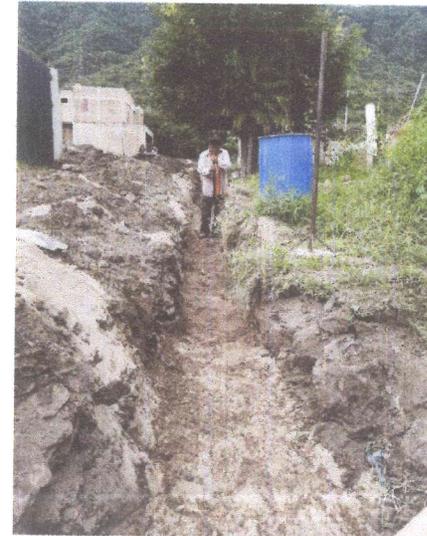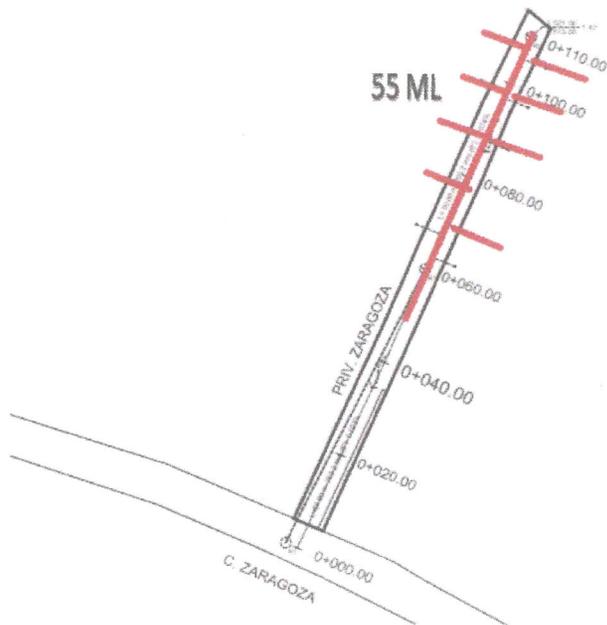

TOTAL M3: 38.71

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

C. RAFAEL ASCENCIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 7 / 11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

SECCION 1	LARGO	TOTAL
	55.00	55.00



TOTAL ML: 55

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

C. RAFAEL ASCENCIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 8 / 11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

PZA. TOTAL

DESCARGAS

10.00

8.00

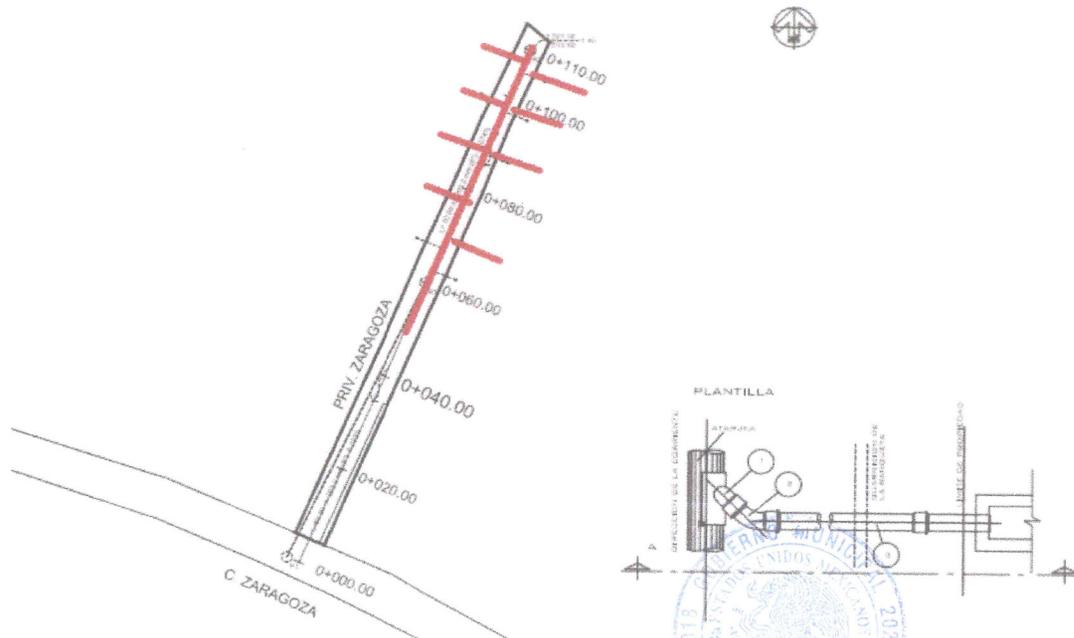

TOTAL PZA: 8.00

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

C. RAFAEL ASCENCIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 9 / 11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019




NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

PZA

TOTAL

2.00

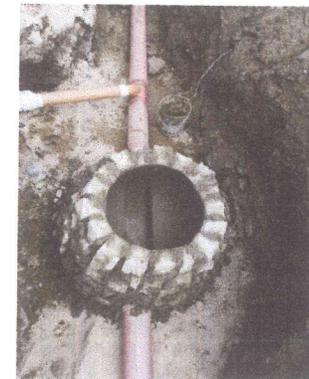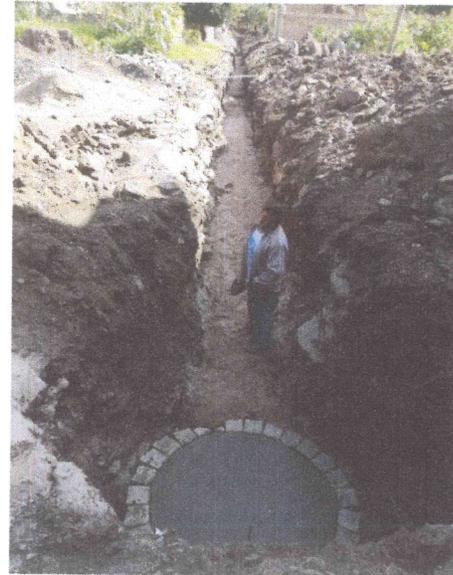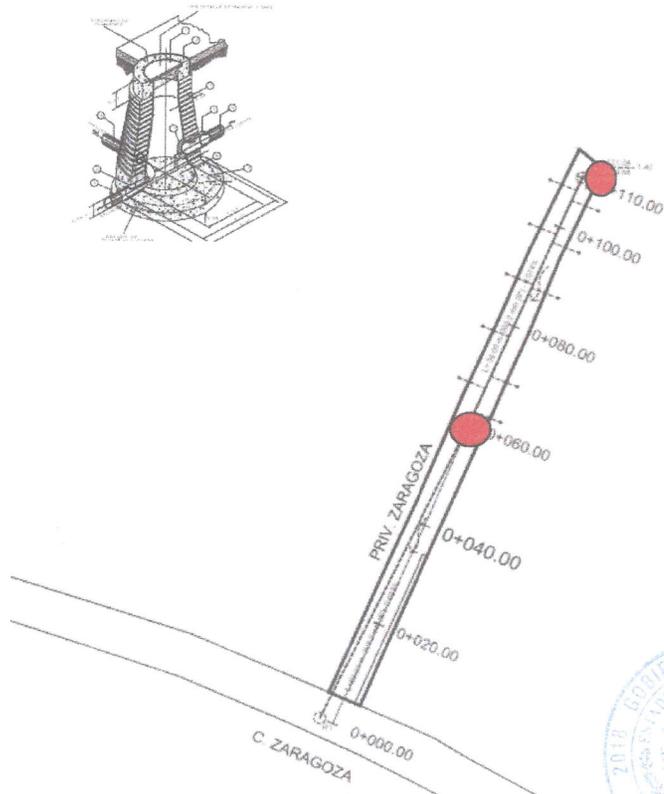

TOTAL PZA: 2.00

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

C. RAFAEL ASCENCIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 10 / 11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.



PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE : ROMPER CONECTAR, Y REANAR, ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA

PZA
1

TOTAL
1

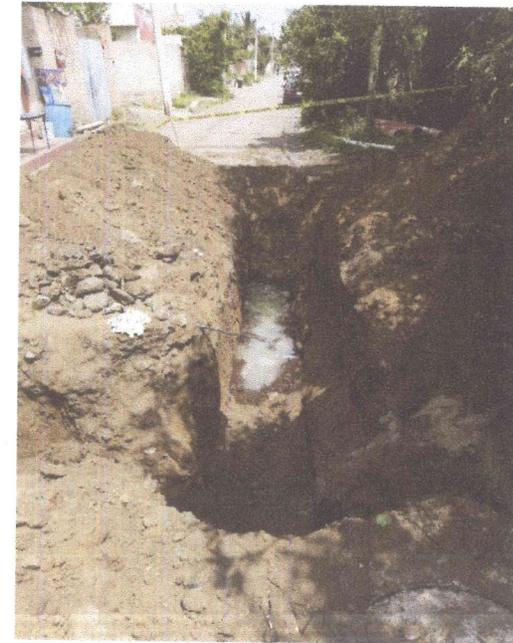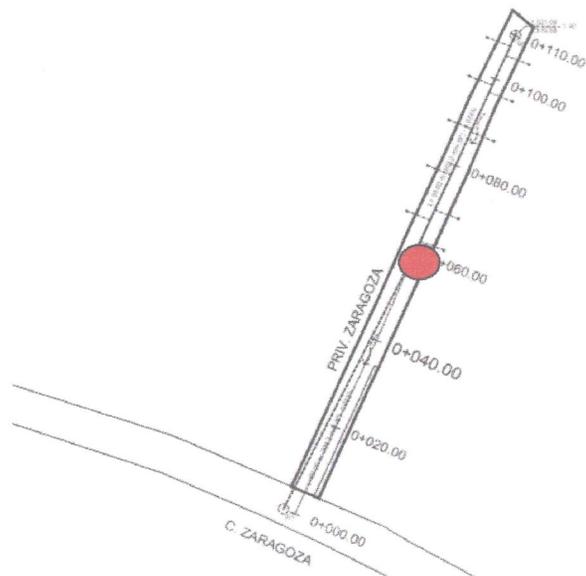

TOTAL PZA: 1.00

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

C. RAFAEL ASCENCIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE OCTUBRE

HOJA 11 / 11

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA.

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

LARGO	ANCHO	TOTAL
55	2	110

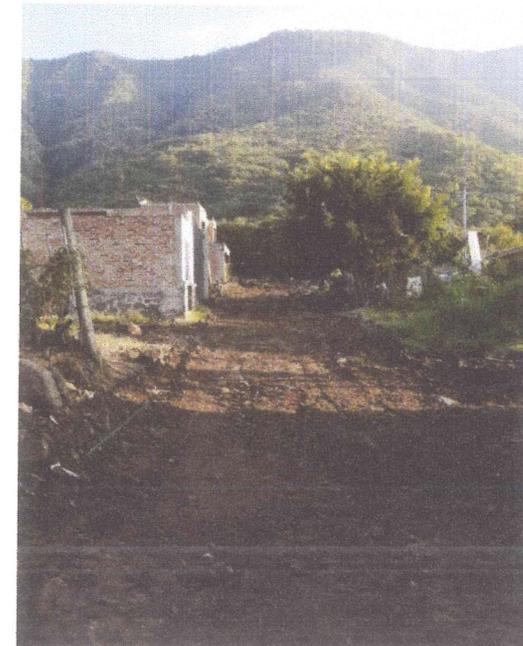

TOTAL M2: 110.00

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

SUPERVISOR DE OBRA

C. RAFAEL ASCENCIO

RESIDENTE DE OBRA
