

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: Ingreso
 Folio Fiscal: 8EDF065D-6BE5-4D2C-859A-BA3FE98D68D1
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000412111132
 Fecha y hora de certificación: 2019-12-17T17:25:52
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Expedición: 44160

Folio/Serie: 012974E
 Fecha y hora de emisión: 2019-12-17T17:25:52
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 03 TRANSFERENCIA
 Condiciones de pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Versión de CFDI: 3.3
 No. de cuenta de pago: ***-**-****



Emisor
 IAM170306RP6 INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA DE CV
 LOPEZ COTILLA, 1554, INT. 101
 COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
 LOPEZ COTILLA, 1554, INT. 101
 COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor
 MJJ850101KP8 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 PALACIO MUNICIPAL, S/N,
 COL. CENTRO, C.P. 45800
 JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: 101 Construcciones

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
72141700	E48	SERVICIO		1.00	PAGO DE ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO No. CONTRATO GMJ036COP/2019 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$66.37 NETO A PAGAR \$15,332.04	\$0.00	\$13,274.49	\$13,274.49
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 13274.49	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 2123.92				

Importe con Ietra	*** QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ***	Subtotal	\$13,274.49
Desglose de impuestos trasladados		Descuentos	\$0.00
Impuesto IVA	Tasa 16.00%	Impuestos trasladados	\$2,123.92
		Impuestos retenidos	\$0.00
		TOTAL	\$15,398.41

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1]8EDF065D-6BE5-4D2C-859A-BA3FE98D68D1[2019-12-17T17:25:52]SPE9807172W8[P1uj8Adu+HLCNS81rWTkpR3ugwS3YAR6bqnu6q8LlyKyTy6O23bYMeYOKoa/x7/VafP43YOW02OyOZ2rnfCb544WxaTyGc0cc+5MFkloqjGfKv/k9IN+33qcaigEqEEc1xUGFrKq5e8FT5qpWqX7oGrEYwrzAunnXRaUTWPZUMIX7k1ScRs9GLEjBxl0ir3DOQ0M03MFuZ2EmH9ocYlilaLNUFbNz39NDH1Dy6nG8ZkV61hEnkz61Hah+XPAjLpidLbXOmc2TbH5P/U2SyUGdhC28hntFSp19F5mGmnO/mvqav0/Vwx9H9P5mfMKu1w8drclHrcvaQnT/4oA==|00001000000404594081|]
 Sello Digital del CFDI
 P1uj8Adu+HLCNS81rWTkpR3ugwS3YAR6bqnu6q8LlyKyTy6O23bYMeYOKoa/x7/VafP43YOW02OyOZ2rnfCb544WxaTyGc0cc+5MFkloqjGfKv/k9IN+33qcaigEqEEc1xUGFrKq5e8FT5qpWqX7oGrEYwrzAunnXRaUTWPZUMIX7k1ScRs9GLEjBxl0ir3DOQ0M03MFuZ2EmH9ocYlilaLNUFbNz39NDH1Dy6nG8ZkV61hEnkz61Hah+XPAjLpidLbXOmc2TbH5P/U2SyUGdhC28hntFSp19F5mGmnO/mvqav0/Vwx9H9P5mfMKu1w8drclHrcvaQnT/4oA==
 Sello Digital del SAT
 FIUT5otB8mBNXHzcErMuarVoiyQ1HVuhG9f1VeoGTSF6x6rV6f3PK7Q3ab2h8DGNyBv4+fayAKKBW9qOqTwwXQeJG91WYKQZ1176HceUFLh5APluasVzMEQl0dFpcsvjZ5Cp78q1gT26Tl4f1ebZwlpSsyPj3cfr7T1w9+9XX2CoKbQ/RonXaAfcU3A19VFRs01wAEkYEBz5jwUbsU4rc3/eghOdTfxT2PxqsVZ5Rdvn/rED5dlz5NT/J2JAUaQmPYbqBVAXXnOYnQo1TLWGBnptoPpchluS19FNBYbACBJPWQvzhcFTnM0117UNU13Wwh+AOocubuZNG1leg==





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 036C 0P/2019

CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
EMPEDRADO



FECHA: 17 DE DICIEMBRE

PERÍODO DE TRABAJO:

DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES	
1	PRELIMINARES			\$	151.32
2	EXCAVACIONES			\$	1,007.96
3	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES			\$	1,820.94
4	INSTALACION DE TUBERIA			\$	6,876.68
5	COMPLEMENTARIOS			\$	3,417.59
				\$	MONTO DE ESTIMACIÓN 13,274.49
				\$	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO % -
				\$	SUBTOTAL 13,274.49
				\$	I. V. A. 16% 2,123.92
				\$	SUMA 15,398.41
				\$	MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) -
				\$	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) 66.37
				\$	NETO A PAGAR 15,332.04
	ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:	
	ASIGNACIÓN	\$ 230,231.22	\$ 36,837.00	\$ 267,068.22	
	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 13,274.49	\$ 2,123.92	\$ 15,398.41	
	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 208,000.85	\$ 33,280.14	\$ 241,280.99	
	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 221,275.34	\$ 35,404.05	\$ 256,679.39	
	SALDO POR EJERCER	\$ 8,947.73	\$ 1,431.64	\$ 10,379.37	
	SIN ANTICIPO				
	ANTICIPO %	\$ -	\$ -		
	AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -		
	AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -		
	AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ -	\$ -		
	FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -		
				RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
				CARLOS ALBERTO MENDOZA	INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.
				SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
				LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN	ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 2 (FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ 036C 0P/2019
 EMPEDRADO
 PERÍODO DE TRABAJO: DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019
 OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 UBICACIÓN : UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 CONTRATISTA : CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.
 FECHA: 17 DE DICIEMBRE



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	432.00	412.46	19.50	431.96	0.04	7.76	3,352.32	151.32	3,200.69	0.31
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES										151.32		
EXCAVACIONES												
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1º KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	129.60	123.74	5.85	129.59	0.01	172.30	22,330.08	1,007.96	21,320.40	1.72
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES										1,007.96		
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES												
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	432.00	412.46	19.50	431.96	0.04	14.43	6,233.76	281.39	5,951.80	0.58
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	43.20	41.25	1.98	43.23	-0.03	777.55	33,580.16	1,539.55	32,073.94	-23.33
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES										1,820.94		
SUPERFICIE DE RODAMIENTO												
5	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	432.00	412.46	19.50	431.96	0.04	352.65	152,344.80	6,876.68	145,454.02	14.11
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO										6,876.68		
COMPLEMENTARIOS												
6	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	432.00	0.00	430.97	0.00	0.00	7.83	3,425.76	3,417.59	0.00	0.00
7	ESTUDIOS DE LABORATORIO (CONTROL DE CALIDAD EN BASES) INCLUYE, TRASLADO, EXTRACION DE MUESTRAS, PRUEBAS Y ENTREGA DE RESULTADOS.	VIITA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,477.17	8,954.34	0.00	0.00	8,954.34
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS										3,417.59		
TOTAL									230,231.22	13,274.49	21,320.40	8,947.73

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.
CONTRATISTA

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS






MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 036C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES	
CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.		No. DE ESTIMACION:	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		2 (FINIQUITO)	
DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019		PAGINA: 1-8	
FECHA:	17 DE DICIEMBRE		


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.			CRUCERO NIÑOS HEROES Y VERANO					19.50	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									19.50	M2

CROQUIS:

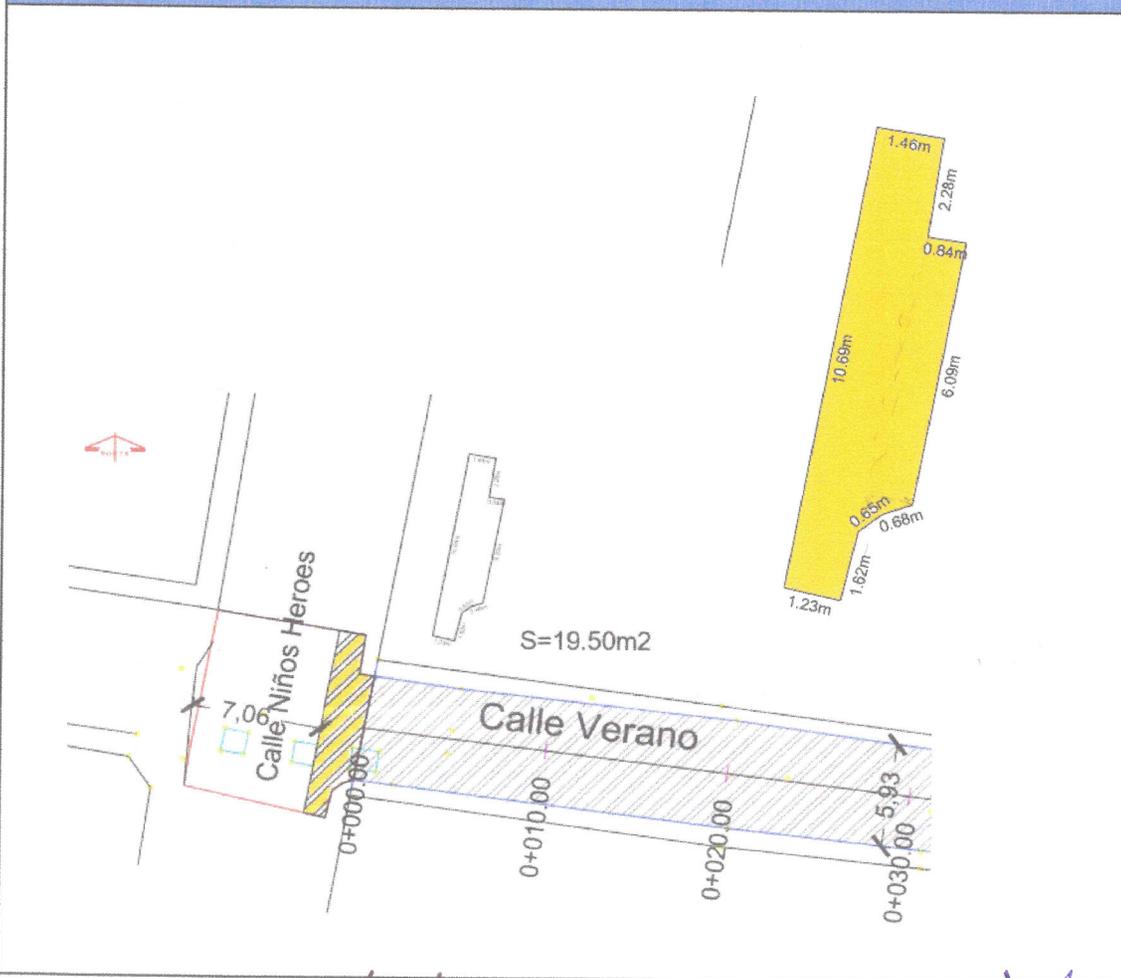

FOTOGRAFIAS:

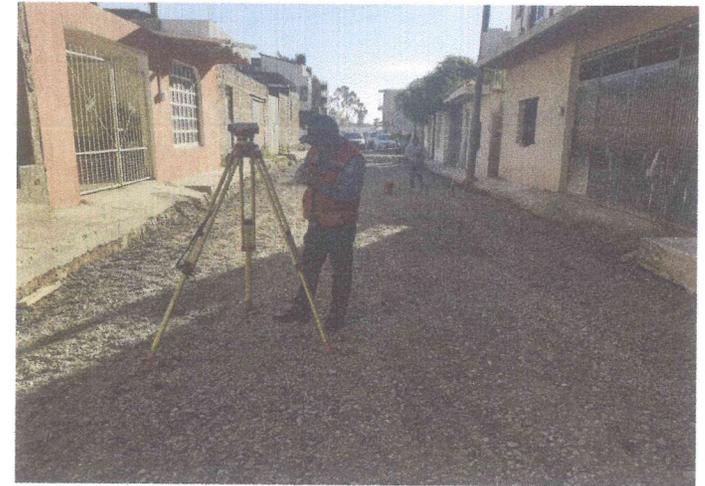

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESIDENTE DE OBRA: _____

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: _____




MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 036C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019		2 (FINIQUITO)
FECHA:	17 DE DICIEMBRE	PAGINA: 2-8

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION			CRUCERO NIÑOS HEROES Y VERANO			0.3		0.00	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									5.85	M3

CROQUIS:

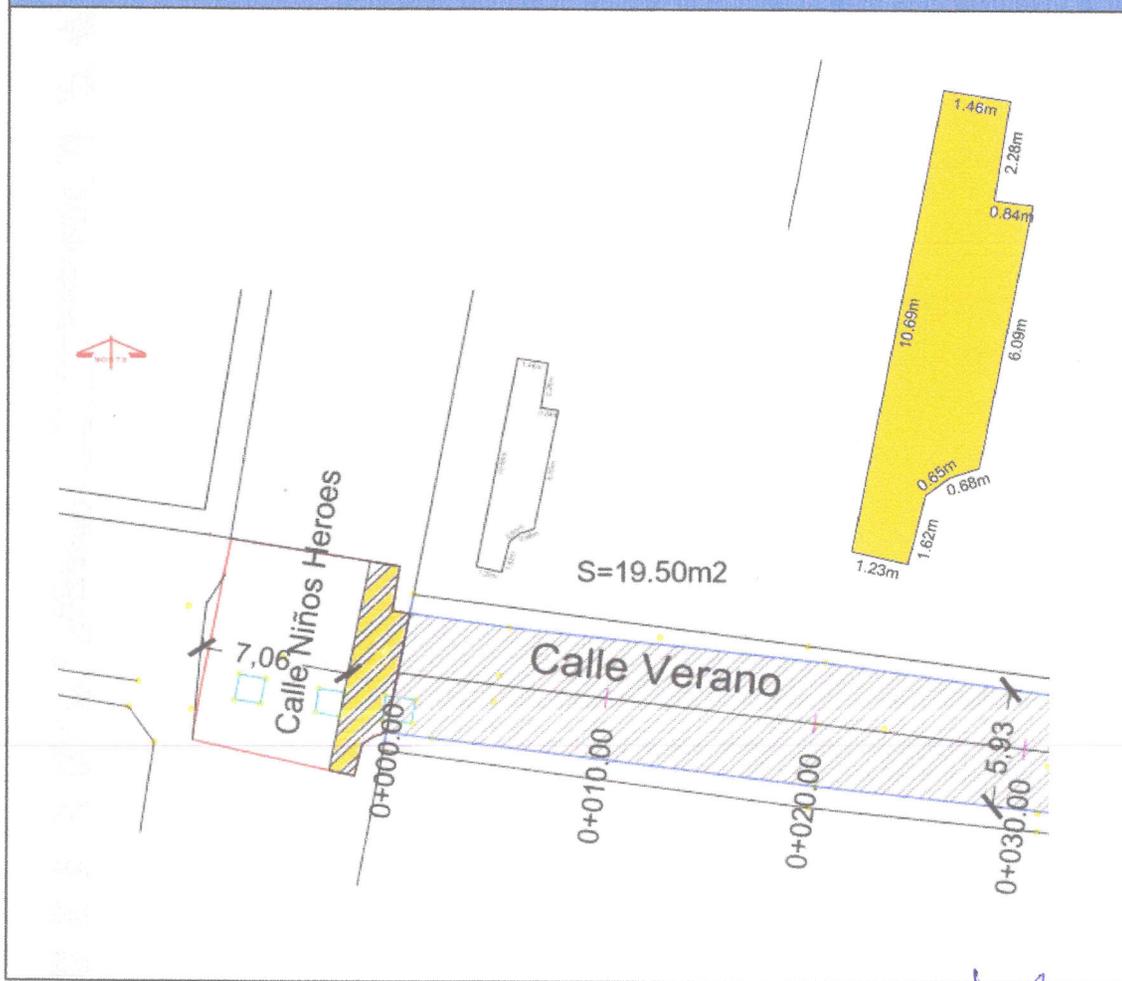

FOTOGRAFIAS:



RESIDENETE DE OBRA:

[Handwritten signature]

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

[Handwritten signature]




MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 036C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES	
CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.		No. DE ESTIMACION:	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		2 (FINIQUITO)	
DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019			
FECHA:	17 DE DICIEMBRE	PAGINA: 3-8	

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION			CRUCERO NIÑOS HEROES Y VERANO						
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									19.50	M2

CROQUIS:

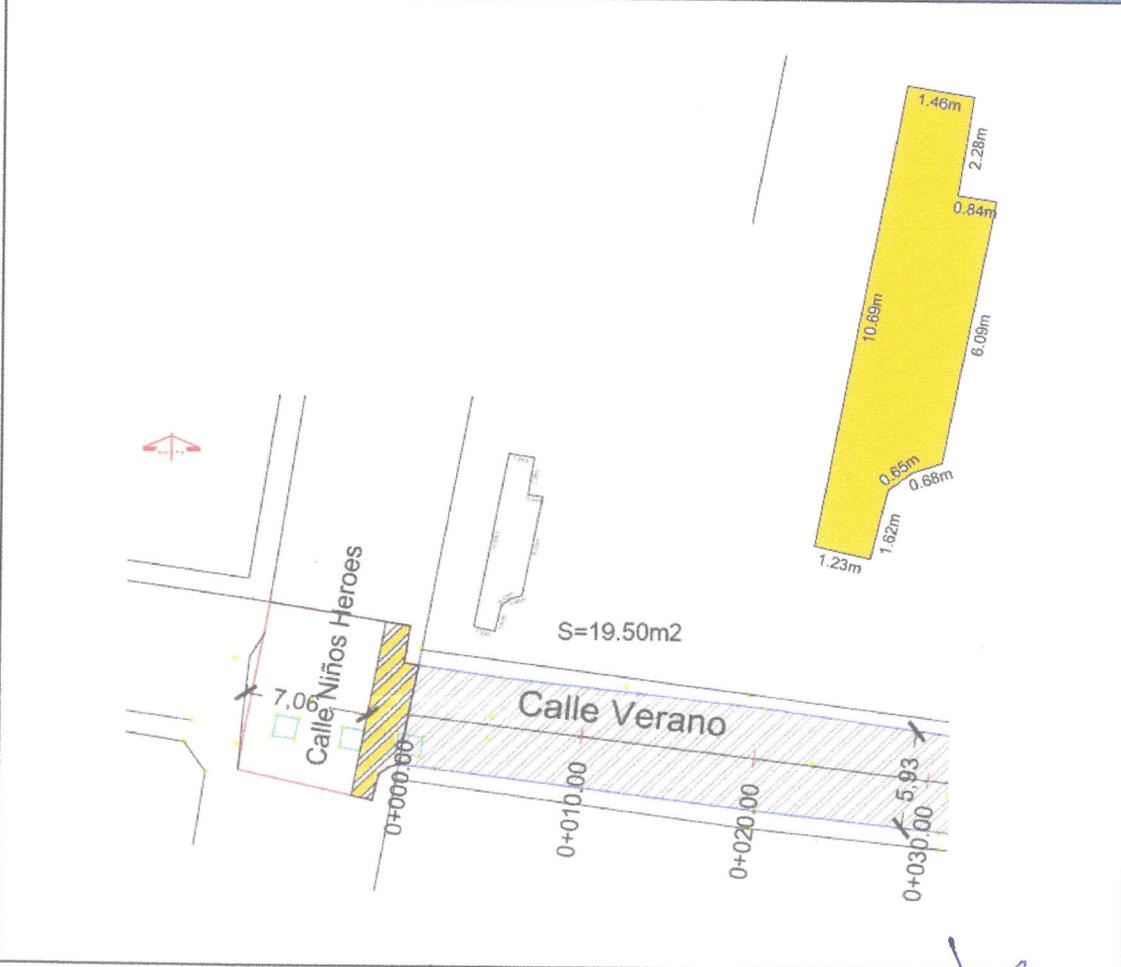

FOTOGRAFIAS:

RESIDENTE DE OBRA: _____

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: _____




MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 036C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019		2 (FINIQUITO)
FECHA:	17 DE DICIEMBRE	PAGINA: 4-8


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION						0.1			
										CRUCERO NIÑOS HEROES Y VERANO
										DESC.
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									1.98	M3


CROQUIS:

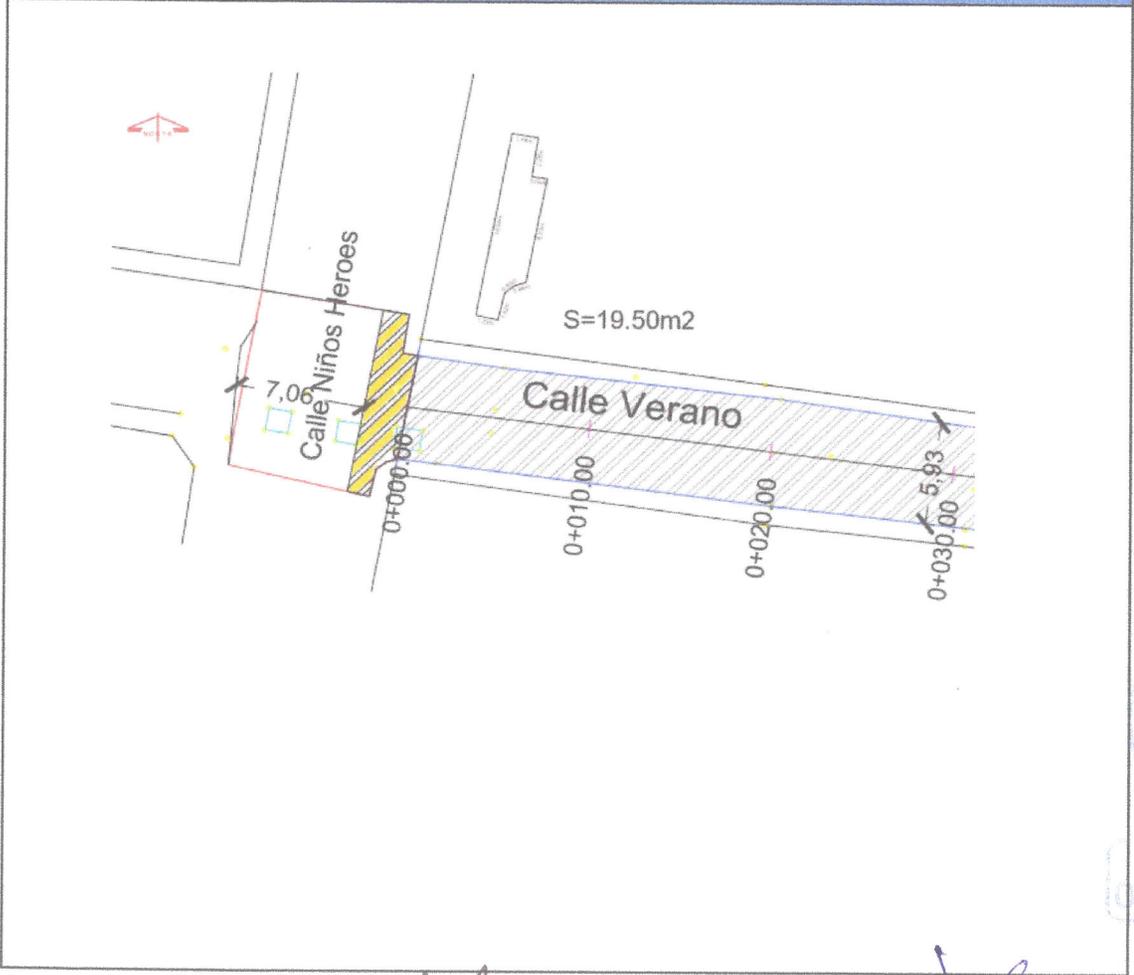

FOTOGRAFIAS:

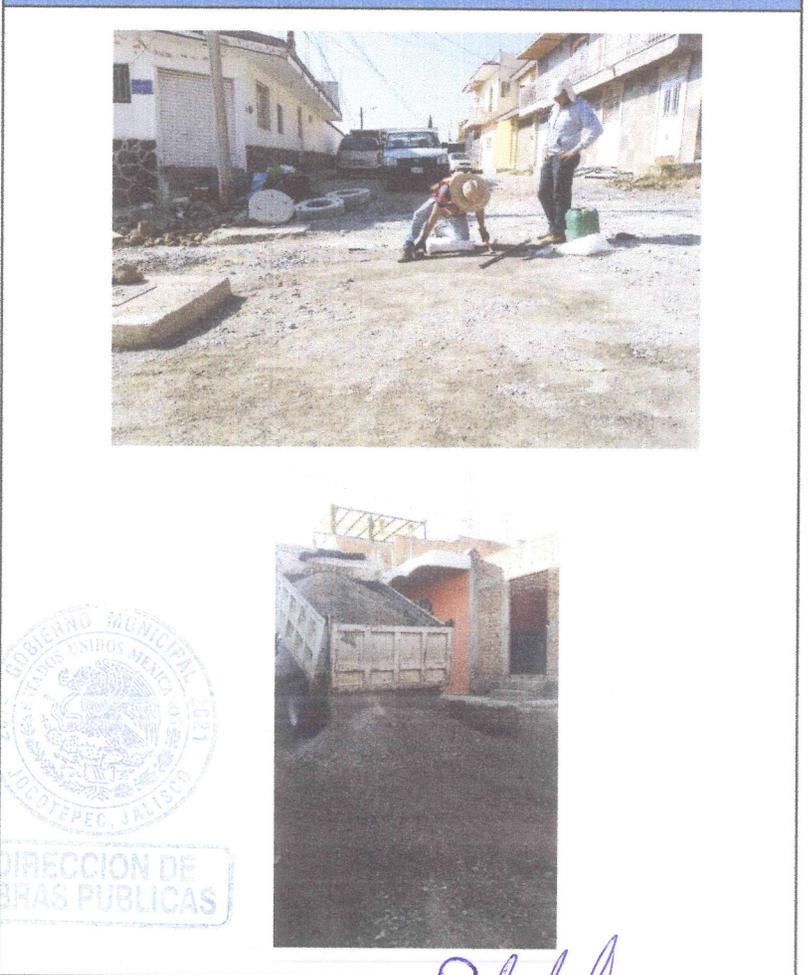

RESIDENETE DE OBRA: 

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: 




MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 036C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES	
CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.		No. DE ESTIMACION:	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		2 (FINIQUITO)	
DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019		PAGINA: 5-8	
FECHA:	17 DE DICIEMBRE		


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	1	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
5	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION			CRUCERO NIÑOS HEROES Y VERANO			1		0.00	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									19.50	M2


CROQUIS:



DETALLE CONSTRUCTIVO

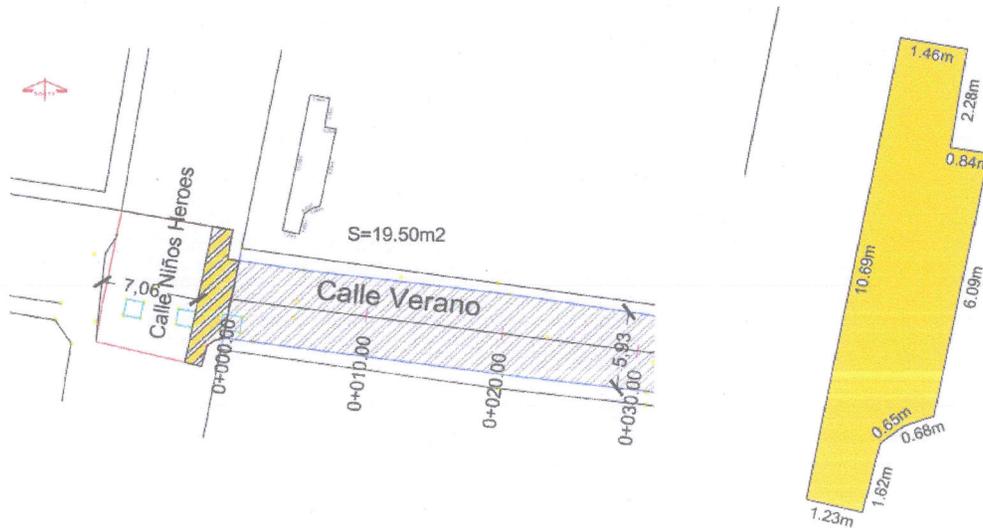

FOTOGRAFIAS:

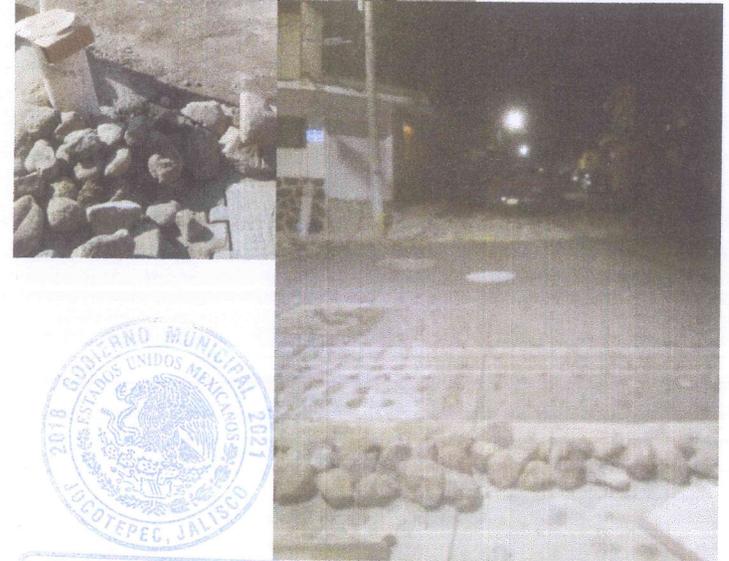

RESIDENETE DE OBRA:

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:




MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 036C OP/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES	
CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.		No. DE ESTIMACION:	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		2 (FINIQUITO)	
DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019			
FECHA:	17 DE DICIEMBRE	PAGINA: 6-8	



NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
6	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA				66.85	6.17	1.00		412.4645	
				CRUCERO	19.5				19.5	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									430.97	M2

CROQUIS:

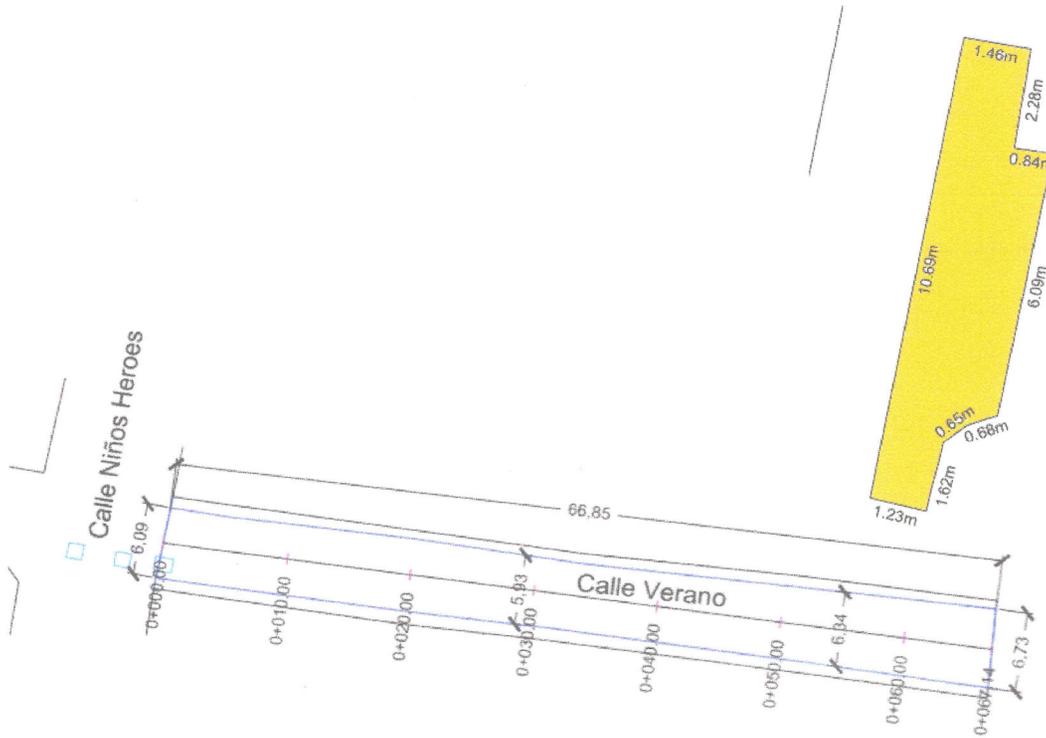

FOTOGRAFIAS:

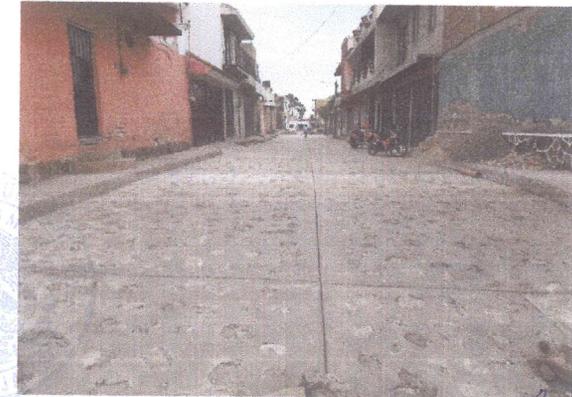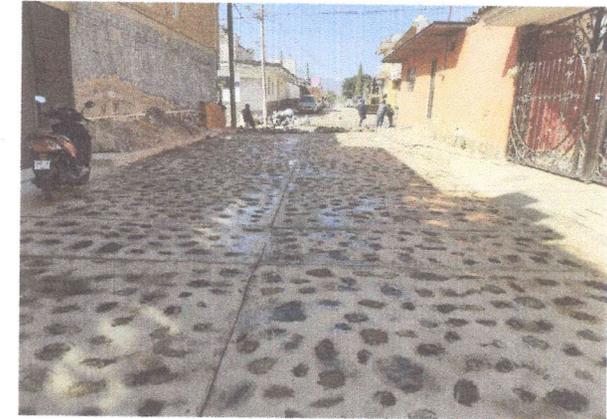

RESIDENTE DE OBRA:

[Handwritten signature]

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

