

OPRAS PUBLICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 4 (CUATRO FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019

OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE
NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO",

UBICACIÓN : UBICACIÓN: CALLE MORELOS S/N JOCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATISTA : CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2019

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	95.90	95.90	0.00	95.90	0.00	8.83	846.80	0.00	846.80	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES										0.00		
CIMENTACION												
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	84.62	84.62	0.00	84.62	0.00	97.11	8,217.45	0.00	8,217.45	0.00
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	46.26	46.26	0.00	46.26	0.00	14.58	674.47	0.00	674.47	0.00
4	RENCHIDO (PEGADO PIEDRA POR PIEDRA) CON PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	30.84	30.84	0.00	30.84	0.00	1,794.39	55,338.99	0.00	55,338.99	0.00
5	ANCLAJE DE CASTILLOS DE 50X50X40 CM CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	408.96	8,997.12	0.00	8,997.12	0.00
SUBTOTAL ESTA DE CIMENTACION										0.00		
ALBAÑILERIA												
6	FABRICACION DE DALA DE 15X15CM CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 CON ARMEX INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	155.64	155.64	0.00	155.64	0.00	252.37	39,278.87	0.00	39,278.87	0.00
7	CONSTRUCCION DE MURO DE SOGA CON TABIQUE DE 6X14X28 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	249.02	187.34	0.00	187.34	61.68	332.90	82,898.76	0.00	62,365.49	20,533.27
8	FABRICACION DE CASTILLOS DE 15X11CM CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	70.40	70.00	0.00	70.00	0.40	228.61	16,094.14	0.00	16,002.70	91.44
9	CONSTRUCCION DE BOVEDA, DE CUÑA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	95.90	0.00	0.00	0.00	95.90	557.98	53,510.28	0.00	0.00	53,510.28


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
10	CONSTRUCCION DE PRETIL CON TABIQUE DE 5.5X14X28 CM H DE 60 CM A L.OOM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	48.58	44.24	0.00	44.24	4.34	370.38	17,993.06	0.00	16,385.61	1,607.45
11	FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON DE 10CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADEO CEMENTO-ARENA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	95.90	94.66	0.00	94.66	1.24	316.95	30,395.51	0.00	30,002.49	393.02
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	95.90	94.66	0.00	94.66	1.24	236.30	22,661.17	0.00	22,368.16	293.01
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAVAleta CON LADRILLO DE BARRO DE 17X17CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	48.58	44.24	0.00	44.24	4.34	135.86	6,600.08	0.00	6,010.45	589.63
14	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	38.36	36.03	0.00	36.03	2.33	758.85	29,109.49	0.00	27,341.37	1,768.12
15	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=200KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	26.05	0.00	26.05	26.05	0.00	446.50	11,631.33	11,631.33	0.00	0.00
16	FABRICACION DE APLANADOS EN MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	278.17	175.30	312.00	487.30	-209.13	150.16	41,770.01	46,849.92	26,323.05	-31,402.96
17	FABRICACION DE APLANADOS EN BOVEDA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	95.90	0.00	95.90	95.90	0.00	163.61	15,690.20	15,690.20	0.00	0.00
18	FABRICACION DE BOQUILLA CON 2 BOLEADOS INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	119.18	0.00	119.18	119.18	0.00	117.60	14,015.57	14,015.57	0.00	0.00
19	UMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE PRIMERA INTERCERAMIC, POCELANITE O VITROMEX, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	16.37	0.00	57.70	57.70	-41.33	490.89	8,035.87	28,324.35	0.00	-20,288.48
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE PRIMERA INTERCERAMIC, POCELANITE O VITROMEX, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	34.56	0.00	34.56	34.56	0.00	485.54	16,780.26	16,780.26	0.00	0.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FONDO PARA APLICAR PINTURA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	337.48	0.00	487.30	487.30	-149.82	27.82	9,388.69	13,556.69	0.00	-4,167.99



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA 100 % LAVABLE CON 2 MANOS MINIMO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION	M2	166.27	0.00	487.30	487.30	-321.03	69.94	11,628.92	34,081.76	0.00	-22,452.84
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ALBAÑILERIA										180,930.08		
VIGUERIA												
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPS 4" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION	ML	55.05	36.60	0.00	36.60	18.45	525.26	28,915.56	0.00	19,224.52	9,691.05
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPS 5" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION	ML	22.50	56.60	0.00	56.60	-34.10	645.29	14,519.03	0.00	36,523.41	-22,004.39
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE VIGUERIA										0.00		
HERRERIA												
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ACERO DE 210X100 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	7.00	0.00	4.00	4.00	3.00	4,165.26	29,156.82	16,661.04	0.00	12,495.78
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 120X100 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR Y VIDRIO LISO DE 3mm, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3,673.07	11,019.21	3,673.07	0.00	7,346.14
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 50X80 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR Y VIDRIO LISO DE 3mm, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	0.00	5.00	5.00	-4.00	1,972.86	1,972.86	9,864.30	0.00	-7,891.44
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE DE ACERO. DE 140X160 CM, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7,169.68	28,678.72	0.00	0.00	28,678.72
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE HERRERIA										30,198.41		
INSTALACION HIDRAULICA												
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA HIDRAULICA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1,011.46	10,114.60	10,114.60	0.00	0.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,067.29	1,067.29	1,067.29	0.00	0.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE WC INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	2.00	0.00	-1.00	1,163.76	1,163.76	2,327.52	0.00	-1,163.76
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	0.00	2.00	0.00	-1.00	415.92	415.92	831.84	0.00	-415.92

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO 1100 LTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4,107.26	4,107.26	4,107.26	0.00	0.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA 5000 LTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,468.48	17,468.48	0.00	0.00	17,468.48
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE INSTALACION HIDRAULICA										18,448.51		
INSTALACION SANITARIA												
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA SANITARIA DE 4" INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	1,333.54	10,668.32	10,668.32	0.00	0.00
36	CONSTRUCCION DE REGISTRO DOMESTICO DE 60CM DE DIAMETRO Y HASTA H=100 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1,791.33	8,956.65	8,956.65	0.00	0.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	129.56	4,534.60	4,534.60	0.00	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE INSTALACION SANITARIA										24,159.57		
INSTALACION ELECTRICA												
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	972.15	48,607.50	48,607.50	0.00	0.00
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE WATTS LUZ DE DIA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	534.90	6,953.70	6,953.70	0.00	0.00
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 PASTILLAS INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,654.19	1,654.19	1,654.19	0.00	0.00
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA PARA CONDUCCION DE CABLES INCLUYE RECIBIR MANGUERA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	233.55	11,677.50	11,677.50	0.00	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE INSTALACION ELECTRICA										68,892.89		
COMPLEMENTARIOS												
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FASTER O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION	M2	95.90	0.00	0.00	0.00	95.90	108.50	10,405.15	0.00	0.00	10,405.15
43	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	95.90	0.00	74.00	74.00	21.90	10.08	966.67	745.92	0.00	220.75
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS										745.92		
TRABAJO FUERA DE CATÁLOGO												



S N

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
44	CONSTRUCCION DE BOVEDA, CON BOVEDILLA SOLIDA DE 1.00X.20 MTS. ENPATINADO, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2		0.00	94.66	94.66	-94.66	584.20	55,300.37		55,300.37	-55,300.37
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE TRABAJOS FUERA DE CATÁLOGO										0.00		
								TOTAL:	754,580.83	323,375.38	431,201.32	4.14
 CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV. CONTRATISTA			 LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					 ING. JUAN MANUEL GARCIA-ESCOTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				





DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	
No. DE CONTRATO:		No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019


RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 15-43

NÚMEROS GENERADORES												
PARTIDA		ALBAÑILERIA										OBSERVACIONES
CONCEPTO		VOLUMEN										
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES						ACUMULADO	
		EJE	ENTRE		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		PZA		
015LOZA	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=200KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 TERMINADO PULIDO,APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	A	2	3	M2	5.00	5.21				26.05	
		2	A	B								
TOTAL											26.05	M2
CROQUIS						FOTOGRAFÍAS:						

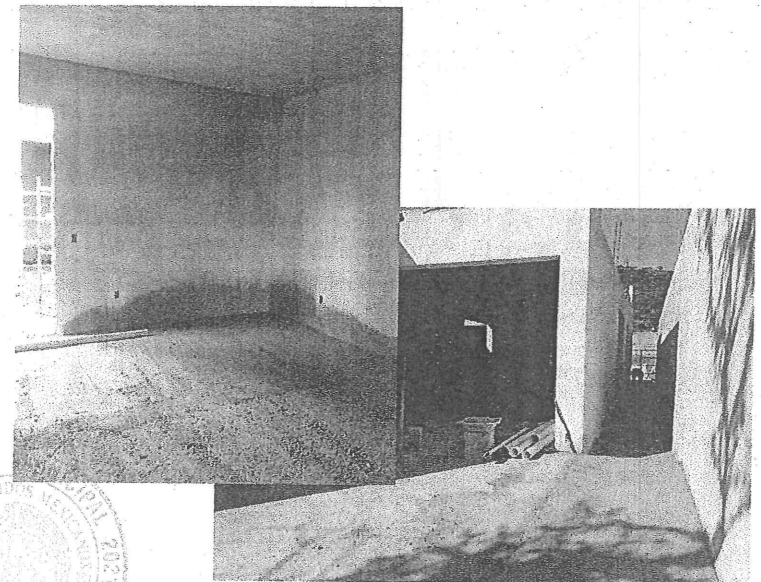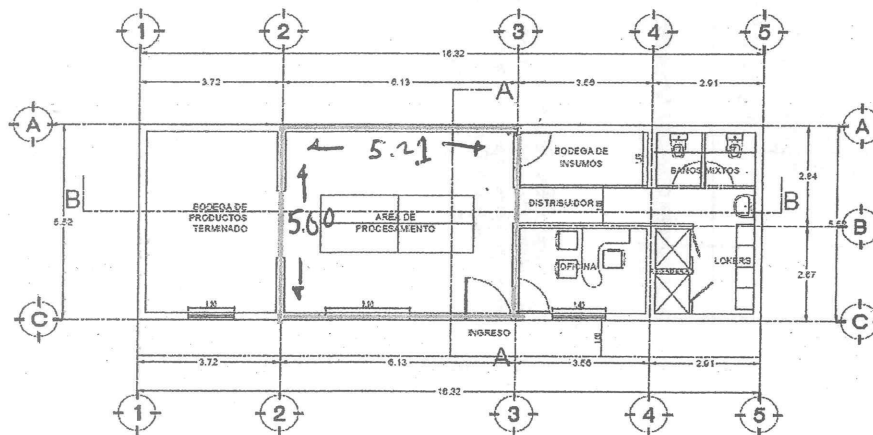

RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

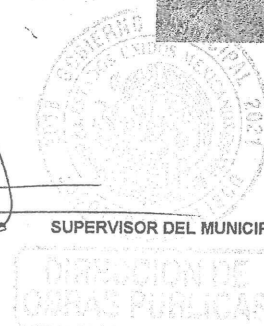

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE "JOCOTEPEC, JALISCO",	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019	

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 16-43

NÚMEROS GENERADORES													
PARTIDA		ALBAÑILERIA										OBSERVACIONES	
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN				DIMENSIONES							
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA	SUPERFICIE	ACUMULADO		
016APL	FABRICACION DE APLANADOS EN MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	A	1	5	M2	16.32		3.20	1.00		52.22		APLANADO INTERIOR
		1	A	C	M2	4.80		3.20	1.00		15.36		APLANADO INTERIOR
		C	1	5	M2	16.32		3.20	1.00		52.22		APLANADO INTERIOR
		5	A	C	M2	4.80		3.20	1.00		15.36		APLANADO INTERIOR
		2	A	C	M2	4.80		3.20	2.00		30.72		APLANADO INTERIOR
		3	A	C	M2	4.80		3.00	2.00		28.80		APLANADO INTERIOR
		4	A	C	M2	4.80		3.00	2.00		28.80		APLANADO INTERIOR
		B	3	5	M2	6.47		3.00	2.00		38.82		APLANADO INTERIOR
		C	1	5	M2	2.20		2.20	1.00		-4.48		RESTAR VANOS PUERTAS
		C	1	5	M2	2.50		1.00	1.00		-2.50		RESTAR VANOS VENTANAS
		2	A	C	M2	2.20		2.20	1.00		-4.48		RESTAR VANOS PUERTAS
		3	A	C	M2	1.00		2.20	1.00		-2.20		RESTAR VANOS PUERTAS
		A	1	5	M2	16.32		1.00	2.00		32.64		APLANADO INTERIOR PRETIL
		1	A	C	M2	4.80		3.20	2.00		30.72		APLANADO INTERIOR PRETIL
TOTAL										312.00		M2	
ORQUIS						FOTOGRAFÍAS							

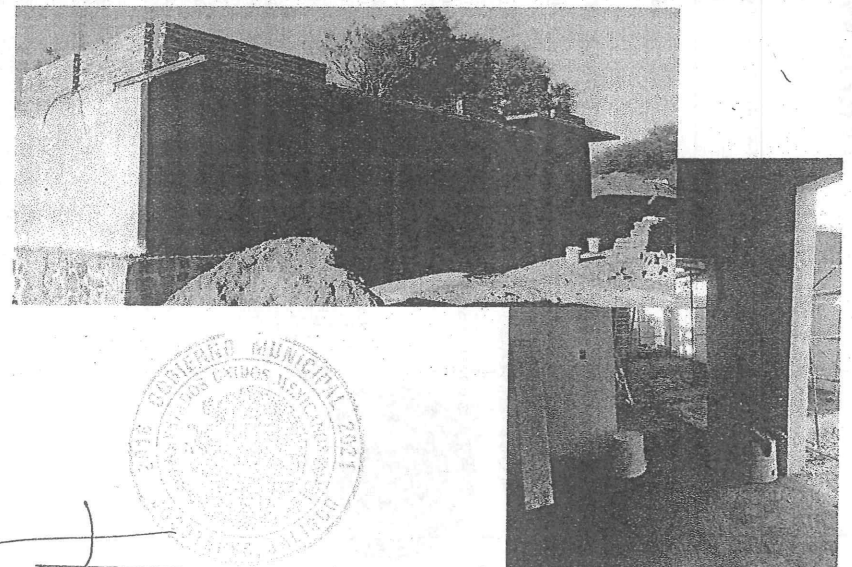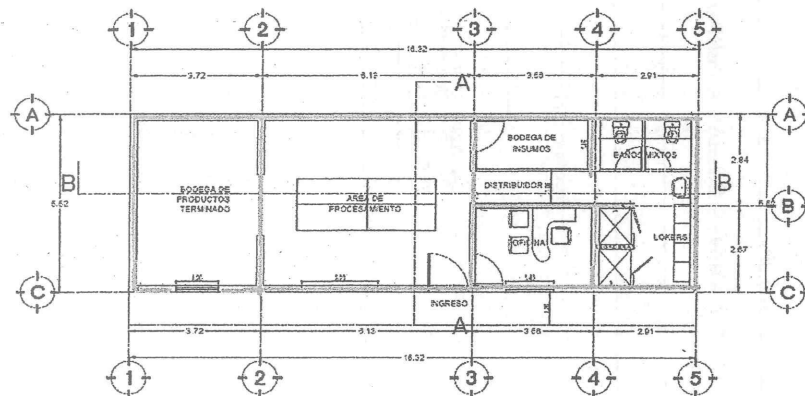

RESIDENTE DE OBRA:

RAFAEL ASENCIO


SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN


	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019	

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 17-43

NÚMEROS GENERADORES													
PARTIDA		ALBAÑILERIA										OBSERVACIONES	
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES								
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA	SUPERFICIE	ACUMULADO		
017APLBOV	FABRICACION DE APLANADOS EN BOVEDA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	BOVEDA			4.70	3.65		1.00		17.16		BODEGA P. T.	
		BOVEDA			4.70	6.00		1.00		28.20		AREA DE PROCESO	
		BOVEDA			3.56	2.40		1.00		8.54		OFICINA	
		BOVEDA			3.56	1.70		1.00		6.05		BODEGA INSUMOS	
		BOVEDA			6.00	1.00		1.00		6.00		DISTRIBUIDOR	
		BOVEDA			2.91	2.50		1.00		7.28		BAÑOS	
		BOVEDA			2.90	2.30		1.00		6.67		REGADERAS	
		BOVEDA			16.00	1.00		1.00		16.00		MARQUESINA	
TOTAL									95.90		M2		
CROQUIS.						FOTOGRAFÍAS.							

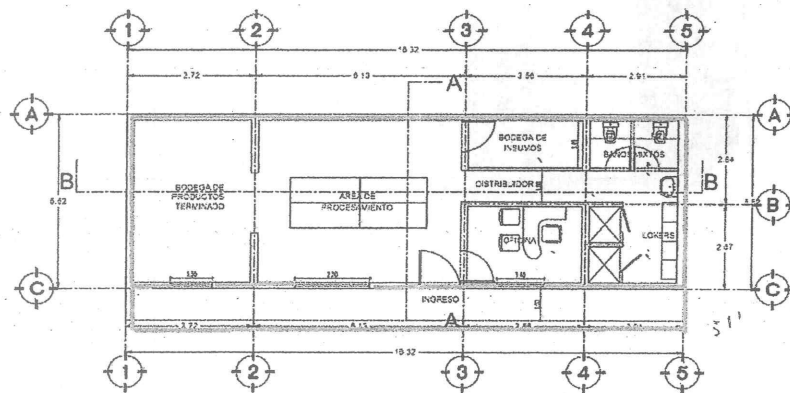

PLANTA ARQUITECTONICA

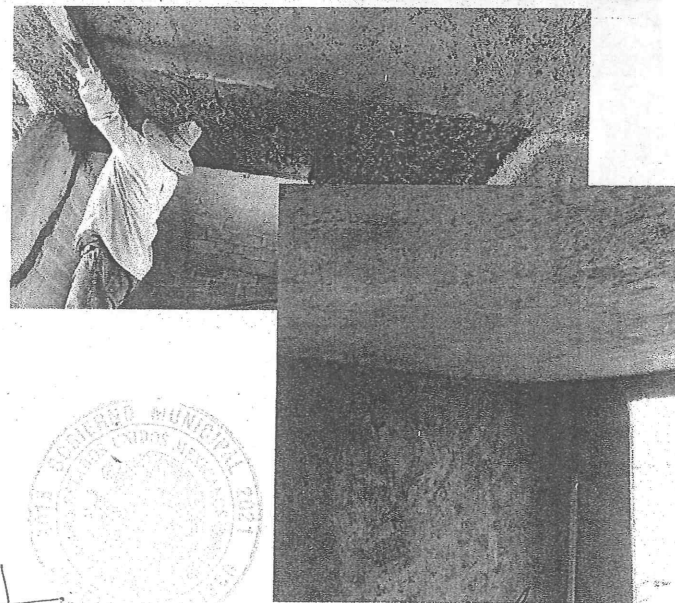


RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASENSIO.



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN



RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 18-43

NUMEROS GENERADORES												
PARTIDA		ALBAÑILERIA										OBSERVACIONES
CONCEPTO		VOLUMEN										
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES							
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA	SUPERFICIE	ACUMULADO	
018BOQUILLA	FABRICACION DE BOQUILLA CON 2 BOLEADOS INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	BOQUILLA		ML	5.70			2.00		0.00	11.40	BODEGA P. T.
		BOQUILLA		ML	5.70			2.00		0.00	11.40	AREA DE PROCESO
		BOQUILLA		ML	7.30			2.00		0.00	14.60	OFICINA
		BOQUILLA		ML	4.46			2.00		0.00	8.92	BODEGA INSUMOS
		BOQUILLA		ML	7.30			2.00		0.00	14.60	DISTRIBUIDOR
		BOQUILLA		ML	5.91			2.00		0.00	11.82	BAÑOS
		BOQUILLA		ML	6.90			2.00		0.00	13.80	REGADERAS
		BOQUILLA		ML	16.32			2.00		0.00	32.64	MARQUESINA
											0.00	
											0.00	
TOTAL									0.00	119.18	ML	
CROQUIS						FOTOGRAFIAS						

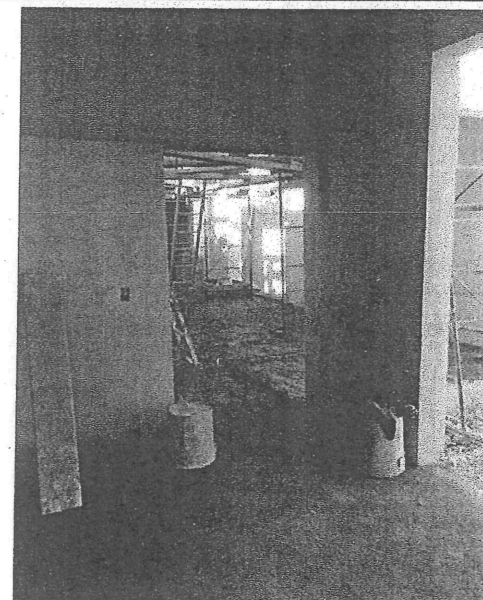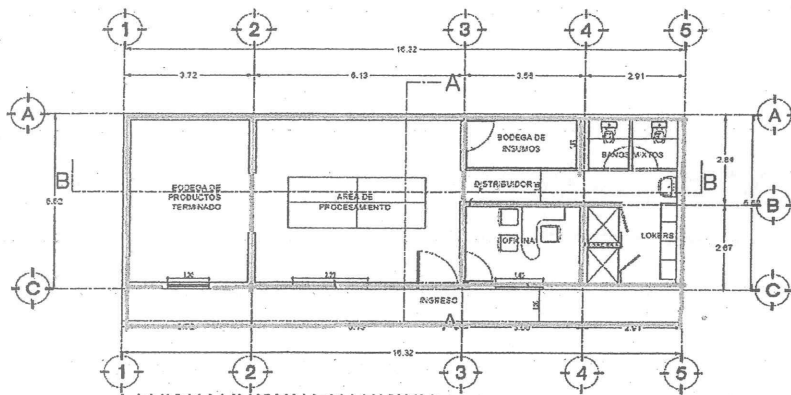

RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASECNCIO .


SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN


	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 19-43

NÚMEROS GENERADORES												
PARTIDA		ALBAÑILERIA										OBSERVACIONES
CONCEPTO		VOLUMEN										
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES					SUPERFICIE	ACUMULADO	
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA			
019VITRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE PRIMERA INTERCERAMIC, POCELANITE O VITROMEX, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	VITRO			4.70	3.82				17.95		BODEGA P. T.
										0.00		
		VITRO			3.56	2.50				8.90		OFICINA
		VITRO			5.00	1.70				8.50		BODEGA INSUMOS
		VITRO			7.45	1.00				7.45		DISTRIBUIDOR
		VITRO			2.98	2.50				7.45		BAÑOS
		VITRO			2.98	2.50				7.45		REGADERAS
TOTAL										57.70		M2
CROQUIS:						FOTOGRAFÍAS:						

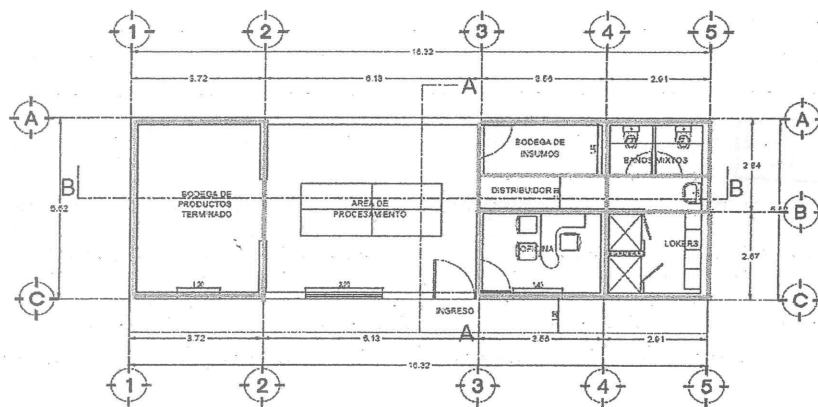

PLANTA ARQUITECTONICA

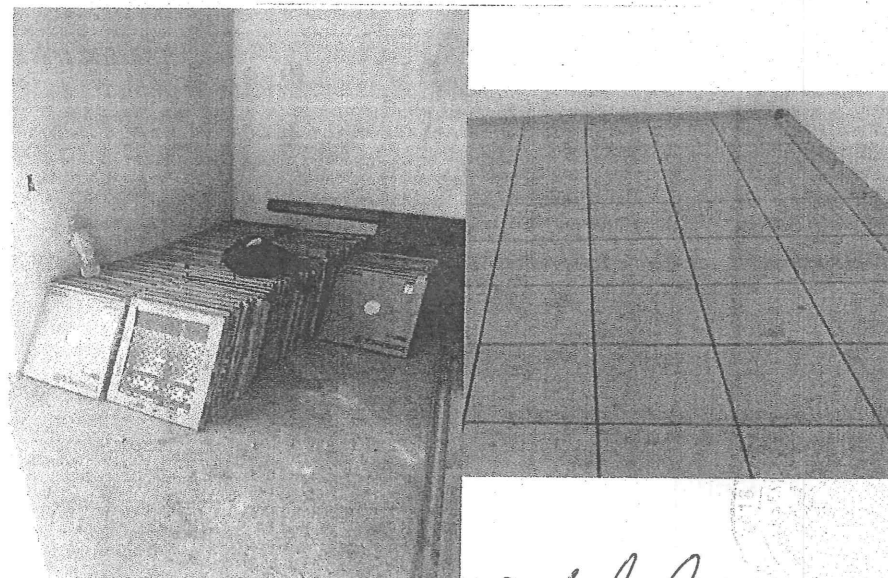


RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASENCIO.


SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN



RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 20-43

PLANTA ARQUITECTONICA

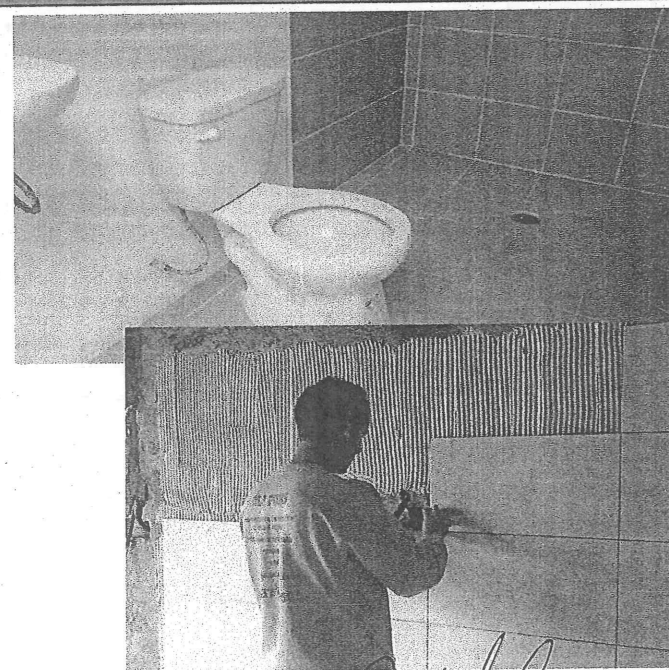


RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASECNCIO .


SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN



RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES:
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 22-43

NÚMEROS GENERADORES													
PARTIDA		ALBAÑILERIA										OBSERVACIONES	
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN				DIMENSIONES					ACUMULADO		
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA	SUPERFICIE			
022PINT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA 100 % LAVABLE CON 2 MANOS MINIMO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION	A	1	5	M2	16.18		3.20	2.00		103.55		INTERIOR EXTERIOR
		1	A	C	M2	4.80		3.20	2.00		30.72		INTERIOR EXTERIOR
		C	1	5	M2	16.32		3.20	2.00		104.45		INTERIOR EXTERIOR
		5	A	C	M2	4.99		3.20	2.00		31.94		INTERIOR EXTERIOR
		2	A	C	M2	4.99		3.20	2.00		31.94		INTERIOR
		3	A	C	M2	4.99		3.20	2.00		31.94		INTERIOR
		4	A	C	M2	4.99		3.20	2.00		31.94		INTERIOR
		B	3	5	M2	6.47		3.20	2.00		41.41		INTERIOR
		C	1	5	M2	2.20		2.20	1.00		-4.48		RESTAR VANOS PUERTAS
		C	1	5	M2	2.50		1.00	1.00		-2.50		RESTAR VANOS VENTANAS
		2	A	C	M2	2.20		2.20	1.00		-4.48		RESTAR VANOS PUERTAS
		3	A	C	M2	1.00		2.20	1.00		-2.20		RESTAR VANOS PUERTAS
		C	1	5	M2	46.54		1.00	1.00		46.54		INTERIOR PRETIL
		C	1	5	M2	46.54		1.00	1.00		46.54		EXTERIOR PRETIL
TOTAL										487.31		M2	
CROQUIS					FOTOGRAFÍAS								

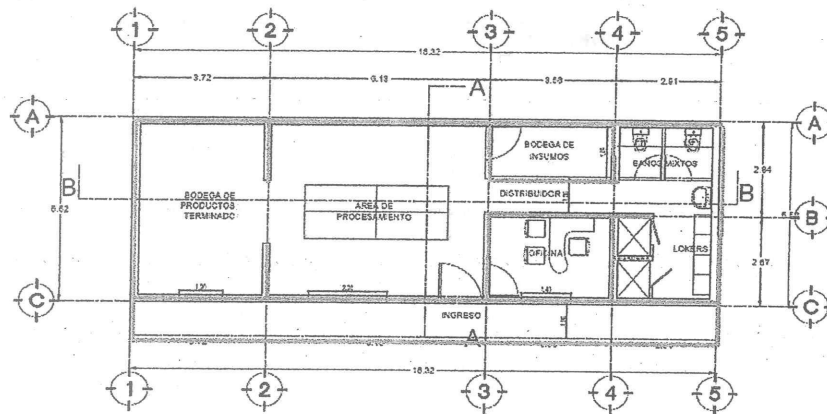

PLANTA ARQUITECTONICA



RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASECNCIO .


SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN


 Jocotepec Municipio de Jocotepec 2010 - 2011	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		No. DE ESTIMACION:
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		4 (CUATRO FINIQUITO)
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 25-43

NÚMEROS GENERADORES												
PARTIDA		HERRERIA										OBSERVACIONES
CONCEPTO		VOLUMEN										
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES					SUPERFICIE	ACUMULADO	
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA			
025PUERT	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ACERO DE 210X100 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION			PZA					1.00			AREA DE PROCESO
				PZA					1.000			AFICINA
				PZA					2.000			SANITARIOS
TOTAL									0.00		4.00	PZA.
CROQUIS:					FOTOGRAFIAS:							

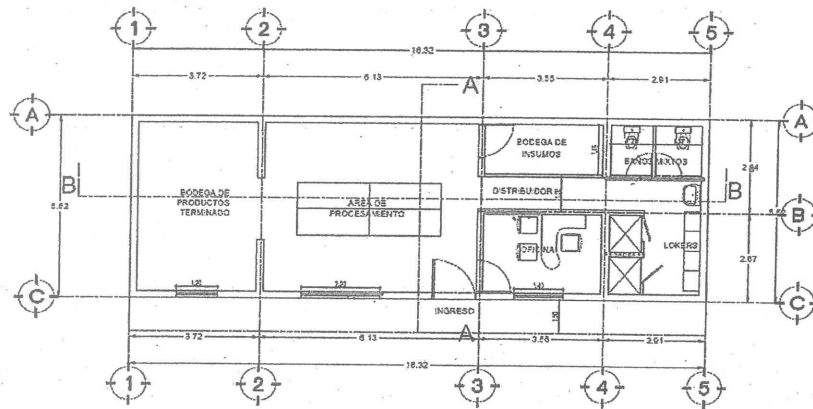

PLANTA ARQUITECTONICA

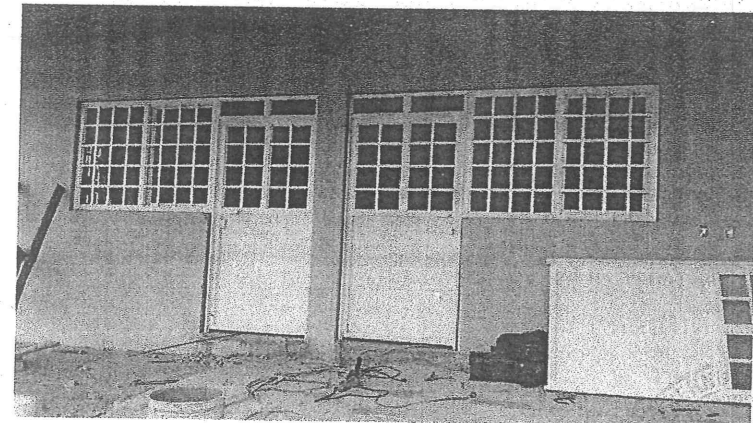

RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASENCIO .


SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN


	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 26-43

NÚMEROS GENERADORES													
PARTIDA		HERRERIA										OBSERVACIONES	
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES					SUPERFICIE	ACUMULADO		
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA				
026VENT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 120X100 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR Y VIDRIO LISO DE 3mm, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION			PZA					1.000			AFICINA	
TOTAL										0.00	1.00	PZA.	
CROQUIS:						FOTOGRAFÍAS:							

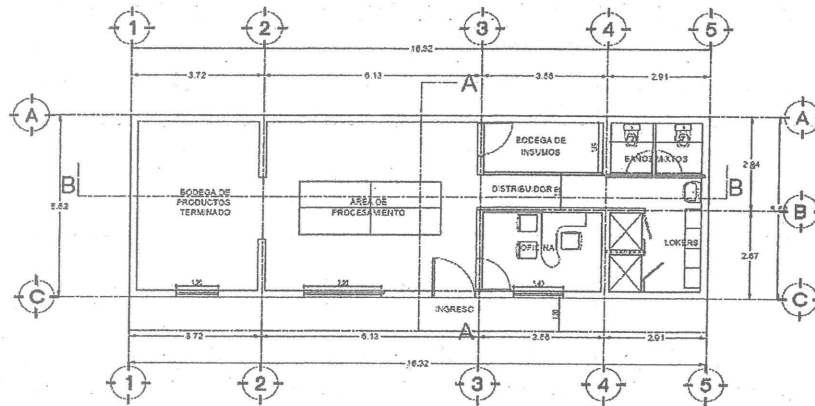

PLANTA ARQUITECTONICA

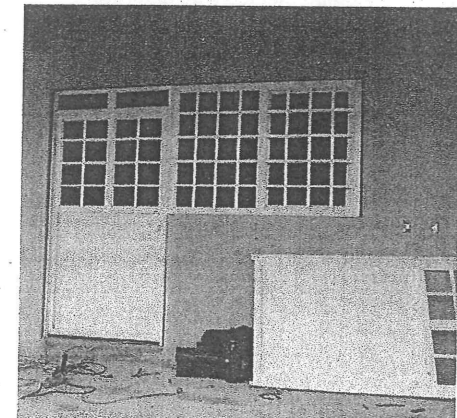


RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN



	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO*	
No. DE CONTRATO:		No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 27-43

NUMEROS GENERADORES												
PARTIDA		HERRERIA										OBSERVACIONES
CONCEPTO		VOLUMEN										
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES							
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA	SUPERFICIE	ACUMULADO	
027VENT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 50X80 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR Y VIDRIO LISO DE 3mm, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION			PZA					2			SANITARIOS
				PZA					2			AREA PROCESO
				PZA					1			BODEGA PRODUCTO T.
TOTAL									0.00	5.00	PZA.	
CROQUIS:						FOTOGRAFIAS:						

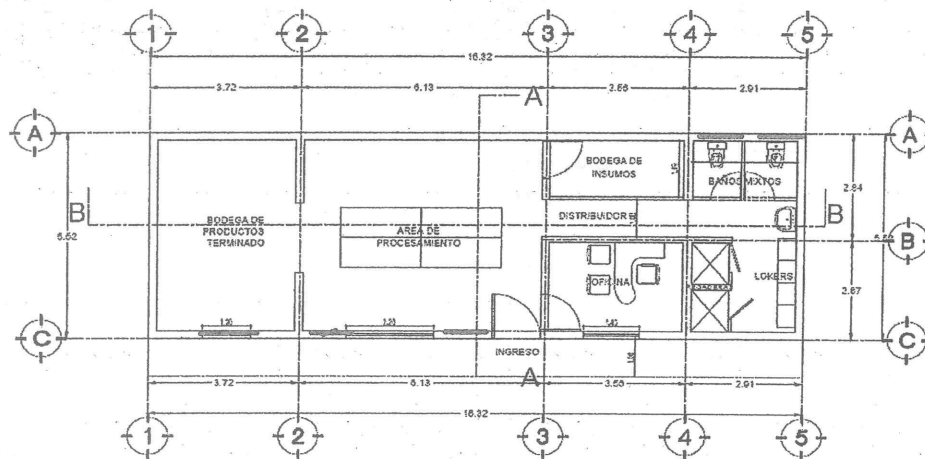

PLANTA ARQUITECTONICA

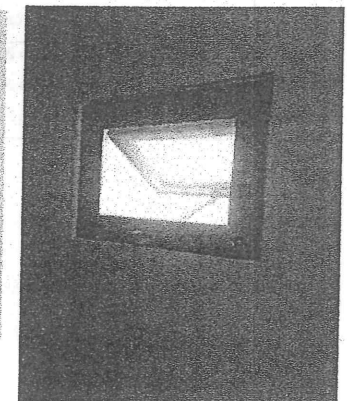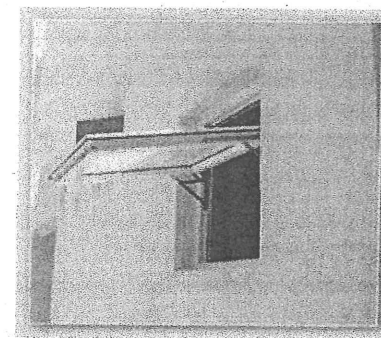

RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASENCIO.




SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC, JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE "JOCOTEPEC, JALISCO",	
No. DE CONTRATO:		No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 29-43

NÚMEROS GENERADORES													
PARTIDA		INSTALACION HIDRAULICA										OBSERVACIONES	
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN				DIMENSIONES							
		EJE	ENTRE	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA	SUPERFICIE	ACUMULADO		
029SALIDH	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA HIDRAULICA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	4-5	A	C	PZA					2.00		2.00	SANITARIO
		4-5	A	C	PZA					2.00		2.00	LABABO
		4-5	A	C	PZA					4.00		4.00	REGADERAS
		2-3	A	C	PZA					2.00		2.00	AREA DE PROCES
TOTAL										0.00		10.00	PZA.
CROQUIS						FOTOGRAFÍAS:							

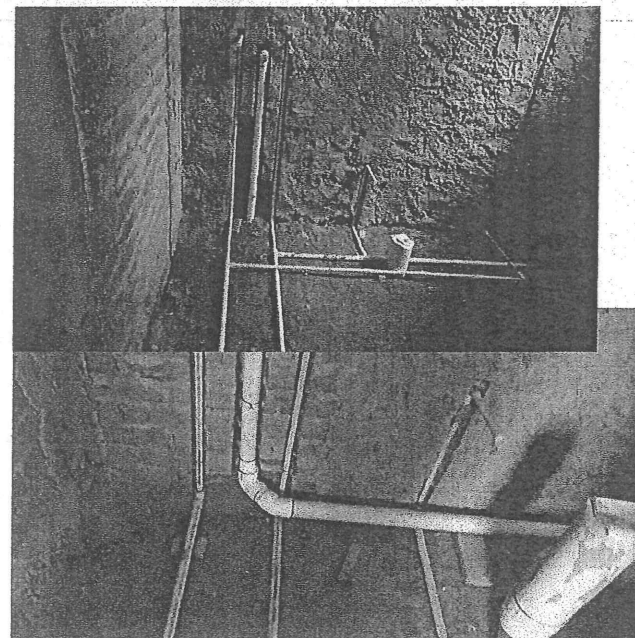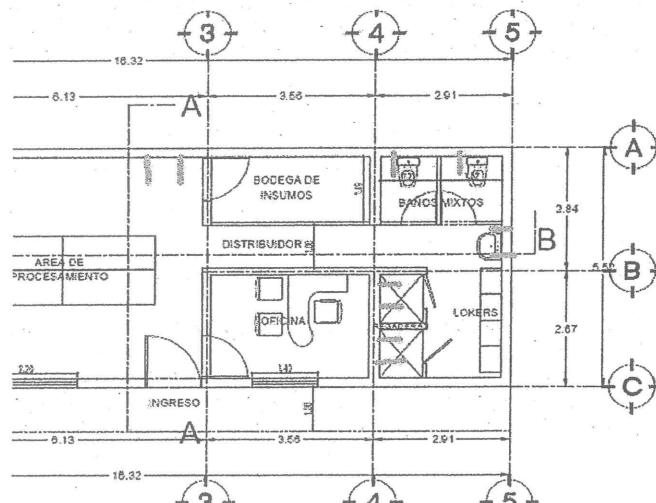



RESIDENTE DE OBRA: K.
RAFAEL ASENCIO.

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: [Signature]
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019


RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 30-43

NÚMEROS GENERADORES												
PARTIDA		INSTALACION HIDRAULICA										OBSERVACIONES
CONCEPTO		VOLUMEN										
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES					SUPERFICIE	ACUMULADO	
		EJE	ENTRE		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO			
		4-5	A	C	PZA					1.00	1.00	SANITARIO
030LAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.											
TOTAL											1.00	PZA.
CROQUIS:						FOTOGRAFIAS:						

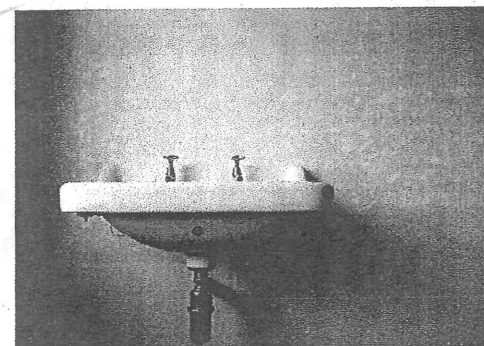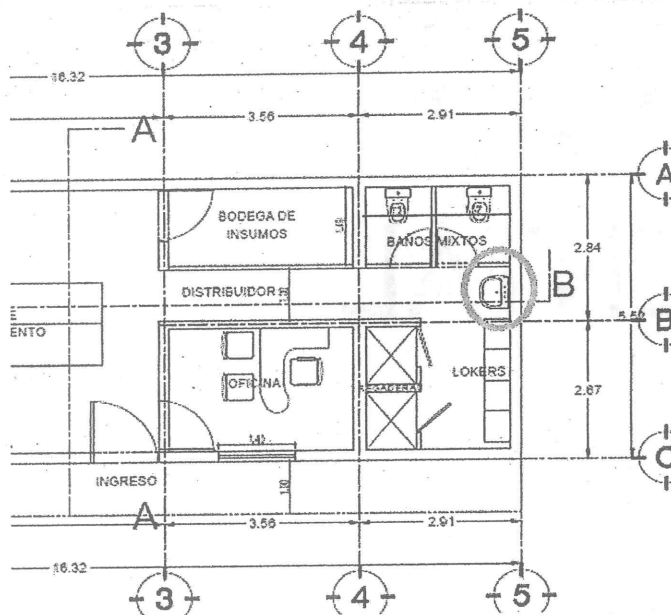

RESIDENTE DE OBRA: R.
RAFAEL ASENCIO.

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: [Signature]
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN





	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 31-43

NÚMEROS GENERADORES													
PARTIDA		INSTALACION HIDRAULICA										OBSERVACIONES	
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES								
		EJE	ENTRE		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA	SUPERFICIE		ACUMULADO
		4-5	A	C	PZA					2.00		2.00	SANITARIO
031WC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE WC INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.												
TOTAL												2.00	PZA.
CROQUIS:						FOTOGRAFIAS:							

OROQUIS:

FOTOGRAFIAS:

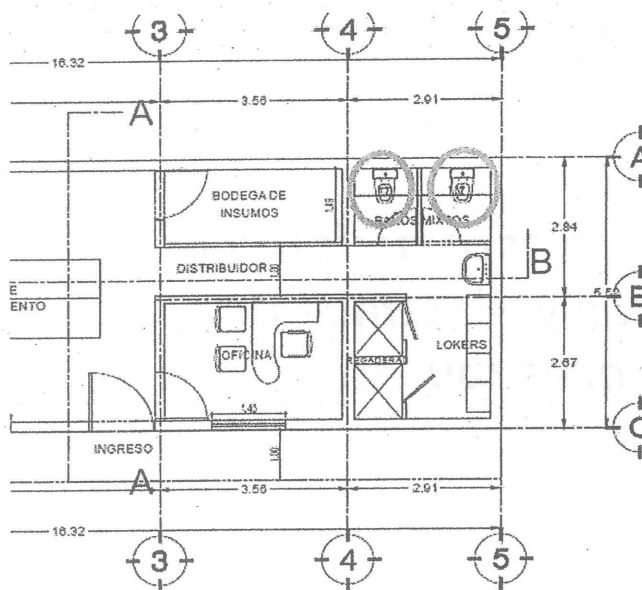

RESIDENTE DE OBRA:
RAFAEL ASENCIO.

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN



	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO;	
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 33-43

NUMEROS GENERADORES												
PARTIDA		INSTALACION HIDRAULICA										OBSERVACIONES
CONCEPTO		VOLUMEN										
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN			DIMENSIONES					SUPERFICIE	1	TINACO
		EJE	ENTRE		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO			
		4-5	A	C	PZA					1.00	2.00	
033TINACO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO 1100 LTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.											
TOTAL											1.00	PZA.
CROQUIS:					FOTOGRAFIAS:							

CROQUIS:

FOTOGRAFIAS:

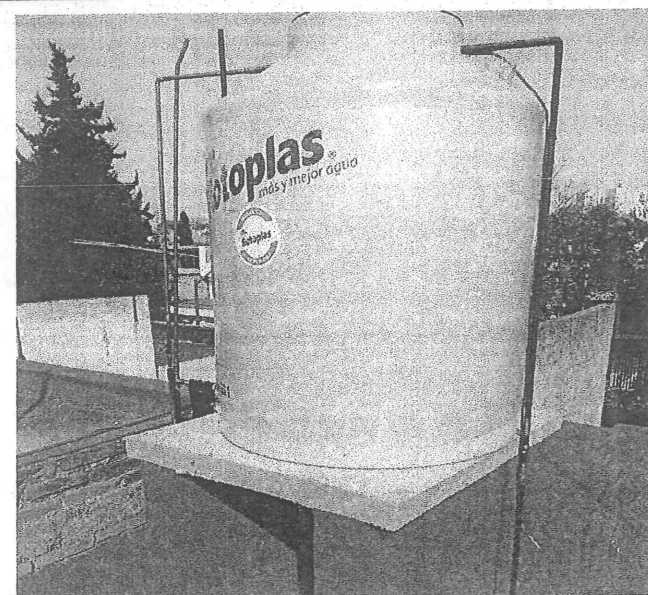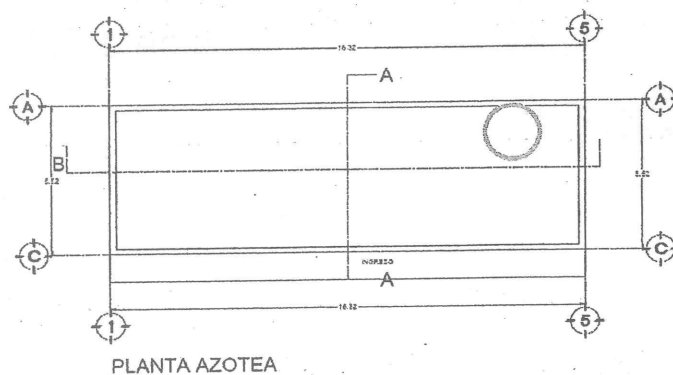


RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASENCIO .

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:




LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN



	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	
No. DE CONTRATO:		No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		No. DE ESTIMACION:
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		4 (CUATRO FINIQUITO)
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		PAGINA: 35-43
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	

NÚMEROS GENERADORES													
PARTIDA		INSTALACION SANITARIA										OBSERVACIONES	
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN				DIMENSIONES							
035SALSAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA SANITARIA DE 4" INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	4-5	A	C	PZA					2.00	2.00	2.00	WC
		4-5	A	C	PZA					1.00	1.00	3.00	LABABO
		4-5	A	C	PZA					2.00	2.00	5.00	REGADERAS
		2-3	A	C	PZA					3.00	3.00	8.00	AREA DE PROCESAMIENTO
TOTAL											8.00	PZA.	
CROQUIS						FOTOGRAFIAS							

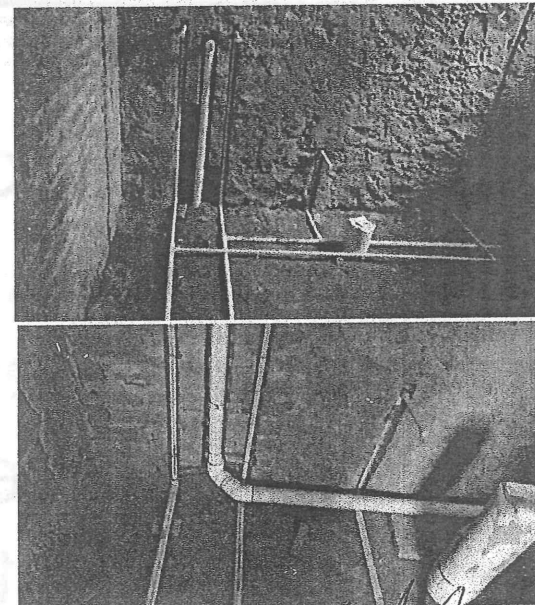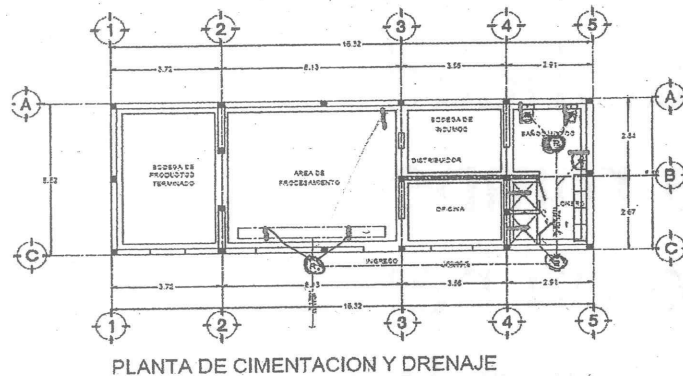


RESIDENETE DE OBRA: R.
 RAFAEL ASENCIO .

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN



	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019	

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		4 (CUATRO FINIQUITO)
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 37-43

NÚMEROS GENERADORES													
PARTIDA		INSTALACION SANITARIA											OBSERVACIONES
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN				DIMENSIONES							
		2-3	A	C	ML	6.00				6.00	6.00	6.00	
037TUBPVC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIAL ES Y MANO DE OBRA	4-5	A	C	ML	4.00				4.00	4.00	10.00	BAÑO
					ML	25.00				25.00	25.00	35.00	A LA RED CALLE MORELOS
												35.00	AREA DE PROCESAMIENTO
TOTAL											35.00	ML	
CROQUIS:					FOTOGRAFÍAS:								

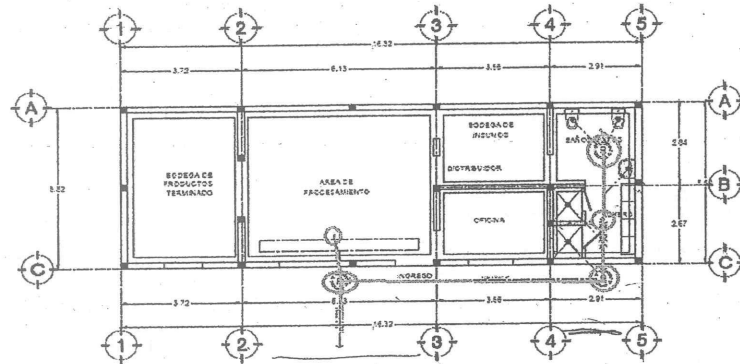

PLANTA DE CIMENTACION Y DRENAJE

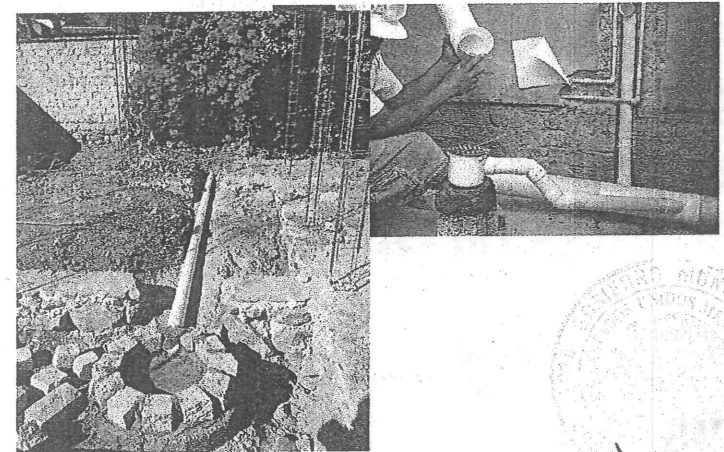


RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO.

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN


	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	AGENCIA DE NEXTIPAC CABECERA MUNICIPAL
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P I D) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 038C 0P/2019	

Razón Social de la Empresa:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		No. DE ESTIMACION:
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		4 (CUATRO FINIQUITO)
DEL 18 AL 28 DE DIC. DEL 2019		
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 41-43

NUMEROS GENERADORES													
PARTIDA		INSTALACION HIDRAULICA										OBSERVACIONES	
CONCEPTO		VOLUMEN											
CLAVE	DESCRIPCION	UBICACIÓN				DIMENSIONES					ACUMULADO		
		EJE	ENTRE		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTO	PZA			
041MANG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 PASTILLAS INCLUYE MATERIALES,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	4-5	A	C	ML	3.00				4.00	12.00	12.00	A. PRODUCTO TERMINADO
						3.00				6.00	18.00	30.00	AREA DE PROCESAMIENTO
						3.00				2.00	6.00	36.00	BODEGA INSUMOS
						3.00				2.00	6.00	42.00	DISTRIBUIDOR
						3.00				2.00	6.00	48.00	OFICINA
						3.00				4.00	12.00	60.00	BAÑOS MIXTOS
						3.00				4.00	12.00	72.00	MARQUESINA
TOTAL										72.00	72.00	ML	
CROQUIS					FOTOGRAFIAS								

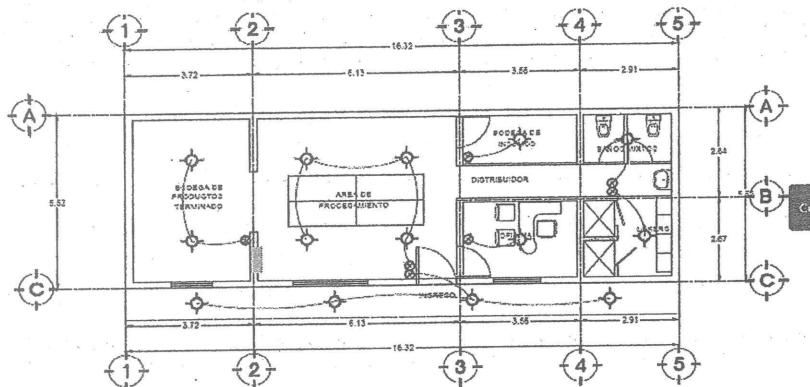

PLANTA INSTALACION ELECTRICA

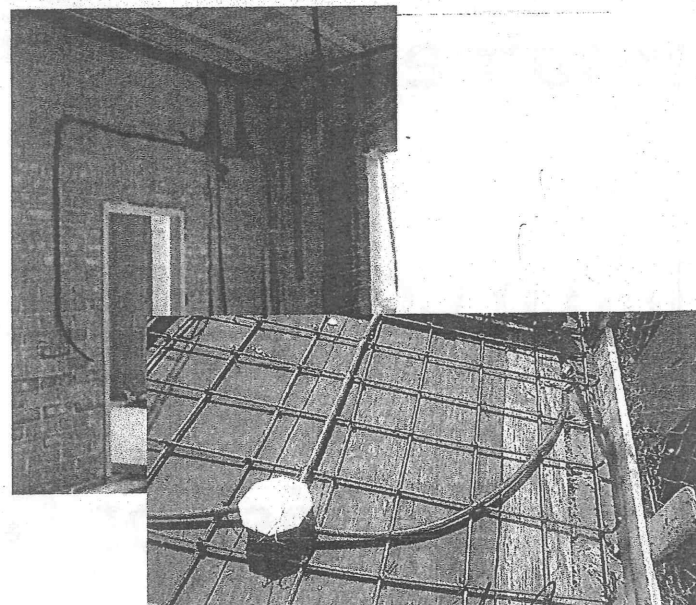

RESIDENTE DE OBRA:

RAFAEL ASENCIO.

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN



CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV

RFC: CPI1705153K5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45050
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha
Uso de
CFDI:

- 2050
20/12/2019 11:45:38
I01 - Construcciones

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. S/N, Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Cant	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE { P I D } EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC JOCOTEPEC, JALISCO", NO. CONTRATO GMJ038CGP/2019 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$3,722.90 NETO A PAGAR \$871,540.86 -%	754,580.83	002 - IVA - 120,732.93	754,580.83

Importe con letra:

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 76/100 M.N.

Subtotal

754,580.83

I.V.A.

120,732.93

Total

875,313.76

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000411623368

Folio fiscal

D8FD98F3-4C75-4CF7-9B7D-B118E30EF2E3

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Diciembre 20 2019 - 11:46:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EKBSwM7v4oY8Cbg/vwJvWp/vRDILNQpmNEa/pnfxP49gvyOPSImqL5N03eGAgbK2yyF0HFZiOrJGDAiodkSsvB
vBZHVw3d7J+olabMZfToQotrA5VN/V1osdDRikA37brrZvIQSKb1LH7YNK3V25CMNrpjJAYGXTUeCptWV72KI
A7MWJ5Ga2VX6UqINdVG662x0A/9iasaCgZke61MwqrRg1BNWwmVqicfOBP1vL/JpL32yi8RrRfpWc6KUCBDG
Js5byfmEu8JFazvIBNROvXy66yodPqQUuKyZHeCH3Ueu6/kFvJGBE/C8r+w48QAf/b7/aW8DaEOOnOFKYJ+w==

Sello del SAT

o6i3bE/RSNKwKpuZWP7IGI/q91kjH8Nm3d86NzdFiuCCITdyUUm/NBQ4YLoLmdRosPkVCzo+HvpoD6gu
eDHWODElPII5RVAR+1Yx41wxegZyQCKpXlWzNjHmLgoWGTJTRqbxugWmch9MPtNwpkscTOWb2wltZZfw
Due3qA+7b8sj8Q9a8754S2hVDFswDLQ8c2/BxzaGbvNiu7o/sRUHIDfdtECdkNZZuY8a27In5FbgQW
KlyvpgT1iOk4JEJ7S15NkcX29jirzZ8mSyn6h3O0Zaph4Xoj0lGjQsD1J5YJY89MSbaax/VySOCkj2XS
mKmAQTKhBjkrmmLzeyuVGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D8FD98F3-4C75-4CF7-9B7D-B118E30EF2E3|2019-12-20T11:46:18|MAS0810247C0|EKBS
wM7v4oY8Cbg/vwJvWp/vRDILNQpmNEa/pnfxP49gvyOPSImqL5N03eGAgbK2yyF0HFZiOrJGDAiodkSs
vBZHVw3d7J+olabMZfToQotrA5VN/V1osdDRikA37brrZvIQSKb1LH7YNK3V25CMNrpjJAYGXTUeC
ptWV72KiA7MWJ5Ga2VX6UqINdVG662x0A/9iasaCgZke61MwqrRg1BNWwmVqicfOBP1vL/JpL32yi8
RrRfpWc6KUCBDGJs5byfmEu8JFazvIBNROvXy66yodPqQUuKyZHeCH3Ueu6/kFvJGBE/C8r+w48QAf/
b7/aW8DaEOOnOFKYJ+w==|00001000000404486074||



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPI1705153K5	CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8FD98F3-4C75-4CF7-9B7D-B11BE30EF2E3	2019-12-20T11:45:38	2019-12-20T11:46:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$875,313.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir
