

BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV

R.F.C. : BCO070129512

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido en el C.P. 45300

Cliente	Tipo de comprobante	Versión	UUID - Folio Fiscal
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO R.F.C. : MJJ850101KP8	I - Ingreso	CFDI v 3.3	C4750203-1A8E-6460-DAC3-487C74BE48CF
	Folio de Control Interno		Número de serie del CSD del emisor
	Factura 277		00001000000404524890
	Forma de Pago		Fecha y Hora de Emisión
	03 - Transferencia electrónica de fondos		20 de Septiembre de 2018 12:35:02 pm
Uso del CFDI	Método de Pago		Tipo de Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave SAT Prod/Serv	Descripción	Clave SAT Unidad	Unidad	Precio	Importe
1	72151500	ESTIMACION 1, CONTRATO: GMJ 12C OPO-2018 CORRESPONDIENTE A LA DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. RETENCION DE 5 AL MILLAR \$ 3,120.85 NETO A PAGAR \$ 720,916.07	E48	SERVICIO	624,169.76	624,169.76

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
624,169.76	002- IVA	Tasa	0.160000	99,867.16

Importe con Letra

SubTotal

624,169.76

IVA 16 %

99,867.16


TOTAL

724,036.92

---(Setecientos veinticuatro Mil treinta y seis Pesos 92/100 M.N.)---

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v 3.3

Código del timbre:	Número de serie del CSD del SAT	RFC Proveedor Certificado	Fecha y Hora de Certificación
	00001000000402636111	SAD110722MQA	20 de Septiembre de 2018 12:40:00 pm
SELLO DIGITAL DEL SAT:			
alZh+KfuQXjWSZFKDnb7BbRhmUgBKxqkng7zkJenQh83U5ZkoLzi2mP6xoeCK5uLEqBKBao9VhvzdNGdcYnTmrBYqb2r23cNQyHTGXEXEYSLwCzQeuw9apbfyzxPCakrBGz2WHrFLNmlnQu1ddZNVFxCzfM0T60zs9f6ptdHsCbBGPzLDUzpyPaAUy3y+fvitGJhEBYDBMFVzCqkNRIVPYzxKAgRfx69tcDmq+Y15+N0ofwYfouOFEZgoTVN44oSbu6daQ6v3GS6RGn8kys8m9GRPrnD87YUACugiuuhz7Vm/2Z1crmsbrVZxDIH756niRE7t4Tt0j0s3wjAcg==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:			
[1.1][C4750203-1A8E-6460-DAC3-487C74BE48CF[2018-09-20T12:40:00][SAD110722MQA/APKM5oi9NQZoS7ogASOpHwG9mNTiprWOH2pMBJXGqaZdEa8gbZhID0p66rY+N5XJ076sWakuLPhrJpivhfIGEY+BLqzh7nKT5AigCUPUcM3Vnya9s6ZLKutOjck55rC7JIC9qVjN1AhtXUgRLi4qATOvHI+Ck4zLWlwaunA9c4i08tiavj4WLoQ4nODw4CPTTRJNkWsrxbrax4TV8l+Cm+9olsauWJh3/8UQUc9ZPdIlSKKz6z113xmnDzEeaYRAAu3iD1fml3xpmco3oG8BHMAxJ4PWYkI04UCvPA7BUdDnNirbkpuoyUeil+aMvp1Op+ICjG/DQ==]]			
SELLO DIGITAL DEL CFDI:			
APKM5oi9NQZoS7ogASOpHwG9mNTiprWOH2pMBJXGqaZdEa8gbZhID0p66rY+N5XJ076sWakuLPhrJpivhfIGEY+BLqzh7nKT5AigCUPUcM3Vnya9s6ZLKutOjck55rC7JIC9qVjN1AhtXUgRLi4qATOvHI+Ck4zLWlwaunA9c4i08tiavj4WLoQ4nODw4CPTTRJNkWsrxbrax4TV8l+Cm+9olsauWJh3/8UQUc9ZPdIlSKKz6z113xmnDzEeaYRAAu3iD1fml3xpmco3oG8BHMAxJ4PWYkI04UCvPA7BUdDnNirbkpuoyUeil+aMvp1Op+ICjG/DQ==			



C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BCO070129512	MUN BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó

C4750203-1A8E-6460- 2018-09- 2018-09- SAD110722MQA
DAC3-487C74BE48CF 20T12:35:02 20T12:40:00

Total del CFDI **Efecto del** **Estado CFDI**
comprobante

\$724,036.92 Ingreso Vigente

Imprimir



Enlaces

Declaración de Accesibilidad
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
Política de privacidad
(<https://www.gob.mx/privacidad>)
Términos y Condiciones
(<https://www.gob.mx/terminos>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
Denuncia contra servidores públicos
(<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion->

[Marco Jurídico](#)<http://www.ordenjuridico.gob.mx>[Portal de Obligaciones de](#)[Transparencia](#)<http://portaltransparencia.gob.mx>[Sistema Infomex](#)<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>[INAI](#)<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>[Mapa de sitio](#)<https://www.gob.mx/sitemap>[English](#)<https://www.gob.mx/en/index>[Temas](#)<https://www.gob.mx/temas>[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)[de-quejas-y-denuncias-en-la-](#)[sfp/SFP54\)](#)

Mantente informado.
Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



Síguenos en




 H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: GMJ 12C OP/2018		HOJA DE RELACIÓN	HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		PERÍODO DE TRABAJO:	
	UBICACIÓN: JOCOTEPEC		DEL:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018
			FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION									
HOJA No.		P A R T I D A S			I M P O R T E S				
		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			\$ 624,169.76				

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129512

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: 25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-
CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXITPAC), HASTA CALLE JUÁREZ
(CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : JOCOTEPEC

CONTRATISTA : BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				IMPORTE				ESTIMACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA ACTUAL	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONOCOCIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES PRUEBAS.MANO DE OBRA.HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	18.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	\$7,400.99	\$133,217.82	\$133,217.82	\$0.00	\$0.00
2	ANCLA DE ACERO YCONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2.MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARASU CORRECTA INSTALACION	pza	18.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	\$1,214.15	\$21,854.70	\$21,854.70	\$0.00	\$0.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x40x60 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO. INCLUYEMATERIALES PRUEBAS.MANO DE OBRA.HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	16.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	\$1,290.41	\$20,646.56	\$20,646.56	\$0.00	\$0.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION POREL INTERIOR DEL POSTE DE 9 MT. DESDE EL REGISTROHASTA LA LUMINARIA. CON TRES CABLES XLPUNIPOLAR CAL 8. INCLUYE 3 CONECTORES DECOMPRESION YPC-A08. Y CINTA AISLANTEVULCANIZABLE. ASI COMO PRUEBAS. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	12.0000	0.0000	12.0000	12.0000	0.0000	\$704.14	\$8,449.68	\$8,449.68	\$0.00	\$0.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 2+1 CAL 6 . AL 600 VOLTS. INCLUYE MATERIALES. PRUEBAS.MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO	m	400.0000	0.0000	400.0000	400.0000	0.0000	\$41.73	\$16,692.00	\$16,692.00	\$0.00	\$0.00
6	LUMINARIA MARCA RAYHUNTER MOD PLANK DE 100 WATTS EN LED A 220 VOLTS ANTIVANDALICA. INCLUYE BRAZO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	30.0000	0.0000	30.0000	30.0000	0.0000	\$9,401.37	\$282,041.10	\$282,041.10	\$0.00	\$0.00
7	ESTRUCTURA EN MT TIPO "1TR2B" INCLUYE MANO DEOBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$9,190.73	\$9,190.73	\$9,190.73	\$0.00	\$0.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORTIPO POSTE DE 15 KVA CON RELACION DETRANSFORMACION DE 23 KV/120-240 V. CONPROTOCOLO Y NORMA "K" PARA ENTREGAR A CHE	pza	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$37,092.16	\$37,092.16	\$37,092.16	\$0.00	\$0.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE CONTACTOR. GABINETE. INTERRUPTOR. FOTOCELDA Y RECEPTACULO PARA LA MISMA. CABLEADO. INCLUYE: GABINETE NEMA 3R. FOTOCELDA. TUBOCOONDUIT. CONTACTOR. INTERRUPTOR. CONECTORES.CABLE THHW CAL. No. 6. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION	lote	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$6,272.73	\$6,272.73	\$6,272.73	\$0.00	\$0.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA SISTEMA DE MEDICION Y ALIMENTACION A FOTOCONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO DE 240DAMP MARCA SIEMENS. INCLUYE MATERIALE MENOR DE SUJECION.MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARASU INSTALACION	pza	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$3,881.64	\$3,881.64	\$3,881.64	\$0.00	\$0.00
11	EXCAVACION DE FORMA MANUAL EN CEPAS DE 0.00 A2.00 M DE PROFUNDIDAD. EN MATERIAL TIPO II. ENSECO. INCLUYE: AFLOJE. EXTRACCION. REMOCION TRASPALOE. LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPAS. TALUDES Y MANO DE OBRA	m	400.0000	0.0000	400.0000	400.0000	0.0000	\$82.24	\$32,896.00	\$32,896.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
PABA

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: 25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-
CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ
(CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : JOCOTEPEC

CONTRATISTA : BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA									
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTES		
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA ANTERIOR
12	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGEROAL 80% DE SU PVSIM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA	m3	64.0000	0.0000	64.0000	\$89.24	\$5,711.36	\$5,711.36	\$0.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRAL 2+1 CAL 6	m	324.0000	0.0000	323.5000	\$35.48	\$11,495.52	\$11,477.78	\$0.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE A.P. 1P2	pza	5.0000	0.0000	5.0000	\$685.99	\$3,429.95	\$3,429.95	\$0.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE A.P. 1R2	pza	6.0000	0.0000	6.0000	\$840.34	\$5,042.04	\$5,042.04	\$0.00
16	PAGO A LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE)	pza	1.0000	0.0000	1.0000	\$10,790.62	\$10,790.62	\$10,790.62	\$0.00
17	PAGOS A CFE 1 POR APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONEXIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO	pza	1.0000	0.0000	1.0000	\$15,482.89	\$15,482.89	\$15,482.89	\$0.00
						SUMA	\$ 624,187.50	\$ 624,169.76	\$ -
						IVA	\$ 99,870.00	\$ 99,867.16	\$ -
						TOTAL	\$ 724,057.50	\$ 724,036.92	\$ -

Pia Lorena Buenrostro A.
C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Juan Manuel Garcia Escoto
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES					
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA ARMADA DE 3/4" x 1.00 MT. INCLUYE ANCLA DE ACERO Y CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2.MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION				
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
pza	ANCLAS DE C1-L1, C1-L2, C1-L3, C1-L4, C1-L5, C1-L6, C1-L7, C1-L8, C1-L9, C1-L10, C1-L11, C1-L12, C1-L13, C1-L14, C1-L15, C1-L16, C1-L17, C1-L18				18.00
				SUMA	18.00

CROQUIS Y OBSERVACIONES

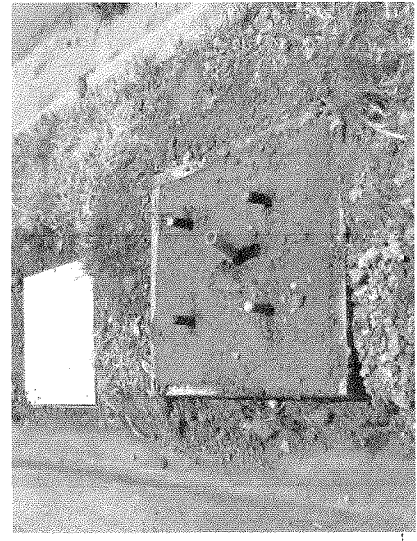

C. Pia Lorena Buenrostro Ahued

C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO


Luis Rigoberto Olmedo Navarro

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

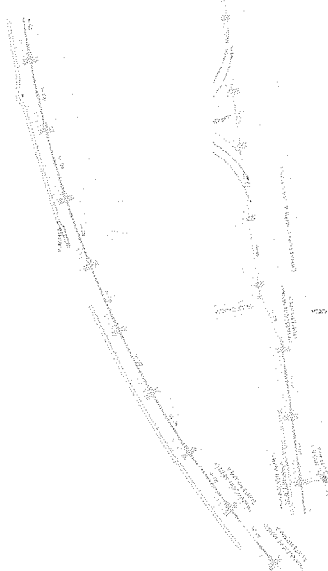NUMEROS GENERADORES						
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x40x60 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYEMATERIALES,PRUEBAS,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO					
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	REGISTROS C1-L1, C1-L2, C1-L3, C1-L4, C1-L5, C1-L6, C1-L7, C1-L8, C1-L9, C1-L10, C1-L11, C1-L12, C1-L13, C1-L14, C1-L15, C1-L16, C1-L17, C1-L18				18.0000	18.00
					SUMA	18.00
 						
CROQUIS Y OBSERVACIONES						

C. Pía Lorena Buenrostro Ahued
C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

[Signature]
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES				
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION POREL INTERIOR DEL POSTE DE 9 MT, DESDE EL REGISTROHASTA LA LUMINARIA, CON TRES CABLES XLPUNIPOLAR CAL. 8, INCLUYE 3 CONECTORES DECOMPRESION YPC-AU8, Y CINTA AISLANTEVULCANIZABLE, ASI COMO PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO			CROQUIS Y OBSERVACIONES

UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	EN LOS POSTES C1-L1, C1-L2, C1-L3, C1-L4, C1-L5, C1-L6, C1-L7, C1-L8, C1-L9, C1-L10, C1-L11, C1-L12				12.0000	12.00
					SUMA	12.00

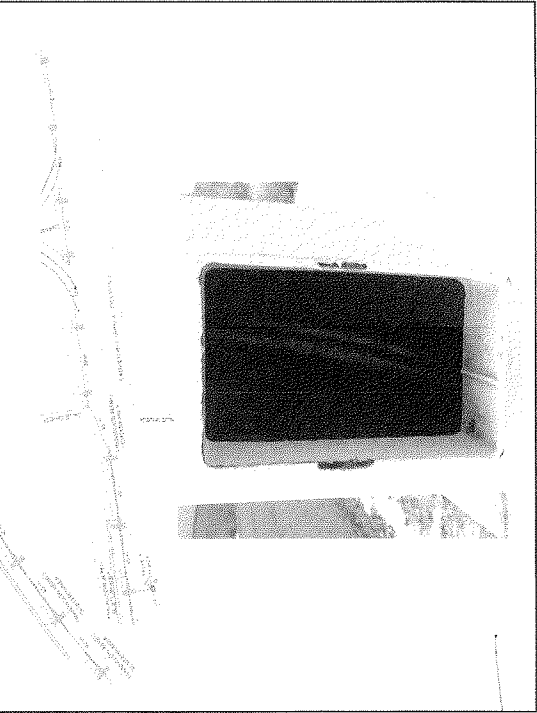

C. Pía Lorena Buenrostro Ahued
C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO


Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), TRA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES							CROQUIS Y OBSERVACIONES
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP 2+1 CAL 6 , AL 600 VOLTS, INCLUYE MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO						
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
m	C1-L2	C1-L3	40.00			40.00	
	C1-L3	C1-L4	40.00			40.00	
	C1-L4	C1-L5	40.00			40.00	
	C1-L5	C1-L6	40.00			40.00	
	C1-L6	C1-L7	40.00			40.00	
	C1-L7	C1-L8	40.00			40.00	
	C1-L8	C1-L9	40.00			40.00	
	C1-L9	C1-L10	40.00			40.00	
	C1-L10	C1-L11	40.00			40.00	
	C1-L11	C1-L12	40.00			40.00	
						SUMA	400.00

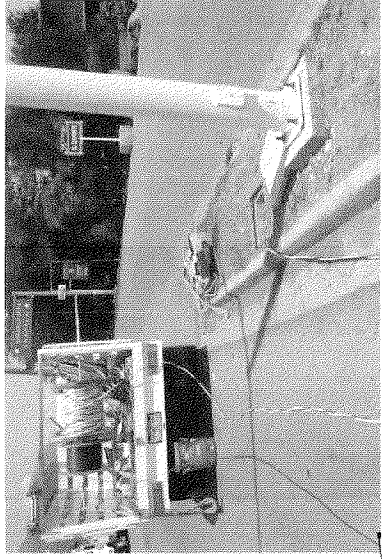


C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO


ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES						
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
6	LUMINARIA MARCA RAYHUNTER MOD PLANCK DE 100 WATTS EN LED A 220 VOLTS ANTIVANDÁLICA, INCLUYE BRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN					
	C1-L1				2.0000	2.00
	C1-L2				2.0000	2.00
	C1-L3				2.0000	2.00
	C1-L4				2.0000	2.00
	C1-L5				2.0000	2.00
	C1-L6				2.0000	2.00
	C1-L7				2.0000	2.00
	C1-L8				2.0000	2.00
	C1-L9				2.0000	2.00
	C1-L10				2.0000	2.00
	C1-L11				2.0000	2.00
	C1-L12				2.0000	2.00
	C1-L13				1.0000	1.00
	C1-L14				1.0000	1.00
	C1-L15				1.0000	1.00
	C1-L16				1.0000	1.00
	C1-L17				1.0000	1.00
	C1-L18				1.0000	1.00
					SUMA	30.00

CROQUIS Y OBSERVACIONES

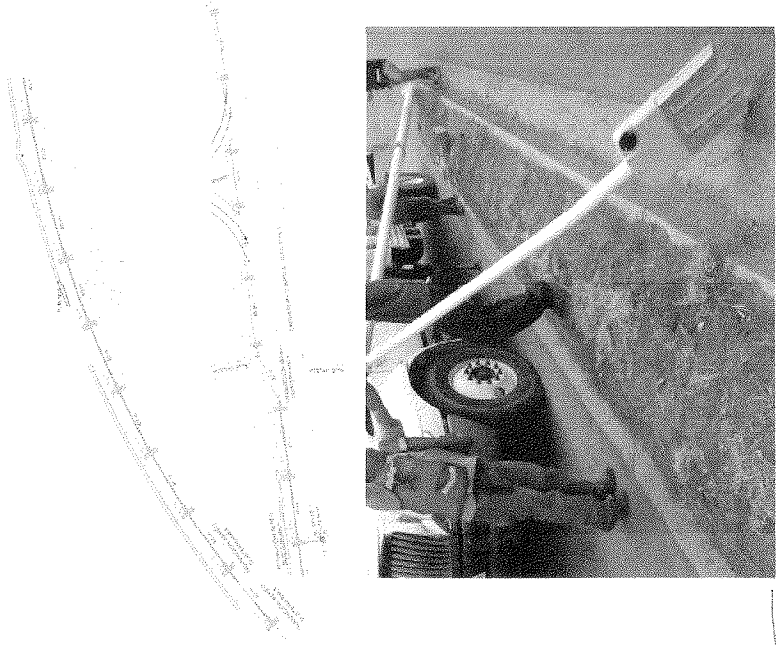


C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

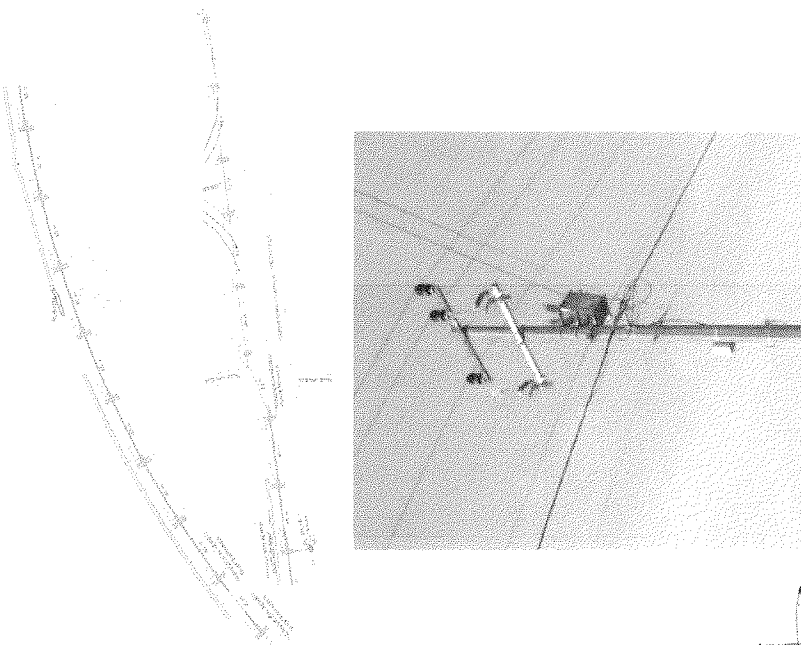NUMEROS GENERADORES							CROQUIS Y OBSERVACIONES
7	ESTRUCTURA EN MT TIPO "1TR2B", INCLUYE MANO DEOBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SUCORRECTA INSTALACION						
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
pza	EN POSTE PE-1				1.0000	1.00	
					SUMA	1.00	



C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO



ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO



ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES						
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA CON RELACION DETRANSFORMACION DE 23 KV/120-240 V, CONPROTOCOLO Y NORMA "K" PARA ENTREGAR A CFE					
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	EN TRO E-1 EN POSTE PE-1				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

CROQUIS Y OBSERVACIONES

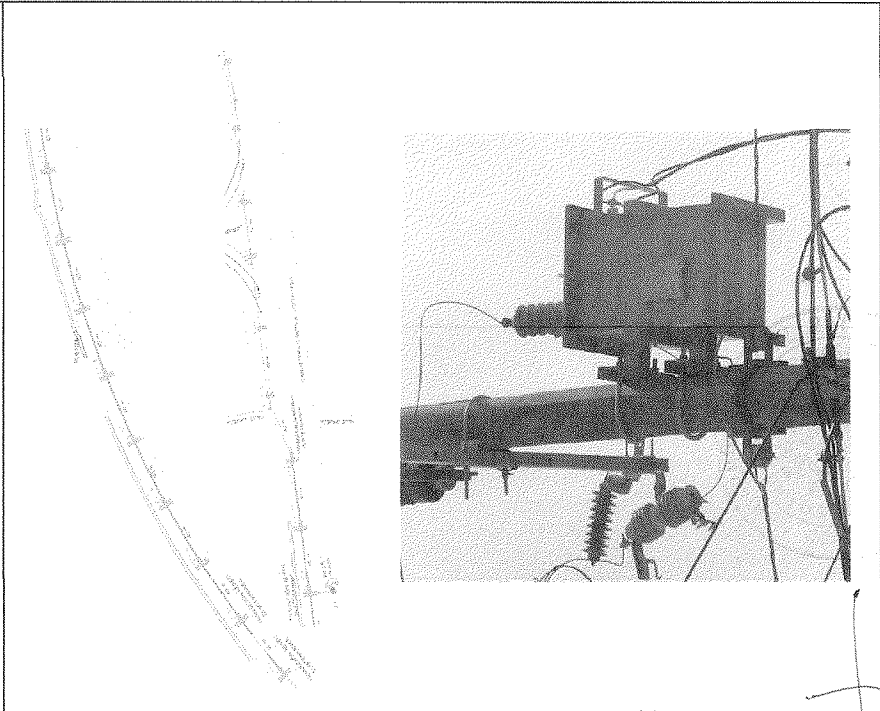

C. Pía Lorena Buenrostro Ahued
C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300

RFC: BCO 070129 512


EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES						
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE CONTACTOR, GABINETE, INTERRUPTOR, FOTOCELDA Y RECEPTACULO PARA LA MISMA, CABLEADO, INCLUYE: GABINETE NEMA 3R, FOTOCELDA, TUBOCONDUIT, CONTACTOR, INTERRUPTOR, CONECTORES, CABLE THHW CAL. No. 6, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION	CROQUIS Y OBSERVACIONES				
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
lote	EN POSTE PE-1				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

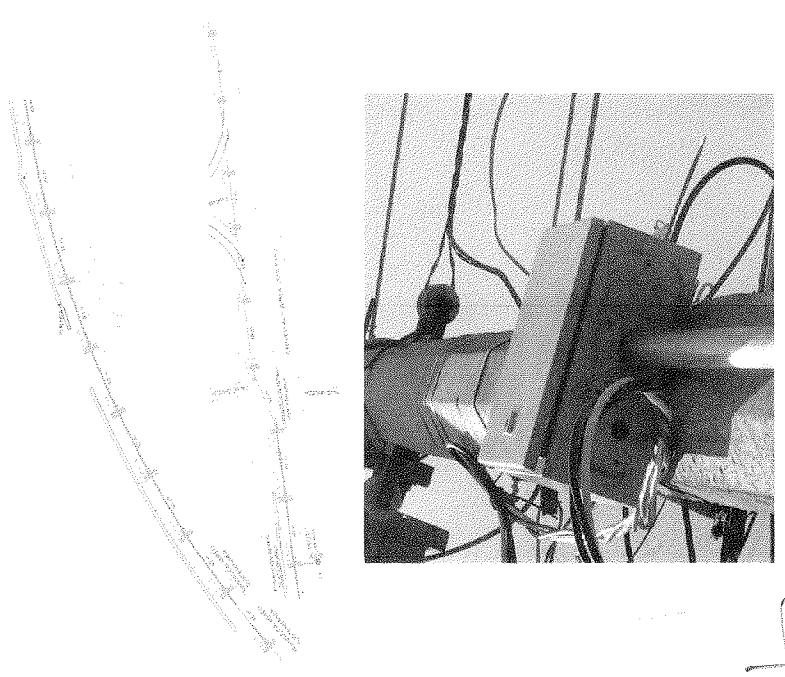



BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES					
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA SISTEMA DE MEDICION Y ALIMENTACION A FOTOCONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2x40AMP MARCA SIEMENS, INCLUYE MATERIALE MENOR DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA
UNIDAD	TRAMO				TOTAL
pza	EN POSTE PE-1				1.0000
					1.00
				SUMA	1.00

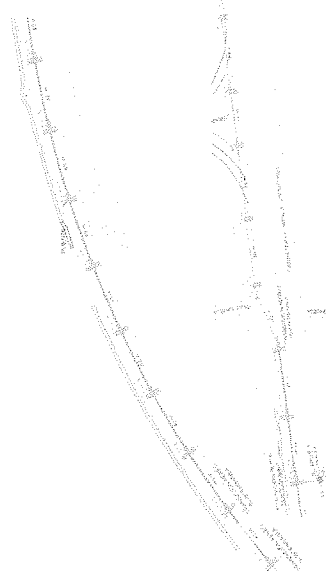

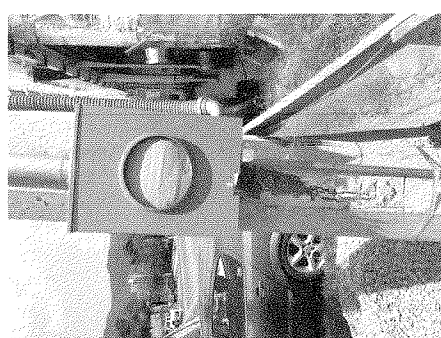

C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES																	
11	EXCAVACION DE FORMA MANUAL EN CEPAS DE 0.00 A2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II, ENSECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION, TRASPALEO, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA, TALUDES Y MANO DE OBRA.																
UNIDAD	TRAMO												LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
m	C1-L2	C1-L3	C1-L4	C1-L5	C1-L6	C1-L7	C1-L8	C1-L9	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00				40.00	
	C1-L3	C1-L4	C1-L5	C1-L6	C1-L7	C1-L8	C1-L9	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00					40.00	
	C1-L4	C1-L5	C1-L6	C1-L7	C1-L8	C1-L9	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00						40.00	
	C1-L5	C1-L6	C1-L7	C1-L8	C1-L9	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00							40.00	
	C1-L6	C1-L7	C1-L8	C1-L9	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00								40.00	
	C1-L7	C1-L8	C1-L9	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00									40.00	
	C1-L8	C1-L9	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00										40.00	
	C1-L9	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00											40.00	
	C1-L10	C1-L11	C1-L12	40.00												40.00	
	C1-L11	C1-L12	40.00													40.00	
	C1-L12	40.00														40.00	
																SUMA	400.00
CROQUIS Y OBSERVACIONES																	

CROQUIS Y OBSERVACIONES

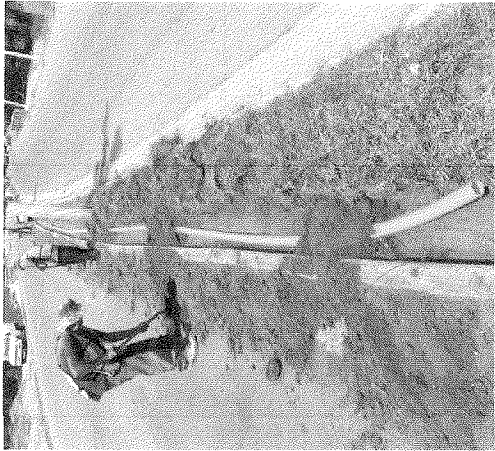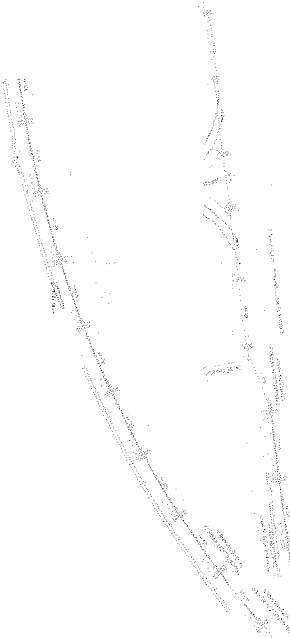


C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO


ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

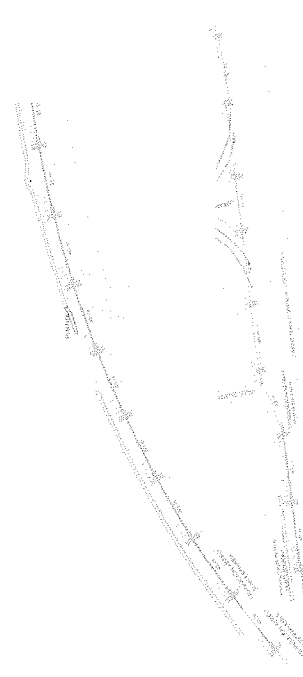NUMEROS GENERADORES							CROQUIS Y OBSERVACIONES
12	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LAEXCAVACIÓN, COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGEROAL 90% DE SU PVSM. INCLUYE: INCORPORACIÓN DEHUMEDAD, HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN YMANO DE OBRA						
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
m3	C1-L2	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L3	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L4	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L5	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L6	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L7	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L8	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L9	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L10	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L11	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	C1-L12	40.00	0.4000	0.4000		6.40	
	SUMA					64.00	

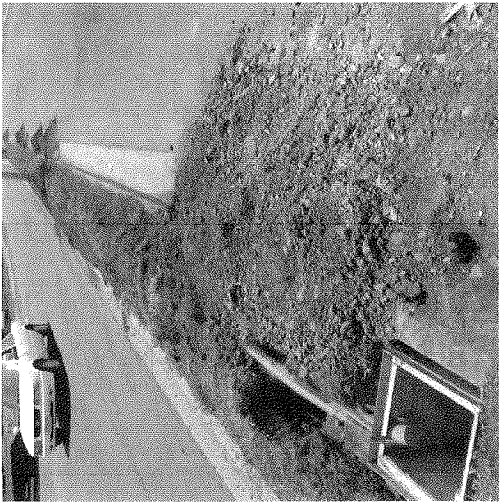

C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES								
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6							
m	UNIDAD	TRAMO		LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
		C1-L1	C1-L2	40.00				40.00
		C1-L12	C1-L13	33.60				33.60
		C1-L13	C1-L14	43.00				43.00
		C1-L14	C1-L15	48.00				48.00
		C1-L15	C1-L16	30.60				30.60
		C1-L16	C1-L17	41.30				41.30
		C1-L17	C1-L18	40.00				40.00
		PE-1	C1-L10	17.00				17.00
		TRANSICIÓN EN C1-L2		10.00				10.00
		TRANSICIÓN EN C1-L10		10.00				10.00
		TRANSICIÓN EN C1-L12		10.00				10.00
							SUMA	323.50

CROQUIS Y OBSERVACIONES

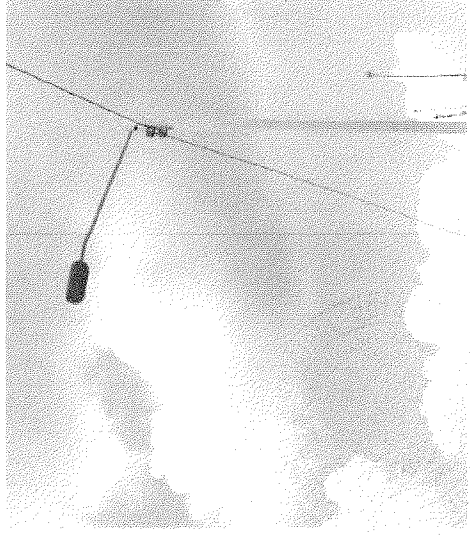

Por Lorena Buenrostro Ahued
C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Luis Rigoberto Olmedo Navarro
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES						
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE A.P. 1P2					
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	C1-L13				1.00	1.00
	C1-L14				1.00	1.00
	C1-L15				1.00	1.00
	C1-L16				1.00	1.00
	C1-L17				1.00	1.00
					SUMA	5.00

CROQUIS Y OBSERVACIONES

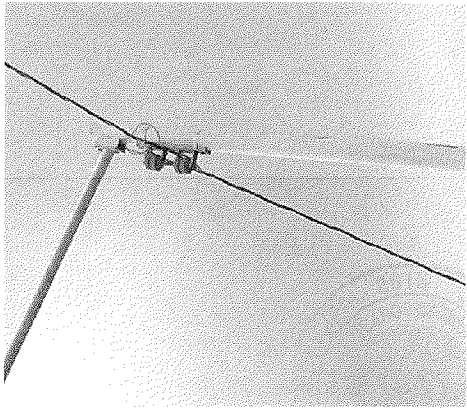

Por: Lorena Buenrostro A.

C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

[Signature]



ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES						
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE A.P. 1R2					
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	C1-L1				1.00	1.00
	C1-L2				1.00	1.00
	C1-L10				1.00	1.00
	C1-L12				1.00	1.00
	C1-L18				1.00	1.00
	PE-1				1.00	1.00
					SUMA	6.00
CROQUIS Y OBSERVACIONES						

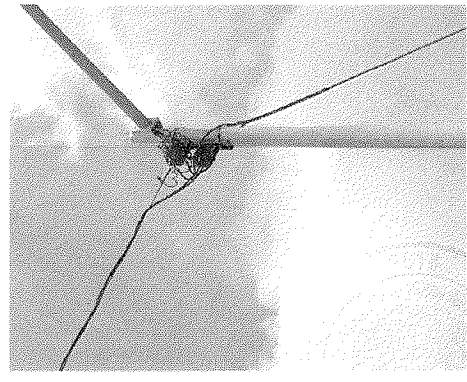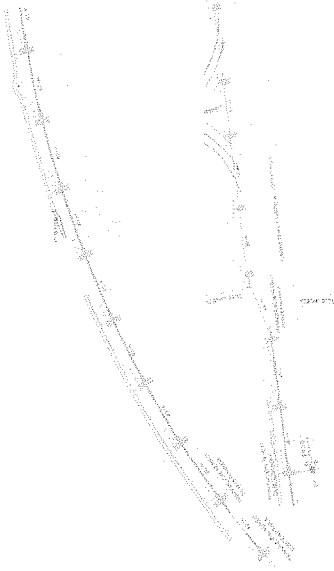

C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

NUMEROS GENERADORES							CROQUIS Y OBSERVACIONES
16	PAGO IX A LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTLACIONES ELECTRICAS (UVIE)						
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
pza					1.0000	1.00	
					SUMA	1.00	
 C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED ADMINISTRADOR GENERAL UNICO  ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO							


C. Pía Lorena Buenrostro Ahued
C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300
 RFC: BCO 070129 512

EMPRESA:	BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO			

LOCALIDAD:	JOCOTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

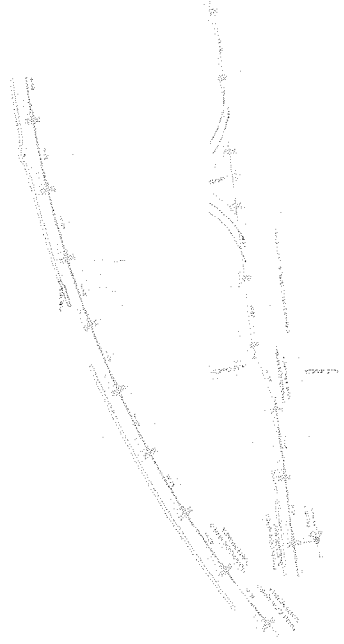NUMEROS GENERADORES							CROQUIS Y OBSERVACIONES
17	PAGOS A CFE 1 POR APROBACION, SUPERVISION Y CONEXION DE PROYECTO ELECTRICO						
UNIDAD	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
pza					1.0000	1.00	
					SUMA	1.00	


C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO


ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


 C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO


 ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
