



NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

JOSE GARCIA 5
Colonia: LAS PINTAS C.P.:45690
EL SALTO, JALISCO. MEXICO
R.F.C.:DOCN880311AK3
Tels.:

El Salto, Jalisco a 26 de julio de 2018 Hora : 10:10:39 am
Regimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Metodo de Pago:
PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago:
99 Por definir
Folio Fiscal SAT:
57658303-3EFD-4D05-9636-37DDAB0CD0BF
Condiciones de pago:

Factura No.
D105
No. de Certificado Emisor
00001000000307045355
No. de Certificado del SAT
00001000000405607284
Fecha Hora de Certificación
2018-07-26T10:18:39

Tipo de Comprobante: Ingreso
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
PALACIO MUNICIPAL Interior: S/N
COL. CENTRO C.P.:45800
JOCOTEPEC JALISCO. MEXICO
Uso CFDi: I01 Construcciones

ClaveProdServ	Cantidad	U	SAT	Unidad	Descripción	Precio	Importe
39111603	1.00	E48			ESTIMACION N°: 1(UNICA Y FINIQUITO)	353,377.56	353,377.56
			Impuesto: 002 IVA		Base: 353,377.56 Tipo factor: Tasa Tasa: 0.160000		Importe: 56,540.41
PERIODO: DEL 26 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2018							
OBRA: REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS							
PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL							
DE JOCOTEPEC, JALISCO.							
NUMERO DE CONTRATO: GMJ 018 C OP/2018							
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL							
CONTRATISTA: NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO							

Importe con Letra
(CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100 M.N.)

Sub-Total:	353,377.56
I V A:	56,540.41
TOTAL:	409,917.97



Sello Digital del Emisor

a4DyDKKHmIXCjHZYve/EddfZJ2yZ2pIQldiYoXZ9XYTx0anSP361HpWpJdUFnZzWk/qjeXMA9hwumm/3IZWNltk5Su
J2TLDcup/8Ov6cE/xyZwCADPO3opAe1x1pidX9MO94gXZD3ep/GA4hlbe6DqcSc92vJn3QGIGCefarkTw=

Sello Digital del SAT

8QUonZBajGgeGhUx2qxflktNIU8mP8Uje7Sq/bqxGINO2t4xG6zSwyZoJgrElfugYsEHuYrC2VPvVDNSRL1ie/5I5
Nw5/pCqiaZ1tjZWWYvUzjkKv90nUtBSmE0bsXjFVkp:0/BJSlud2a9zHc4p2tJnmrl5BHblHCpivNOTm+4xah4toFwAdn72SZEQCvpZcxKYD
DCSpvyriUucdb06WABSZkGjFdbcg9vAkGODRRB/uMw/tIA7mTTrR0sLD4fAVk7huN2TRQXfz/AT8akJAAVTDNXOjMiKTjVv1AIFbJ+rZxJ
5XM1dejWgtVYLddu0NsaxRP55/Tm+LRpWLZUng==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|57658303-3EFD-4D05-9636-37DDAB0CD0BF|2018-07-26T10:18:39|FCG840618N51|a4DyDKKHmIXCjHZYve/EddfZJ2yZ2pIQldiYoXZ9XYTx0anSP361HpWpJdUFnZzWk/qjeXMA9hwumm/3IZWNltk5SuJ2TLDcup/8Ov6cE/xyZwCADPO3opAe1x1pidX9MO94gXZD3ep/GA4hlbe6DqcSc92vJn3QGIGCefarkTw=|00001000000405607284||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDi

[Handwritten signature]

ESTADO DE JALISCO

 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor	Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
DOCN880311AK3	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO			SAT	

57658303-3EFD-4D05-9636-37DDAB0CD0BF

2018-07-26T10:10:39

2018-07-26T10:18:39

FCG840618N51

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

\$409,917.97

Ingreso

Vigente

Imprimir



Enlaces

Declaración de Accesibilidad
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
Política de privacidad
(<https://www.gob.mx/privacidad>)
Términos y Condiciones
(<https://www.gob.mx/terminos>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
Denuncia contra servidores públicos
(<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion>)


- [Marco Jurídico](#)
<http://www.ordenjuridico.gob.mx>
- [Portal de Obligaciones de](#)
[Transparencia](#)
<http://portaltransparencia.gob.mx>
- [Sistema Infomex](#)
<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>
- [INAI](#)
<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>
- [Mapa de sitio](#)
<https://www.gob.mx/sitemap>

Mantente informado.
Suscríbete.

usuario@ejemplo.com

>

Síguenos en



RFC: DOCV880311AK3


RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.		PARTIDAS		IMPORTES	
		ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO)		\$ 353,377.56	

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: D0CN80311AK3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)
PERÍODO: 26 FEBRERO AL 09 MARZO DE 2018
OBRA : REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA : NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
FECHA: 10 DE MARZO DE 2018

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA											
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES			IMPORTES			PRECIO UNITARIO	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO	ESTA ESTIMACION			
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DOBLE DE 100 W AMBAS LED POSTERIZO 2 LUCES, BRAZO METALICO Y ANCLA DE 3/4" X 1.00 MTS. PREFABRICADA SECCION 40X40X100 CMS. INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, RELLENO, CARGA Y COLOCACION HASTA EL LUGAR DE SU EJECCION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECCION.	pza	9.0000	0.0000	9.0000	9.0000	0.0000	\$256,397.40	\$28,488.60	\$256,397.40	\$0.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE 2" PARA DUCTO DE INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO, INCLUYE: EXCAVACION MANUAL, COLOCACION DE DUCTO, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	264.0000	0.0000	264.0000	264.0000	0.0000	\$11,880.00	\$45.00	\$11,880.00	\$0.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECCION 40X40X40 CMS INCLUYE: CAMA DE GRAVA DE 1/2" DE 10 CMS. DE ESP., NIVELACION, MATE. ERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	9.0000	0.0000	9.0000	9.0000	0.0000	\$5,400.00	\$500.00	\$5,400.00	\$0.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO DE CONCRETO PREFABRICADO SECCION 0.40x0.40x0.80 MTS. PARA ANCLADO DE LUMINARIA, INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECCION.	pza	9.0000	0.0000	9.0000	9.0000	0.0000	\$4,032.00	\$448.00	\$4,032.00	\$0.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2x1 XLP SUBTERRANEO CALIBRE 6 INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, GUIA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECCION.	m	284.0000	0.0000	284.0000	284.0000	0.0000	\$8,168.16	\$30.84	\$8,168.16	\$0.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA TIPO GRAFA DE CONCRETO PREFABRICADO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION.	pza	9.0000	0.0000	9.0000	9.0000	0.0000	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES DE BASURA DE LAMINA DE ACERO AL CARBON SEGUN DISEÑO INCLUYE: CARGA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECCION.	pza	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	\$21,000.00	\$3,500.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8	ELABORACION DE ESTAMPADO DE LOSA LOGO DE JHS AL ACIDO, INCLUYE: APLICACION DE ACIDO, LAVADO, BARNIZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECCION, SECCION DEL ESTAMPADO 5.00 x 6.00 MTS.	pza	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
9	ELABORACION DE ESTAMPADO DE LOSA LOGO DE CRUZ AL ACIDO, INCLUYE: APLICACION DE ACIDO, LAVADO, BARNIZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECCION, SECCION DEL ESTAMPADO 3.00 x 3.00 MTS.	pza	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	\$60,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00
10	ELABORACION DE ESTAMPADO DE LOSA LOGO DEL H. AYUNTAMIENTO AL ACIDO, INCLUYE: APLICACION DE ACIDO, LAVADO, BARNIZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECCION, SECCION DEL ESTAMPADO 6.00 x 6.00 MTS.	pza	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
			SUMA					\$ 474,377.56	\$ 353,377.56	\$ 474,377.56	\$ 121,000.00
			IVA					\$ 75,900.41	\$ 56,540.41	\$ 75,900.41	\$ 19,360.00
			TOTAL					\$ 550,277.97	\$ 409,917.97	\$ 550,277.97	\$ 140,360.00

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: DOCN880311AK3



EMPRESA:	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO		FECHA:	19 DE ENERO DE 2018		
OBRA:	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)			
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	08 AL 18 DE ENERO DE 2018			
NUMEROS GENERADORES						
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DOBLE DE 100 W AMBAS LED POSTE RIZO 2 LUCES, BRAZO METALICO Y ANCLA DE 3/4" X 1.00 MTS. PREFABRICADA SECCION 40X40X100 CMS. , INLCUYE: EXCAVACION, NIVELACION, RELLENO, CARGA Y COLOCACION HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.		CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES			
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	ACERA SUR	1.0000	1.0000	1.0000	9.0000	9.00
					SUMA	9.00



NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
EL REPRESENTANTE LEGAL



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

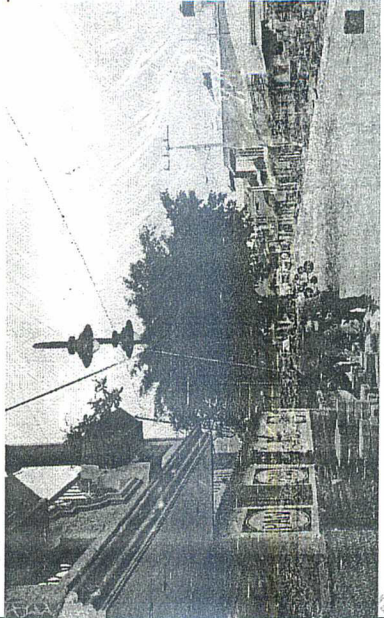

71

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO

RFC: DOCN880311AK3


EMPRESA:	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO		FECHA:	19 DE ENERO DE 2018		
OBRA:	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN	No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)		
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	08 AL 18 DE ENERO DE 2018			
NUMEROS GENERADORES						
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE 2" PARA DUCTO DE INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO, INCLUYE: EXCAVACION MANUAL, COLOCACION DE DUCTO, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	RED PRINCIPAL	240.0000	1.0000	1.00	1.00	240.00
	CONEXIÓN A RED EXISTENTE	24.0000	1.0000	1.00	1.00	24.00
					SUMA	264.00
CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES 						
 NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO EL REPRESENTANTE LEGAL  ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO						

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: DOCN880311AK3

EMPRESA:	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO				FECHA:	19 DE ENERO DE 2018
OBRA:	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN No.		1 (UNICA Y FINIQUITO)	
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO		PERIODO:		08 AL 18 DE ENERO DE 2018	
NUMEROS GENERADORES						
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECCION 40X40x40 CMS.INCLUYE: CAMA DE GRAVA DE 1/2" DE 10 CMS. DE ESP., NIVELACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.					CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	ACERA SUR	1 0000	1.0000	1.0000	9.0000	9.00
					SUMA	9.00


NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
EL REPRESENTANTE LEGAL


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

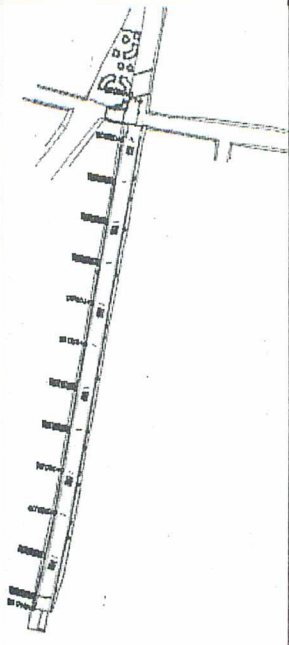



NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: DOCN880311AK3

EMPRESA:	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO				FECHA:	19 DE ENERO DE 2018
OBRA:	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)			
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO		PERIODO: 08 AL 18 DE ENERO DE 2018			
NUMEROS GENERADORES						
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO DE CONCRETO PREFABRICADO SECCION 0.40x0.40x0.80 MTS. PARA ANCLADO DE LUMINARIA, INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.					CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
pza	ACERA SUR	1.0000	1.0000	1.0000	9.0000	9.00
					SUMA	9.00


NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
EL REPRESENTANTE LEGAL



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

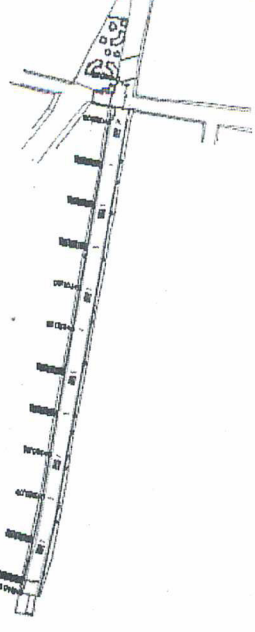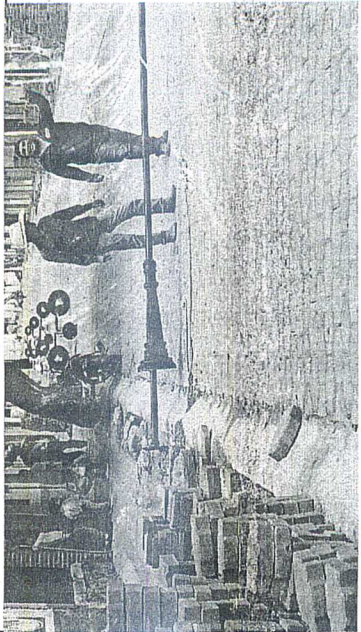

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: DOCN880311AK3



EMPRESA:	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO		FECHA:	19 DE ENERO DE 2018		
OBRA:	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.		1 (UNICA Y FINIQUITO)		
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	08 AL 18 DE ENERO DE 2018			
NUMEROS GENERADORES						
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2+1 XLP SUBTERRANEO CALIBRE 6, INCLUYE. RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, GUIA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
m	RED PRINCIAL	240.0000	1.0000	1.00	1.00	240.00
	CONEXIÓN A RED EXISTENTE	24.0000	1.0000	1.00	1.00	24.00
					SUMA	264.00
CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES						
						


NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
EL REPRESENTANTE LEGAL



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: DOCN880311AK3

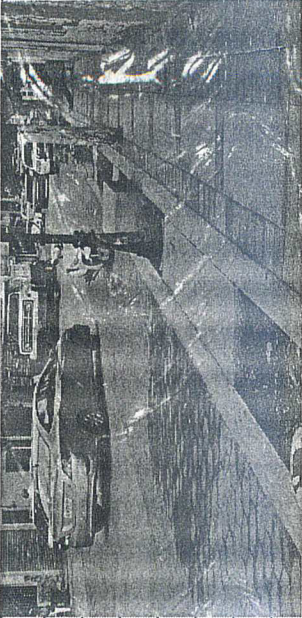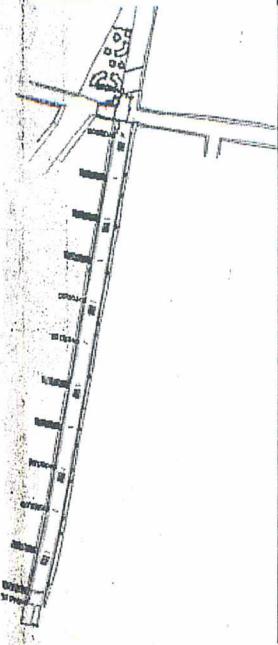EMPRESA:	NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO		FECHA:	19 DE ENERO DE 2018			
OBRA:	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO						
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.		1 (UNICA Y FINIQUITO)			
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:		08 AL 18 DE ENERO DE 2018			
NUMEROS GENERADORES							
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA TIPO GRAPA DE CONCRETO PREFABRICADO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION.						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	 
pza	ACERAS NORTE Y SUR	1.0000	1.0000	1.0000	9.0000	9.00	
					SUMA	9.00	


NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
EL REPRESENTANTE LEGAL


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5 COL. LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: DOCN880311AK3

Jocotepec, Jalisco 27 de febrero de 2018

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
PRESENTE

Por el presente me permito informar que mañana 09 de Marzo de 2018, se terminaran los trabajos de "REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO." contratados con el Municipio de Jocotepec, Jalisco. CTO GMJ 018C OP/2018 CUENTA CORRIENTE/2018, por lo que pido se autorice la entrega-recepción de la obra con la estimación 1 (UNICA) finiquito.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE.


NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO



JOSE GARCIA #5 COL. LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
C.P. 45690 TEL: 36970593
