

DRABSA CONSTRUCTORA

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
Efecto Fiscal: I Ingreso
Folio Fiscal: 1455316C-D5EA-4618-8144-11419E7FFDAA
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado del emisor: 00001000000405365378
Fecha y hora de certificación: 2018-09-18T15:50:04
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Expedición: 44639

Emisor
DCO161011AP3 DRABSA CONSTRUCTORA SA DE CV

MONTEVIDEO, 3268,
COL. PROVIDENCIA 4A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
MONTEVIDEO, 3268,
COL. PROVIDENCIA 4A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Folio/Serie: 008058E
Fecha y hora de emisión: 2018-09-18T15:38:55
Método de pago: PPD: Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
Condiciones de pago:
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Versión de CFDI: 3.3



Receptor

MJJ85-0101KP8 Municipio de Jucotepec Jalisco
Palacio Municipal, 5/N,
COL. CENTRO, C.P. 45800
JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
72101500	E48	SERVICIO		1.00	GMJ 024C OP/2018 ESTIMACION 5 DRENAJE PLUVIAL ALUMBRADO PUBLICO OBRA: REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. Menos 5 al millar RIV (SEFUPU) \$ 665.20 neto a pagar \$ 115,078.77	\$0.00	\$99,779.28	\$99,779.28

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	99779.28	TASA	0.160000	15964.68

Importe con letra: *** CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. ***

Subtotal: \$99,779.28

Descuentos: \$0.00

Impuestos trasladados: \$15,964.68

Impuestos retenidos: \$0.00

TOTAL: \$115,743.96

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1455316C-D5EA-4618-8144-11419E7FFDAA|2018-09-18T15:50:04|SFE0807172W8|PNS9r/dgbUYsuVOZBz0TVrBk0t8AF6hy6MEoEVOJ55efa0E7t+XyvwKyMn6sXHZmkQvDk5g2Cb6t3MFbIRHsrxTnZYHIMShP0rrCBgAibcldFErTCSTLRdwfcTuxzTGoTunNCyMU/hyTcA1ANN7FYkLgTauxfJ+ovlOasKs3W1tvXQgNH2uAEg/TEkplsgDyQpwc6OmTU4sf7Ox7Fq5NgAactFvD56rov0NFP53evbS2qb5+3m3u9X2p5KJJ8XrQ0cPcrdL32Ez65vW5MhLfAdjaRoqEef9Baxa+rveJ4dYdfPjclbA0SL/6bODGjNmebpmT1b1mk+EwphjQ==|j00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

PNS9r/dgbUYsuVOZBz0TVrBk0t8AF6hy6MEoEVOJ55efa0E7t+XyvwKyMn6sXHZmkQvDk5g2Cb6t3MFbIRHsrxTnZYHIMShP0rrCBgAibcldFErTCSTLRdwfcTuxzTGoTunNCyMU/hyTcA1ANN7FYkLgTauxfJ+ovlOasKs3W1tvXQgNH2uAEg/TEkplsgDyQpwc6OmTU4sf7Ox7Fq5NgAactFvD56rov0NFP53evbS2qb5+3m3u9X2p5KJJ8XrQ0cPcrdL32Ez65vW5MhLfAdjaRoqEef9Baxa+rveJ4dYdfPjclbA0SL/6bODGjNmebpmT1b1mk+EwphjQ==

Sello Digital del SAT

PsSNOINVMHuxVpwQDL2Lc5P75m/WjvZHzA6iFkzbt3cJTfncGU2Rk8bXwi49pQy5H83NUE1ZFxnVgD6ebtt4RlpxCxsV43BH3GPOR0ocfQv43f511nWO5iWu/YnzPjhqNYeKHlt7Wci3VrVnnQoT8dpUxyFvRTA7U5YXQZERYX3ucREvE9rvWzjNRYA6Jf6NIQYroiWlorHyUlu5JrQNmJfB3Z4ui79Rw4TMcwfEedliCRC+3vEEF8MSdU5Mbb16ILL4nmNILzr6vBPggHWnt1SpYwZM0bIVUudeDFD3RprT83KlaW5gCvnMy34XpWfaZYKeFngMmMQ==



🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio

SHCP



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor	Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
DCO161011AP3	DRABSA CONSTRUCTORA SA DE CV	MJJ850101KP8	Municipio de Jucotepec Jalisco				

1455316C-D5EA-4618- 2018-09- 2018-09- SFE0807172W8
B144-11419E7FFDAA 18T15:38:55 18T15:50:04

Total del CFDI**Efecto del
comprobante****Estado CFDI**

\$115,743.96

Ingreso

Vigente

Imprimir

**Enlaces**

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(<https://www.gob.mx/privacidad>)
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(<https://www.gob.mx/terminos>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites,
información y participación
ciudadana. Leer más
([https://www.gob.mx/que-es-](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[gobmx](https://www.gob.mx/que-es-gobmx))

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e
información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores
públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-publicos)
([https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-publicos)

Marco Jurídico

(<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)

Portal de Obligaciones de

Transparencia

(<http://portaltransparencia.gob.mx>)

Sistema Infomex

(<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>)

INAI

(<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ffai.aspx>)

Mapa de sitio

(<https://www.gob.mx/sitemap>)

English

(<https://www.gob.mx/en/index>)

Temas

(<https://www.gob.mx/temas>)

Reformas (<http://reformas.gob.mx>)

de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado.
Suscríbete.

Síguenos en


usuario@ejemplo.com





WWW.DRABSA.CONSTRUCTORA.COM

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			No. DE CONTRATO: GMJ 024C OPI/2018		HOJA DE RELACION HOJA No. 1 DE 1	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			CONTRATISTA: DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINIQUITO	
			OBRA: REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO.		PERÍODO DE TRABAJO:	
			UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL			
			DEL: 16 AL 25 SEPTBRE DE 2018			
			FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION						
HOJA No.	P A R T I D A S		I M P O R T E S			
	DRENAJE PLUVIAL ALUMBRADO PUBLICO				\$ 103,039.01 \$ 30,000.00	
					\$ 133,039.01 \$ 33,259.73 \$ 99,779.28 \$ 15,964.68	
					\$ 115,743.96 \$ 665.20 \$ 115,078.77	
ESTADO CONTABLE			IMPORTE	I . V . A .	TOTAL	
ASIGNACIÓN			\$ 2,534,482.75	\$ 405,517.24	\$ 2,940,000.00	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN			\$ 133,039.01	\$ 21,286.24	\$ 154,325.25	
ACUMULADO ANTERIOR			\$ 2,401,443.85	\$ 384,231.02	\$ 2,785,674.87	
ACUMULADO A LA FECHA			\$ 2,534,482.86	\$ 405,517.26	\$ 2,940,000.12	
SALDO POR EJERCER			- \$ 0.10 - \$	0.02 - \$	0.12	
A MORTIZACIÓN DEL ANTICIPO						
ANTICIPO %			\$ 633,620.69	\$ 101,379.31	\$ 735,000.00	
AMORTIZACIÓN			\$ 33,259.73	\$ 5,321.56	\$ 38,581.29	
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.			\$ 600,360.96	\$ 96,057.75	\$ 696,418.71	
AMORTIZACIÓN A LA FECHA			\$ 633,620.69	\$ 101,379.31	\$ 735,000.00	
FALTANTE POR AMORTIZAR			- \$ 0.00 - \$	0.00 - \$	0.00	
C JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA						
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO						
ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS						
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO						



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINIQUITO

PERÍODO: 15 AL 25 SEPTBRE DE 2018

REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA											
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADA ACTUAL
PAVIMENTOS (SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS)											
PAV-01	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHABILITACION.	M3	371.0547	359.2729	0.0000	\$222.18	\$82,440.93	\$79,823.25	\$0.00	\$79,823.25	\$2,617.68
PAV-02	EXCAVACION EN CALON DE 0.00 CMS A 0.80 CMS PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN ANCHOR VARIABLE, INCLUYE ACARREO DEL TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES	M3	722.8454	718.5458	0.0000	\$171.24	\$123,797.16	\$123,043.78	\$0.00	\$123,043.73	\$753.38
PAV-03	CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 92% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y SUPERVISCION	M2	2,748.3671	1,796.3645	0.0000	\$10.71	\$29,435.01	\$19,239.06	\$0.00	\$19,239.06	\$10,195.95
PAV-04			1,807.3634	1,796.3645	0.0000	\$21.80	\$39,400.52	\$39,160.75	\$0.00	\$39,160.75	\$239.72
PAV-05	FORMACION DE SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISCION	M3	361.4727	449.0911	0.0000	\$471.00	\$170,253.63	\$211,521.91	\$0.00	\$211,521.91	-\$41,268.28
PAV-06	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL ES: PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 100% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISCION	M3	361.4727	449.0911	0.0000	\$591.62	\$213,854.47	\$265,691.28	\$0.00	\$265,691.26	-\$51,836.81
PAV-07	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO DE 20CM MR-42 TERMINADO RAYADO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	47.9100	0.0000	0.0000	\$600.00	\$28,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,746.00
PAV-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN ROMANO DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO VEHICULAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO INCLUYE.	M2	1,807.3634	1,592.7957	0.0000	\$336.42	\$608,033.19	\$535,848.65	\$0.00	\$535,848.65	\$72,184.54
PAV-09	FABRICACION DE MACHUELO TIPO "L" 40X50CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 TERMINADO PULIDO APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M1	470.4200	472.2000	0.0000	\$288.00	\$135,480.96	\$135,993.60	\$0.00	\$135,993.60	-\$512.64
PAV-10	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 TERMINADO ESTAMPADO SEGUN DISEÑO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	650.4027	460.3424	0.0000	\$294.00	\$191,218.39	\$135,340.67	\$0.00	\$135,340.67	\$55,877.73
PAV-11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	2,748.3671	0.0000	0.0000	\$6.37	\$17,507.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,507.10

Handwritten signature: *Handwritten signature*

AGUA POTABLE

AP-12	EXCAVACION DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA EN MATERIAL TIPO II HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00M; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	65.5200	134.9400	0.0000	134.9400	-69.4200	\$34.72	\$2,274.85	\$4,685.12	\$0.00	\$4,685.12	-\$2,410.26
AP-13	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	163.8000	179.9200	0.0000	179.9200	-16.1200	\$11.32	\$1,854.22	\$2,036.69	\$0.00	\$2,036.69	-\$182.48
AP-14	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	163.8000	179.9200	0.0000	179.9200	-16.1200	\$50.30	\$8,239.14	\$9,049.98	\$0.00	\$9,049.98	-\$810.84
AP-15	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR MINIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y	M3	32.7600	35.9840	0.0000	35.9840	-3.2240	\$520.00	\$17,035.20	\$18,711.68	\$0.00	\$18,711.68	-\$1,676.48
AP-16	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL	M3	16.3800	80.9640	0.0000	80.9640	-64.5840	\$502.26	\$8,227.02	\$40,654.98	\$0.00	\$40,654.98	-\$32,437.96
AP-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	234.0000	224.9000	0.0000	224.9000	9.1000	\$137.31	\$32,130.54	\$30,881.02	\$0.00	\$30,881.02	\$1,249.52
AP-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	58.0000	55.0000	0.0000	55.0000	3.0000	\$1,567.80	\$90,932.40	\$86,229.00	\$0.00	\$86,229.00	\$4,703.40


DRENAJE SANITARIO

DS-19	EXCAVACION DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA EN MATERIAL TIPO II HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00M; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	196.8000	248.5360	0.0000	248.5360	-51.7360	\$34.72	\$6,832.90	\$8,629.17	\$0.00	\$8,629.17	-\$1,796.27
DS-20	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	196.8000	179.9200	0.0000	179.9200	-16.8800	\$11.32	\$2,227.78	\$2,036.69	\$0.00	\$2,036.69	\$191.08
DS-21	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	196.8000	179.9200	0.0000	179.9200	-16.8800	\$50.30	\$9,899.04	\$9,049.98	\$0.00	\$9,049.98	2849.06
DS-22	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL	M3	103.6782	58.8015	0.0000	58.8015	44.8767	\$520.00	\$53,912.65	\$30,576.76	\$0.00	\$30,576.76	\$22,335.89
DS-23	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL	M3	39.3600	140.5840	0.0000	140.5840	-101.2240	\$502.26	\$19,768.95	\$70,609.72	\$0.00	\$70,609.72	-\$50,840.77
DS-24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	246.0000	224.9000	0.0000	224.9000	21.1000	\$248.60	\$61,155.60	\$55,910.14	\$0.00	\$55,910.14	\$5,245.46
DS-25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	58.0000	55.0000	0.0000	55.0000	3.0000	\$1,563.22	\$91,826.76	\$87,077.10	\$0.00	\$87,077.10	\$4,749.66
DS-26	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA 14-300 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.0000	6.0000	0.0000	6.0000	-2.0000	\$7,800.00	\$31,200.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	-\$15,600.00
DS-27	CONSTRUCCION DE REGISTRO DOMESTICO DE 40 CM DE DIAMETRO INTERIOR, FORJADO CON TABIQUE 5.5X11X22CM APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 TERMINADO PULIDO INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	58.0000	49.0000	0.0000	49.0000	9.0000	\$1,290.00	\$74,820.00	\$63,210.00	\$0.00	\$63,210.00	\$11,610.00

DRENAJE PLUVIAL													
DP-28	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE UTILIZANDO CORTADORA CON MOTOR A GASOLINA Y DISCO DE 18" INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	106.8200	228.1000	0.0000	228.1000	-121.2900	\$48.00	\$5,127.36	\$10,548.80	\$0.00	\$10,548.80	-\$5,821.44
DP-29	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1" KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION.	M3	10.6820	13.7370	0.0000	13.7370	-3.0550	\$222.18	\$2,373.33	\$3,052.09	\$0.00	\$3,052.09	-\$578.76
DP-30	EXCAVACION DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA EN MATERIAL TIPO II HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00M; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1" KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	202.3712	251.1060	0.0000	251.1060	-48.7348	\$34.72	\$7,026.33	\$8,718.40	\$0.00	\$8,718.40	-\$1,692.07
DP-31	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	231.6000	277.5000	0.0000	277.5000	-45.9000	\$11.32	\$2,621.71	\$3,141.30	\$0.00	\$3,141.30	-\$519.59
DP-32	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	231.6000	271.0000	0.0000	271.0000	-39.4000	\$50.30	\$11,649.48	\$13,631.30	\$0.00	\$13,631.30	-\$1,981.82
DP-33	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 70 CM EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	122.0115	86.8169	4.5380	91.7569	30.2546	\$520.00	\$63,445.99	\$45,145.84	\$2,567.76	\$47,713.60	\$15,732.38
DP-34	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	17.0912	137.6080	0.0000	137.6080	-120.5168	\$502.26	\$8,584.23	\$69,114.99	\$0.00	\$69,114.99	-\$60,530.77
DP-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC S-25 DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	289.5000	273.8078	0.0000	273.8078	15.6922	\$388.90	\$115,481.55	\$109,221.94	\$0.00	\$109,221.94	\$6,259.61
DP-36	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO M42 (CON ADITIVOS PARA ABRIR AL TRAFICO EN 72 HORAS) DE 20CM DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	\$3,4100	36.8078	13.4400	50.3478	3.0822	\$722.02	\$38,563.09	\$26,648.18	\$9,703.95	\$36,352.13	\$2,210.96
DP-37	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INCL. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	\$5,052.11	\$10,104.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,104.22
DP-38	FABRICACION DE BOCCA DE TORMENTA DE 500X700X90CMS CON: REJILLA SUPERIOR METALICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	1.0000	0.0000	2.0000	2.0000	-1.0000	\$42,001.06	\$42,001.06	\$0.00	\$54,002.12	\$54,002.12	-\$42,301.05
DP-39	FABRICACION DE BOCCA DE TORMENTA DE 200X700X90CMS CON REJILLA SUPERIOR METALICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



ALUMBRADO PUBLICO												
AL-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO LED MOD AD-LED-60W MCA ADVAN-DIX O SIMILAR EN POSTE EXISTENTE	PIEZA	7.0000	0.0000	6.0000	6.0000	1.0000	\$4,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$27,000.00	\$4,500.00
AL-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE 1.80X1 DE 1/2" GALVANIZADO, EN POSTE EXISTENTE	PIEZA	7.0000	0.0000	6.0000	6.0000	1.0000	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO												
DP-42EX	FABRICACION DE BOCA DE TORMENTA DE 90X70X65CMS CON REJILLA SUPERIOR METALICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$3,382.59	\$0.00	\$0.00	\$6,765.18	\$0.00
								SUMA	\$ 2,534,482.76	\$ 2,401,443.82	\$ 133,039.01	\$ 2,534,482.82
								IVA	\$ 405,517.24	\$ 384,231.01	\$ 21,286.24	\$ 405,517.25
								TOTAL	\$ 2,940,000.00	\$ 2,785,674.83	\$ 154,325.25	\$ 2,940,000.08
												\$ 7,847.52



C JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA REPRESENTANTE LEGAL	ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
--	---	--



C. JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DRABSA CONSTRUCTORA

MONTEVIDEO, 3268
COL. PROVIDENCIA 4A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JAL.


WWW.DRABSACONSTRUCTORA.COM

EMPRESA:	DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA:	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16 AL 25 SEPTBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES						
DP-33	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 70 CM EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISCION					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+298.6 AL KM 0+299.0	4.2000	0.4000	0.4500	1.0000	0.76
	KM 0+298.8 AL KM 0+328.2	29.4000	0.4000	0.4500	1.0000	5.29
	VOL DESALOJADO POR TUBO DE 8" = .033*33.6=1.1088M3					-1.11
						SUMA 4.94

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

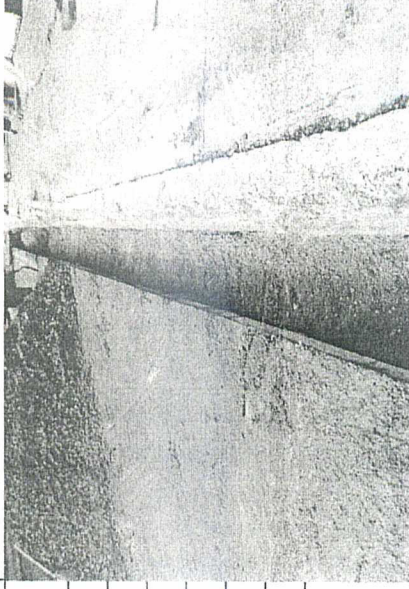



C JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA
EL REPRESENTANTE LEGAL



ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DRABSA CONSTRUCTORA

MONTEVIDEO, 3288
COL. PROVIDENCIA 4A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JAL.

WWW.DRABSAACONSTRUCTORA.COM

EMPRESA:
OBRA:

DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 16 AL 25 SEPTBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINQUITO

NUMEROS GENERADORES

DP-33

ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 70 CM EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90%
PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X=663,850

No. 190

Y=2,243,600

No. 184

Y=2,243,625

No. 174

No. 174 C
No. 174 B
No. 174 A

S/No.

No. 170
MICHELADAS GABY

Y=2,243,650

X=663,850

R1

B2

4.70 - 5.00 - 20.32

52.00 - 5.00 - 20.32

R2

C. HIDALGO SUR

X=663,875

No. 187C

No. 187

No. 179

No. 177

No. 169

No. 167

X=663,875

UNIDAD ADMINISTRATIVA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DRABSA CONSTRUCTORA

MONTEVIDEO, 3268
COL. PROVIDENCIA 4A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JAL.

WWW.DRABSACONSTRUCTORA.COM

EMPRESA:

DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No.

5 (CINCO) FINQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO:

16 AL 25 SEPTBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

DP-36

SUMINISTRO Y FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO MR 42 (CON ADITIVOS PARA ABRIR AL TRAFICO EN 72 HORAS) DE 20CM DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES:

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	KM 0+298.6 AL KM 0+299.0	4.2000	0.4000	1.0000	1.0000	1.68
	KM 0+298.8 AL KM 0+328.2	29.4000	0.4000	1.0000	1.0000	11.76
	SUMA				SUMA	13.44



C JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA
EL REPRESENTANTE LEGAL

ING. RIGOBERTO PLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

X=663,850

No. 190

Y=2,243,600

No. 184

Y=2,243,625

No. 174

No. 174 C
No. 174 B
No. 174 A

S/No.

No. 170
MICHELADAS GABY

Y=2,243,650

X=663,850

R1

B2

4.70 - 5.00 - 20.32

52.00 - 5.00 - 20.32

C. HIDALGO SUR

R2

X=663,875

UNIDAD ADMINISTRATIVA

No. 187C

No. 187

No. 179

No. 177

No. 169

No. 167

X=663,875



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DRABSA CONSTRUCTORA

MONTENDEO, 3268
COL. PROVIDENCIA 14A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JAL.

WWW.DRABSACONSTRUCTORA.COM

EMPRESA:

DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018


OBRA:

REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO.


LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16 AL 25 SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

DP-38	FABRICACION DE BOCA DE TORMENTA DE 500X70X90CMS CON REJILLA SUPERIOR METALICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION				CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES	
-------	--	--	--	--	-------------------------------------	--

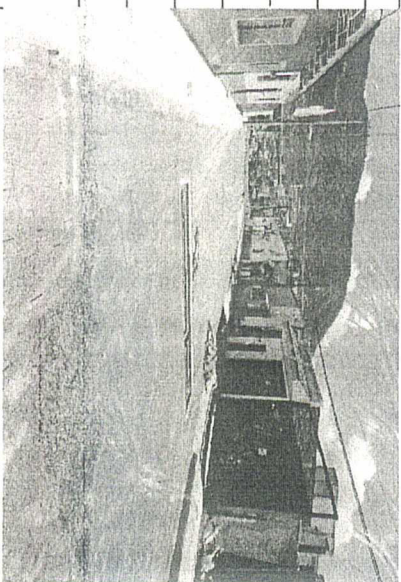UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
PIEZA	KM 0+298.95	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.00	
	KM 0+329.25	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.00	
					SUMA	2.00	


C. JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA
EL REPRESENTANTE LEGAL


ING. ROBERTO OLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DRABSA CONSTRUCTORA

MONTVIDEO, 3268
COL. PROVIDENCIA 4A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JAL.

WWW.DRABSACONSTRUCTORA.COM

EMPRESA:

DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA:

REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No.

5 (CINCO) FINQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO:

16 AL 25 SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AL-40

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO LED MOD AD-LED-60W MCA ADVAN-DIX
O SIMILAR EN POSTE EXISTENTE

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL KM 0+236.9	1.0000	1.0000	1.0000	6.0000	6.00
PIEZA						
					SUMA	6.00

C JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA
EL REPRESENTANTE LEGAL

ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DRABSA CONSTRUCTORA

MONTVIDEO, 3268
COL. PROVIDENCIA 4A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JAL.

WWW.DRABSACONSTRUCTORA.COM

EMPRESA:

DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA:

REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO:

16 AL 25 SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AL-41

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE 1.80X1 DE 1/2" GALVANIZADO, EN POSTE EXISTENTE

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL KM 0+236.9	1.0000	1.0000	1.0000	6.0000	6.00
PIEZA						
					SUMA	6.00

C JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA
EL REPRESENTANTE LEGAL

ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DRABSA CONSTRUCTORA

MONTENVIDEO, 3268
COL. PROVIDENCIA 4A SECCION, C.P. 44639
GUADALAJARA, JAL.

WWW.DRABSACONSTRUCTORA.COM

EMPRESA:

DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA:

REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

CABECERA MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 16 AL 25 SEPTIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES

DP-42EX FABRICACION DE BOCA DE TORMENTA DE 90X70X65CMS CON REJILLA SUPERIOR METALICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
PIEZA	KM 0+298.95	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.00
	KM 0+329.25	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.00
					SUMA	2.00

C JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA
EL REPRESENTANTE LEGAL

ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
PRESENTE

POR ESTE MEDIO DE LA MANERA MAS ATENTA LE SOLICITO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES CONCEPTO DP-38 "FABRICACION DEBOCA DE TORMENTA DE 500X70X90CMS CON REJILLA SUPERIOR METALICA" Y VOLUMENES EXTRAORDINARIOS "FABRICACION DEBOCA DE TORMENTA DE 90X70X65CMS CON REJILLA SUPERIOR METALICA" CON RELACION A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO" Y QUE SE ESTAN EJECUTANDO AL AMPARO DEL CONTRATO **GMJ 024C OP/2018** YA QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA SE HA VISTO LA NECESIDAD DE EJECUTAR ALGUNOS CAMBIOS, CABE ACLARAR QUE SE VA A CONSERVAR EL MONTO CONTRATADO SIN QUE SUFRA ALTERACION ALGUNA:

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO VERME FAVORECIDO EN MI PETICION, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

JOCOTEPEC, JALISCO A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018


ATENTAMENTE.



C. JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA

DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.





Jocotepec

Gobierno Municipal
2015-2018

DOP 878/2018

C. JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA

DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESENTE

POR ESTE MEDIO LO SALUDO Y LE INFORMO QUE CON RESPECTO A SU OFICIO S/N DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DONDE SOLICITA AUTORIZACION PARA VOLUMENES EXCEDENTES Y EXTRAORDINARIOS PARA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO"** Y QUE SE ESTAN EJECUTANDO AL AMPARO DEL CONTRATO **GMJ 024C OP/2018**, LOS MISMO LE SON ACEPTADOS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DE PUERTO VALLARTA XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

JOCOTEPEC, JALISCO A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
