



CFDI Factura Electrónica (CFDI)

Folio:

No. de serie de certificado del CSD:

G 24

00001000000501459998



Información del cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO Fecha: 10-02-2021 16:23:31
 RFC: MJJ850101KP8 Uso CFDI: 101-Construcciones
 Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO JOCOTEPEC 45800 JOCOTEPEC JALISCO MEX



Información del emisor:

Razón social: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS S.A. DE C.V. Lugar de expedición: 45650
 RFC: SSI1305144G7 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Dirección: AMARANTO 302 1A (LOS ABEDULES) LOMAS DE SAN AGUSTIN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 45650 JALISCO MÉXICO



Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones:
 Forma: 03-Transferencia electrónica de fondos Tipo de cambio

Código	Clave producto o servicio	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
JOCO03	72121101	1	No Aplica	ZZ-Mutuamente definido	Pago de Estimación No. 3 (TRES) FINIQUITO, relativo a la obra; "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)". MENOS EL 2% \$34,588.26 PARA PANDEMIA Y MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$717.19 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; \$ 131,081.71	\$143,437.20	\$0.00	\$143,437.20

Observaciones:

Cantidad con letra: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal: 7600b7d0-9fb7-4744-9ced-b138c101d8c8
 Número de serie del certificado SAT: 00001000000408254801
 Fecha de certificación: 11-02-2021 16:28:56

Subtotal:	\$143,437.20
002-IVA Traslado 0.160000 %:	\$22,949.95
Total:	\$166,387.15

Sello CFDI:

Zyp73vOluMkr7zJK2hs5Wu+y09hLKHlaoHsdLlzPACkPAeyrWtNWmUl8cmypX
 693me1LNhr7b27TgDqovmUk4JUZvYMDGvPQn7LbFp+pv823e3hMvbjm7W6L
 GbzAPdTVt6s+12e+WAfNa30PK923kSTYKChgIgtAKTYFwFLmCv02P1Ijg
 xmFLWwLwYUjPa3y51Fa3mq2ID9Qlp97K3s+1QHZlV7Eccz2DByJSpck2a
 500LMPDZDELpIhYD7EwU01c5v9nkvF59kVv6HmDE8de9y2dIBAY0rVBA1
 WwKYA4JjHkw==

Sello SAT:

HBNAMJqQMcGpYVmg0Rjmt6m6dvBpiroukQMhc7U+MSL4DHSEEMIDDR
 C1rfDmF45GUEQCO+88D9D90lqWYdlowhK8w7r7t8G30VWVp8s7Yppyo
 brVTkZQ82m3Cvccp9qE9vd6Z:SBÉyGZ+1rmZN(E8y)T300u+HhMzgEqvHBUcA
 MuNT85ipYREmHnEJ4k+ccMkywL3C8v+725BzCEgcz2UjQPCnN7XbVg92k
 bEewhNkGQ3s+1Ug9kRmHJkG4+srzclGwely1BETGhmq1CNkSskw477
 e8X3d0+6NA/dR0h8A==

Cadena original SAT:

[1:17600b7d0-9fb7-4744-9ced-b138c101d8c8|2021-02-11T16:28:56|SO1306189R5|
 Zyp73vOluMkr7zJK2hs5Wu+y09hLKHlaoHsdLlzPACkPAeyrWtNWmUl8cmypX
 693me1LNhr7b27TgDqovmUk4JUZvYMDGvPQn7LbFp+pv823e3hMvbjm7W6L
 GbzAPdTVt6s+12e+WAfNa30PK923kSTYKChgIgtAKTYFwFLmCv02P1Ijg
 xmFLWwLwYUjPa3y51Fa3mq2ID9Qlp97K3s+1QHZlV7Eccz2DByJSpck2a
 500LMPDZDELpIhYD7EwU01c5v9nkvF59kVv6HmDE8de9y2dIBAY0rVBA1
 WwKYA4JjHkw==|00001000000408254801]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Y/h9J5gJbALBVDw62O2Uv8Dwx/RSx9Y4EYG0+fY1HbqU+qjLp8KYFsAc68gIPY3XgCAjodFX1HwH6KMDJ6hGymiH/GG9HV7h4wS4NJAQ0uG-
Certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDE0NTk5OTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRP
NoCertificado="00001000000501459998" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
LugarExpedicion="45650" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1161536.91" Moneda="MXN" SubTotal="1001324.92" FormaPago="03"
Fecha="2020-12-23T20:07:15" Folio="22" Serie="G" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS S.A. DE C.V." Rfc="SSI1305144G7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" Rfc="MJJ850101KP8" UsoCFDI="I01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1001324.92" ValorUnitario="1001324.92" Descripcion="Pago de Estimacion No. 2 (DOS), relativo a la
obra;"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
(DELEGACION Y QUIOSCO)".. MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) $ 5,006.62 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; $ 1,156,530.28"
ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1" Noidentificacion="JOCO002" ClaveProdServ="72121101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="160211.99" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1001324.92"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="160211.99">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="160211.99" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="pGX/BcT+t74/0s9YnPVdeUu+6ZmnnivZDkg1LibtKa6GLESA Lps+asqxDW0z5tVpv1N2TerBMTRF+6pAQQLPkoiofk/QAVi041G2
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="Y/h9J5gJbALBVDw62O2Uv8Dwx/RSx9Y4EYG0+fY1HbqU+qjLp8KYFsAc68gIPY3XgCAjodFX1HwH6KMDJ6hGymiH/GG9HV
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2020-12-23T20:12:36" UUID="0d5a14a9-e4ca-4b46-9360-e53bf4e10664"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSI1305144G7	SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS S.A. DE C.V.	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7600B7D0-9FB7-4744-9CED-B138C101D8C8	2021-02-10T16:23:31	2021-02-11T16:28:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$166,387.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV

ANDADOR LAS LOMAS 67, LOS LIMONES, C.P.28400 COQUIMATLAN, COLIMA.

R.F.C.SSI 130514 4G7

REGISTRO SIOP 6268

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: FOCOCI-OP-CSS-029/2020	HOJA DE RELACIÓN	HOJA No. 1 DE 1	
	CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) FINIQUITO	
	OBRA: "Construcción y equipamiento de Plaza Principal en Chantepec, municipio de Jocotepec, Jalisco", (Construcción de edificio administrativo)	PERÍODO DE TRABAJO:		
	UBICACIÓN: CHANTEPEC.	DEL:	DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 20	
		FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020	

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTES
	DELEGACION CHANTEPEC	
	PRELIMINARES	\$ -
	CIMENTACIÓN	\$ -
	ALBAÑILERIA	\$ 89,074.27
	ESTRUCTURA	\$ -
	ACABADOS	\$ -
	PISOS Y AZULEJOS	\$ 54,362.93
	HERRERÍA	\$ -
	CARPINTERIA	\$ -
	MUEBLES DE BAÑO	\$ -
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	\$ -
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ -
	LIMPIEZA	\$ -
	MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 143,437.20
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ -
	SUBTOTAL.	\$ 143,437.20
	I. V. A. 16%	\$ 22,949.95
	SUMA	\$ 166,387.16
	MENOS 2% PANDEMIA	\$ 34,588.26
	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 717.19
	NETO A PAGAR	\$ 131,081.71

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL
ASIGNACIÓN	\$ 1,490,873.28	\$ 238,539.72	\$ 1,729,413.00
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 143,437.20	\$ 22,949.95	\$ 166,387.16
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,347,436.08	\$ 215,589.77	\$ 1,563,025.85
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,490,873.28	\$ 238,539.72	\$ 1,729,413.00
SALDO POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			
ANTICIPO %	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ -	\$ -	\$ -
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -

EL CONTRATISTA	
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO	ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

OPERADO
FOCOCI 2020

OBRAS PUBLICAS

SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV

ANDADOR LAS LOMAS 67, LOS LIMONES, C.P.28400 COQUIMATLAN, COLIMA.

R.F.C.SSI 130514 4G7

REGISTRO SIOP 6268

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020

OBRA : "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CHANTEPEC

CONTRATISTA : SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV


FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)												
DELEGACION CHANTEPEC												
PRELIMINARES												
DELEG-001	Trazo y nivelación para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	174.36	0.00	174.36	11.40	\$14.46	\$2,686.09	\$0.00	\$2,521.32	\$164.77
DELEG-002	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	174.36	0.00	174.36	11.40	\$14.80	\$2,749.25	\$0.00	\$2,580.60	\$168.65
Total PRELIMINARES									\$5,435.34	\$0.00		
A02 CIMENTACIÓN												
DELEG-003	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	53.68	0.00	53.68	16.34	\$104.98	\$7,350.70	\$0.00	\$5,635.54	\$1,715.16
DELEG-004	Cimiento de piedra brza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	51.35	0.00	51.35	18.67	\$1,999.53	\$140,007.09	\$0.00	\$102,671.87	\$37,335.22
DELEG-005	Excavación para zapatas, con máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	15.12	6.24	0.00	6.24	8.88	\$104.98	\$1,587.30	\$0.00	\$654.76	\$932.54
DELEG-006	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.08	46.68	0.00	46.68	- 36.60	\$75.43	\$760.33	\$0.00	\$3,521.07	-\$2,760.74
DELEG-007	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.08	46.68	0.00	46.68	- 36.60	\$171.74	\$1,731.14	\$0.00	\$8,016.82	-\$6,285.68
DELEG-008	Zapata aislada de 0.90x0.90x0.20 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.40x0.40 m. de altura, armado con 4 vars.# 4, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: suministro.	pza	7.00	7.00	0.00	7.00	-	\$4,045.60	\$28,319.20	\$0.00	\$28,319.20	\$0.00
Total CIMENTACIÓN									\$179,755.76	\$0.00		
A03 ALBAÑILERIA												
DELEG-009	Anclaje de castillo de 0.40 x 0.40 x 0.60 m; armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado.	pza	36.00	36.00	0.00	36.00	-	\$275.73	\$9,926.28	\$0.00	\$9,926.28	\$0.00
DELEG-010	Cadena de desplante de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	84.31	0.00	84.31	- 5.54	\$240.21	\$18,921.34	\$0.00	\$20,252.11	-\$1,330.76
DELEG-011	Impermeabilización para desplante de muros hasta de 15 cm. de ancho a base de capas de impermefest E alternadas con polietileno 800, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	0.00	0.00	0.00	78.77	\$71.62	\$5,641.51	\$0.00	\$0.00	\$5,641.51
DELEG-012	Cadena de corona de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	84.31	0.00	84.31	- 5.54	\$240.21	\$18,921.34	\$0.00	\$20,252.11	-\$1,330.76
DELEG-013	Muro de 14 cm. de espesor de block de jalcreto 0.11x0.14x0.28 m, asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado aparente, a plomo e hilo, Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	301.67	193.65	72.11	265.75	35.92	\$593.65	\$179,086.40	\$42,806.32	\$114,958.54	\$21,321.53
DELEG-014	Castillos de 15x15 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, man.	m	130.00	97.20	0.00	97.20	32.80	\$275.73	\$35,844.90	\$0.00	\$26,800.96	\$9,043.94

**OPERADO
[FOCOI 2020]**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020

OBRA : "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)

UBICACIÓN : CHANTEPEC

CONTRATISTA : SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
DELEG-015	Aplanado fino en muros de fachada, de 1.5 cm. de espesor, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, renta, montaje y desmontaje de hamaca, mano de obra, equipo y herramienta	m2	603.34	459.93	307.53	767.46	- 164.12	\$150.45	\$90,772.50	\$46,267.95	\$69,196.47	-\$24,691.92
DELEG-016	Boquilla de aplanado acabado repellido, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta	m2	13.35	30.32	0.00	30.32	- 16.97	\$134.90	\$1,800.92	\$0.00	\$4,089.49	-\$2,288.58
DELEG-017	Piso de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta	m2	168.00	161.72	0.00	161.72	6.28	\$371.23	\$62,366.64	\$0.00	\$60,034.68	\$2,331.96
DELEG-018	Losa de entripiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado, armada según proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del No. 3 y 4, en traves intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de no	m2	104.42	174.36	0.00	174.36	- 69.94	\$2,444.86	\$255,292.28	\$0.00	\$426,297.52	-\$171,005.24
DELEG-019	Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, suministro de materiales, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta	m2	95.60	0.00	0.00	0.00	95.60	\$351.93	\$33,644.51	\$0.00	\$0.00	\$33,644.51
DELEG-020	Chaffan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta	m	48.24	0.00	0.00	0.00	48.24	\$116.00	\$5,595.84	\$0.00	\$0.00	\$5,595.84
DELEG-021	Rampa para personas con discapacidad, 1.20x 4.30m de firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta	m2	5.16	5.18	0.00	5.18	- 0.02	\$371.23	\$1,915.55	\$0.00	\$1,922.97	-\$7.42
DELEG-022	Base para finaco de 1.1x1.1 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	-	\$1,238.87	\$1,238.87	\$0.00	\$1,238.87	\$0.00
DELEG-023	Registro sanitario con medias interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho	pza	6.00	6.00	0.00	6.00	-	\$2,488.97	\$14,933.82	\$0.00	\$14,933.82	\$0.00
Total ALBAÑILERIA									\$735,902.70	\$89,074.27		
A04	ESTRUCTURA											
DELEG-024	Estructura metálica (vigas IPR ligeras) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	kg	2,245.57	0.00	0.00	0.00	2,245.57	\$51.64	\$115,961.23	\$0.00	\$0.00	\$115,961.23
DELEG-025	Columna metálicas a base de angulo de 4"x4", incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, armado, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	532.59	532.59	0.00	532.59	-	\$51.64	\$27,502.95	\$0.00	\$27,502.95	\$0.00
Total ESTRUCTURA									\$143,464.18	\$0.00		
A05	ACABADOS											
DELEG-026	Suministro y aplicación de Pasta Textuizada en muros, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	250.00	0.00	620.79	620.79	- 370.79	\$87.57	\$21,892.50	\$54,362.93	\$0.00	-\$32,470.43
Total ACABADOS									\$21,892.50	\$0.00		
A06	PISOS Y AZULEJOS											
DELEG-027	Vitropiso de 0.50x0.50m, incluye: suministro de materiales, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta	m2	168.00	161.72	0.00	161.72	6.28	\$620.00	\$104,160.00	\$0.00	\$100,266.40	\$3,893.60
DELEG-028	Zoclo de vitropiso de 10 x 50cm; incluye: suministro de materiales, colocación, pegamento, mano de obra, equipo y herramienta	m	104.20	95.01	0.00	95.01	9.19	\$157.53	\$16,414.63	\$0.00	\$14,966.93	\$1,447.70
DELEG-029	Azulejo en muros Línea económica, asentada con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	m2	46.16	46.16	0.00	46.16	-	\$458.73	\$21,174.98	\$0.00	\$21,174.98	\$0.00
Total PISOS Y AZULEJOS									\$141,749.61	\$54,362.93		
A07	HERRERÍA											





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020

OBRA : "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)

UBICACIÓN : CHANTEPEC

CONTRATISTA : SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
DELEG-030	Puerta metálica de 1.00 m. de ancho por 2.1 m. de altura, con marco de Tubular P-150 Cal 18 y perfiles intermedios, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, tablero de lámina 140 cal. 20, en la parte inferior y vanos para dos cristales (no incluidos) en la parte superior.	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	-	\$6,126.50	\$18,379.50	\$0.00	\$18,379.50	\$0.00
DELEG-031	Ventana un fijo y un corredizo de 0.80 por 0.40 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, incluye: materiales.	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$2,049.34	\$4,098.68	\$0.00	\$4,098.68	\$0.00
DELEG-032	Ventana un fijo y un corredizo de 1.00 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, incluye: materiales.	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$3,776.33	\$7,552.66	\$0.00	\$7,552.66	\$0.00
DELEG-033	Ventana un fijo y un corredizo de 1.50 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, incluye: materiales.	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$4,859.56	\$9,719.12	\$0.00	\$9,719.12	\$0.00
DELEG-034	Ventana metálica a base de solera, ángulo y perfiles tubulares de acero de 1.30x0.50m; incluye: materiales, herrajes, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, esmerilado, emplastecido, aplicación de primer y pintura de esmalte, bisagras latonadas.	pza	6.00	6.00	0.00	6.00	-	\$2,230.68	\$13,384.08	\$0.00	\$13,384.08	\$0.00
	Total HERRERÍA								\$53,134.04	\$0.00		
A08	CARPINTERIA											
DELEG-035	Puerta de tambor de 0.90x2.10 m. con triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural m.	pza	5.00	5.00	0.00	5.00	-	\$3,617.46	\$18,087.30	\$0.00	\$18,087.30	\$0.00
	Total CARPINTERIA								\$18,087.30	\$0.00		

OPERADO
FOCOCI 2020



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020

OBRA : "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)

UBICACIÓN : CHANTEPEC

CONTRATISTA : SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A09	MUEBLES DE BAÑO												
DELEG-036	Inodoro dos piezas, cerámica porcelanizada, blanco, American Standard, incluye: suministro y colocación	pza	8.00	8.00	0.00	8.00	-	\$4,952.79	\$39,622.32	\$0.00	\$39,622.32	\$0.00	
DELEG-037	Lavabo de colgar, blanco, American Standard, Incluye: mezcladora de lavabo económica, suministro y colocación	pza	10.00	10.00	0.00	10.00	-	\$1,802.19	\$18,021.90	\$0.00	\$18,021.90	\$0.00	
DELEG-038	Mingitorio, cerámica porcelanizada, Maybrook, blanco, American Standard, Incluye: Fluxómetro de manija económico para mingitorio, suministro y colocación	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	-	\$2,985.18	\$8,955.54	\$0.00	\$8,955.54	\$0.00	
DELEG-039	Juego de mamparas para inodoro, modelo Colgante, acabado, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	pza	6.00	6.00	0.00	6.00	-	\$5,326.43	\$31,958.58	\$0.00	\$31,958.58	\$0.00	
DELEG-040	Mamparas para mingitorio, modelo Colgante, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$5,326.43	\$10,652.86	\$0.00	\$10,652.86	\$0.00	
DELEG-041	Tinaco bicapa de 1000 litros, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	-	\$3,603.40	\$3,603.40	\$0.00	\$3,603.40	\$0.00	
	Total MUEBLES DE BAÑO								\$112,814.60	\$0.00			
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA												
DELEG-042	Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con tubería de CPVC de 25 y 32 mm. de diámetro, incluye: conexiones de 25 mm. de diámetro; 1 codo , 1 tee, tapón capa y 1 conector cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diámetro; 3 codos, 1 conector cuerda int	sal	8.00	8.00	0.00	8.00	-	\$1,190.63	\$9,525.04	\$0.00	\$9,525.04	\$0.00	
DELEG-043	Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90 x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de 90 x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta	sal	8.00	8.00	0.00	8.00	-	\$713.14	\$5,705.12	\$0.00	\$5,705.12	\$0.00	
DELEG-044	Salida hidráulica para lavabo, con tubería de CPVC de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta	sal	10.00	10.00	0.00	10.00	-	\$864.28	\$8,642.80	\$0.00	\$8,642.80	\$0.00	
DELEG-045	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta	sal	10.00	10.00	0.00	10.00	-	\$429.07	\$4,290.70	\$0.00	\$4,290.70	\$0.00	
DELEG-046	Salida hidrosanitaria para mingitorio de fluxometro, con tubería de CPVC de 19 mm. con un desarrollo de 3 m, y desagüe con tubería de PVC con un desarrollo de 4 m, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	sal	3.00	3.00	0.00	3.00	-	\$718.07	\$2,154.21	\$0.00	\$2,154.21	\$0.00	
DELEG-047	Línea hidráulica de llenado a tinaco con tubería de CPVC de 1/2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	-	\$2,248.33	\$2,248.33	\$0.00	\$2,248.33	\$0.00	
DELEG-048	Tubo de cpvc hidráulico de 19 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta	m	52.00	24.80	0.00	24.80	27.20	\$77.20	\$4,014.40	\$0.00	\$1,914.56	\$2,099.84	
DELEG-049	Tubo de cpvc hidráulico de 25 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta	m	42.00	36.94	0.00	36.94	5.06	\$126.54	\$5,314.68	\$0.00	\$4,674.39	\$640.29	
DELEG-050	Tubo de PVC sanitario, de 2" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta	m	16.00	16.00	0.00	16.00	-	\$88.94	\$1,423.04	\$0.00	\$1,423.04	\$0.00	
DELEG-051	Tubo de PVC sanitario, de 4" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta	m	28.00	39.82	0.00	39.82	11.82	\$168.41	\$4,715.48	\$0.00	\$6,706.09	-\$1,990.61	
DELEG-052	Tubo de PVC sanitario, de 6" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta	m	25.00	18.61	0.00	18.61	6.39	\$306.32	\$7,658.00	\$0.00	\$5,700.62	\$1,957.38	
	Total INSTALACIÓN HIDROSANITARIA								\$55,691.80	\$0.00			

OPERADO
FOCO 2020





SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV
 ANDADOR LAS LOMAS 67, LOS LIMONES, C.P.28400 COQUIMATLAN, COLIMA.
 R.F.C.SSI 130514 4G7 REGISTRO SIOP 6268




EMPRESA:	SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA:	"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)		

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020

NUMEROS GENERADORES		
DELEG-015	Muro de 14 cm. de espesor de block de jalcreto 0.11x0.14x0.28 m, asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado aparente, a plomo e hilo, Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	FOTOGRAFÍA




 SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV
 EL CONTRATISTA


 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO







SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV
 ANDADOR LAS LOMAS 67, LOS LIMONES, C.P.28400 COQUIMATLAN, COLIMA.
 R.F.C.SSI 130514 4G7 REGISTRO SIOP 6268




EMPRESA:	SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA:	"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)		

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020

NUMEROS GENERADORES		
DELEG-015	Aplanado fino en muros de fachada, de 1.5 cm. de espesor, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, renta, montaje y desmontaje de hamaca, mano de obra, equipo y herramienta.	FOTOGRAFÍA

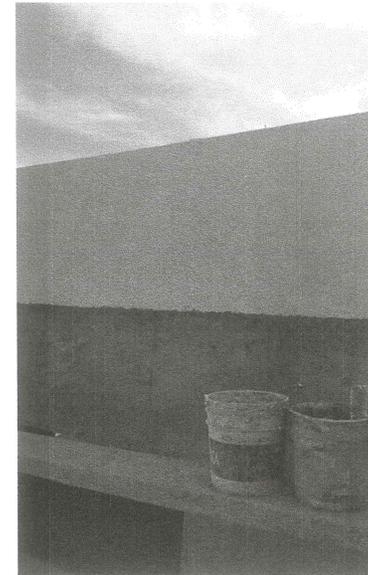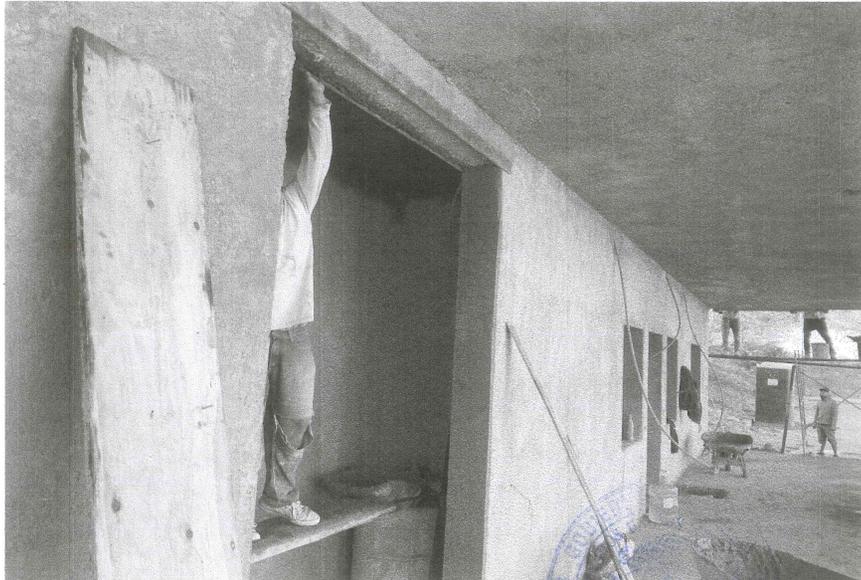


 SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV
 EL CONTRATISTA


 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


[OPERADO]
[FOCOCI 2020]




SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV
 ANDADOR LAS LOMAS 67, LOS LIMONES, C.P.28400 COQUIMATLAN, COLIMA.
 R.F.C.SSI 130514 4G7 REGISTRO SIOP 6268



EMPRESA:	SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA:	"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)		

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020

NUMEROS GENERADORES								CROQUIS.
DELEG-026	Suministro y aplicación de Pasta Textuizada en muros, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.							
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ALTO	CARAS	M2 PUERTAS	CANTIDAD	TOTAL	
M2	ZONA 1	5.00	3.00	2.00	-	30.00	30.00	
		1.00	3.00	2.00	-	6.00	6.00	
		3.82	3.00	2.00	-	22.92	22.92	
		5.00	3.00	2.00	-	30.00	30.00	
		8.78	3.00	2.00	5.04	47.64	47.64	
		1.45	3.00	2.00	-	8.70	8.70	
		5.00	3.00	2.00	1.89	28.11	28.11	
		5.00	3.00	2.00	3.78	26.22	26.22	
		4.00	3.00	2.00	3.78	20.22	20.22	
		1.30	3.00	2.00	-	7.80	7.80	
		5.00	3.00	2.00	3.78	26.22	26.22	
		19.48	3.00	2.00	-	116.88	116.88	
		19.48	3.00	2.00	27.66	89.22	89.22	
	ESQUINAS DE CASTILLOS	1.8	3.00	1.00		5.40	5.40	
SUBTOTAL							465.33	



 SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV EL CONTRATISTA	 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
---	---

[OPERADO]
[FOCOCI 2020]

DELEG-026	Suministro y aplicación de Pasta Textuizada en muros, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.							CROQUIS.
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ALTO	CARAS	M2 PUERTAS	TOTAL		
						19.58		




SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV
 ANDADOR LAS LOMAS 67, LOS LIMONES, C.P.28400 COQUIMATLAN, COLIMA.
 R.F.C.SSI 130514 4G7 REGISTRO SIOP 6268



EMPRESA:	SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA:	"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO)		

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 01 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020

NUMEROS GENERADORES		
DELEG-026	Suministro y aplicación de Pasta Textuizada en muros, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	FOTOGRAFÍA

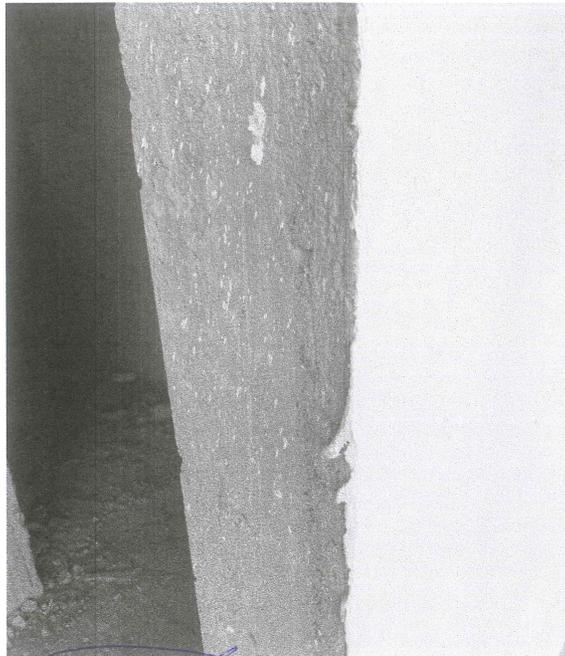

[Signature]
 SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV
 EL CONTRATISTA

[Signature]
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[Stamp: 2018 COQUIMATLAN JALISCO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS]
