

RFC emisor: CASE780113C89
 Nombre emisor: SERGIO CABRERA
 RFC receptor: MJJ850101KP8
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
 Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: 9906DA8A-A458-4309-AF2D-8A15D9F168D0
 No. de serie del CSD: 00001000000412468965
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45425 2020-12-23 10:19:34
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72141105		1	E48	SERVICIO	511843.20	511843.20				
Descripción	Pago de Estimación No. 4 (CUATRO) FINIQUITO, relativo a la obra; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, MENOS 2% \$165,411.57 PARA PANDEMIA Y 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 2,554.22 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; \$ 425,767.33				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	511843.20	Tasa	16.0000%	81894.91

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 511,843.20
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 81,894.91
Total \$ 593,738.11

Sello digital del CFDI:

O5Q4go+wio7stR3FGPqsuR++50KWQAJLcSrPE4RGdKihurIO1b35IFLJF6BQgS+vxJ37oeec+bz0RFgg+qKvTGksXuD+MKzF1bDoX4XP6u7QE7mYq92FG5Dctb5SPaVaUFPPrSG4i26LTGe4LuL/Bfm+iCflrFXUy06NYO2ValPYMn798PYAVIW/YUTB3o0ZSpR14pBEWRlpMd9sW07bNg3cyqODhV7pcp3SMvqgtfAt0OQn+J+axMHAWY/3k6Gg7cVUSyKHKxk+4QN1L1AbYQRZGyHGKPV6p11oY9jI62IDMuYvZ1APy/McuqDqTeRLvQczeYkbf/5jHcz6b5/KfsQ==

Sello digital del SAT:

DW/LmkbaVNec0QvZkZv/4PZCEYeEBhIBfk6ydmqvWan5pN74hpqrB0riVrpSU4W7ssGW3vtNgHrwrIcxKQel10KotF2mTiGVqwbEgnyeEQaaFmrX00YzjglicV21LgzSDhRt5gm27nsDcJuXEv2gFA0kxquHn+M1jtiNs2EqidnOSi+VWaPh912+ARmU7v0uoyP0D2waA46S/3yWnoculpr3rkFz7M7BKBSctZw0tAydPfmie0YJDmrt234ehrRNuh2v+30k51RTUcILLTvWrBJL2Aze0MUlcaXtqVwRTZAxxLafwL8ynBfm8VCj7cUbrhzR3AmdvV7SBQwAe4Imw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9906DA8A-A458-4309-AF2D-8A15D9F168D0|2020-12-23T10:24:04|SAT970701NN3|O5Q4go+wio7stR3FGPqsuR++50KWQAJLcSrPE4RGdKihurIO1b35IFLJF6BQgS+vxJ37oeec+bz0RFgg+qKvTGksXuD+MKzF1bDoX4XP6u7QE7mYq92FG5Dctb5SPaVaUFPPrSG4i26LTGe4LuL/Bfm+iCflrFXUy06NYO2ValPYMn798PYAVIW/YUTB3o0ZSpR14pBEWRlpMd9sW07bNg3cyqODhV7pcp3SMvqgtfAt0OQn+J+axMHAWY/3k6Gg7cVUSyKHKxk+4QN1L1AbYQRZGyHGKPV6p11oY9jI62IDMuYvZ1APy/McuqDqTeRLvQczeYkbf/5jHcz6b5/KfsQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-23 10:24:04
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2020-12-23T10:19:34"
Sello="O5Q4go+twio7stR3FGPqsuR++50KWQAJLcSrPE4RGdKihurIO1b35IFLJF6BQgS+vxJ37oeec+bz0RFgg+qKvTGksXuD+MKzF1bDoX4XP6u7QE7m)
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000412468965" SubTotal="511843.20"
Certificado="MIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI0Njg5NjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="593738.11" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45425" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="SERGIO CABRERA" Rfc="CASE780113C89"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" Rfc="MJJ850101KP8" UsoCFDI="101"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="511843.20" ValorUnitario="511843.20" Descripcion="Pago de Estimación No. 4 (CUATRO) FINIQUITO, relativo a la obra;
    "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", MENOS 2%
    $165,411.57 PARA PANDEMIA Y 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) $ 2,554.22 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; $ 425,767.33"
    Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="72141105">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="81894.91" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="511843.20"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="81894.91">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="81894.91" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
    SelloSAT="DW/LmkbaVNec0QvZkZv/4PZCEYeEBhlBfk6ydmqVwan5pN74hpqrB0riVrpSU4W7ssGW3vtNgHrwrlicKQel10KotF2mTiGVqwl
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloCFD="O5Q4go+twio7stR3FGPqsuR++50KWQAJLcSrPE4RGdKihurIO1b35IFLJF6BQgS+vxJ37oeec+bz0RFgg+qKvTGksXuD+MKzF1bD
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-12-23T10:24:04" UUID="9906DA8A-A458-4309-AF2D-8A15D9F168D0"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASE780113C89	SERGIO CABRERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9906DA8A-A458-4309-AF2D-8A15D9F168D0	2020-12-23T10:19:34	2020-12-23T10:24:04	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$593,738.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

[\(https://www.facebook.com/gobmx\)](https://www.facebook.com/gobmx) [\(https://twitter.com/gobmx\)](https://twitter.com/gobmx)

SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO,	No. DE CONTRATO: FOCOCI-OP-CSS-028/2020	HOJA DE RELACIÓN	HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".	PERÍODO DE TRABAJO:	
	UBICACIÓN: CHANTEPEC.	DEL:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020
		FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES	
	PLAZA				
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	399,448.26
	QUIOSCO CHANTEPEC				
				\$	-
				\$	-
				\$	37,420.00
				\$	-
				\$	-
				\$	44,670.74
				\$	20,582.60
				\$	7,558.91
				\$	2,162.70
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	511,843.20
				\$	-
				\$	511,843.20
				\$	81,894.91
				\$	593,738.11
				\$	165,411.57
				\$	2,559.22
				\$	425,767.33
				\$	

SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428
R.F.C. CASE780113 C89 REGISTRO SIOIP JALISCO C-680

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CHANTEPEC

CONTRATISTA : SERGIO CABRERA

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

**ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA**

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".												
	PLAZA											
	PRELIMINARES											
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (HASTA 500 M2)	M2	7,950.00	8,352.88	0.00	8,352.88	- 402.88	\$14.59	\$115,990.50	\$0.00	\$121,868.49	-\$5,877.99
JOCO-002	DESMONTAJE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL., INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACÉN DE LA OBRA, LIMPIEZA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$3,131.45	\$6,262.90	\$0.00	\$6,262.90	\$0.00
JOCO-003	DESMONTAJE DE PORTON DE FIERRO SIN RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$3,127.31	\$6,254.62	\$0.00	\$6,254.62	\$0.00
JOCO-004	DEMOLICION DE MURO, A MANO CON MARRO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CADENAS, CASTILLOS, APLANADO DE MEZCLA POR AMBAS CARAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	650.00	528.57	0.00	528.57	121.44	\$206.38	\$134,147.00	\$0.00	\$109,085.24	\$25,061.76
JOCO-005	DEMOLICION DE BANQUETA, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	220.00	167.13	0.00	167.13	52.87	\$140.18	\$30,839.60	\$0.00	\$23,428.28	\$7,411.32
JOCO-006	DEMOLICION DE GUARNICIÓN, DE CONCRETO SIMPLE, A MARRO, DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EXTRACCIÓN DE PADECERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	110.00	105.42	0.00	105.42	4.58	\$117.09	\$12,879.90	\$0.00	\$12,343.63	\$536.27
										\$0.00		
	TERRACERIAS											
JOCO-007	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2,450.00	3,018.70	0.00	3,018.70	- 568.70	\$104.07	\$254,971.50	\$0.00	\$314,156.11	-\$59,184.61
JOCO-008	ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2,450.00	3,018.70	0.00	3,018.70	- 568.70	\$40.24	\$98,588.00	\$0.00	\$121,472.49	-\$22,884.49
JOCO-009	ACARREO EN CAMIÓN KMS SBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/K	14,700.00	15,093.50	0.00	15,093.50	- 393.50	\$16.61	\$244,167.00	\$0.00	\$250,703.04	-\$6,536.04
JOCO-010	RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO A MÁQUINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2,450.00	2,217.00	0.00	2,217.00	233.00	\$513.62	\$1,258,369.00	\$0.00	\$1,138,695.54	\$119,673.46
										\$0.00		
	ALBAÑILERIA											
JOCO-011	FIRME ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, EN COLOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, COLOR PARA CEMENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,250.00	1,633.20	0.00	1,633.20	- 383.20	\$583.07	\$728,837.50	\$0.00	\$952,269.92	-\$223,432.42
JOCO-012	ADOCRETO CUADRADO DE 6X14X14 CM. COLOR NEGRO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3,046.83	4,248.44	0.00	4,248.44	- 1,201.61	\$733.27	\$2,234,149.03	\$0.00	\$3,115,253.60	-\$881,104.57
										\$		
	JARDINERIA											
JOCO-013	TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	752.00	0.00	0.00	0.00	752.00	\$630.90	\$474,436.80	\$0.00	\$0.00	\$474,436.80
JOCO-014	PASTO ALFOMBRA CON RIEGO DURANTE 15 DÍAS, INCLUYE: ACARREOS, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	\$146.28	\$256,428.84	\$0.00	\$0.00	\$256,428.84
JOCO-015	ARBOLES FIGUS DE 10CM. DE DIAM. MAX. DE TRONCO, Y ALTURA DE 0 A 1.20 M., INCLUYE: EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL DE 0.40 M. DE DIAM. X 0.40 DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON TIERRA LAMA Y ACARREO A UNA 1A ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL	pza	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	\$2,162.36	\$64,870.80	\$0.00	\$0.00	\$64,870.80
										\$0.00		

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

[OPERADO]
FOCOCI 2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

UBICACIÓN : CHANTEPEC

CONTRATISTA : SERGIO CABRERA

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
	ALUMBRADO											
JOCO-016	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	80.00	80.06	0.00	80.06	- 0.06	\$314.38	\$25,150.40	\$0.00	\$25,169.13	-\$18.73
JOCO-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD RD-17 NARANJA, 2" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	600.00	564.42	0.00	564.42	35.58	\$79.28	\$47,568.00	\$0.00	\$44,747.22	\$2,820.78
JOCO-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS, MEDIDAS INTERIORES Y 3.81 CMS DE ESPESOR CON TAPA COLADA EN CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO GALVANIZADO, HERRAJES CON PINTURA ANTICORROSIVA CON FONDO DE GRAVA P.	PZA	22.00	22.00	0.00	22.00	-	\$1,409.35	\$31,005.70	\$0.00	\$31,005.70	\$0.00
JOCO-019	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 H.O CON BASE SUPERIOR 40X40 CMS, BASE INFERIOR 90 X 90 CMS Y ALTURA 90 CMS, INCLUYE: 4 ANCLAS DE 3/4" X1.00 MTS ROSCA DE 10 CMS EN EXTREMO SUPERIOR, 4 TUERCAS, 4 RONDADAS PLANAS, ESTRIBOS CON VARILLAS DE 3	PZA	20.00	20.00	0.00	20.00	-	\$3,256.04	\$65,120.80	\$0.00	\$65,120.80	\$0.00
JOCO-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 6.00M DE ALTURA FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 11, CON PERCHA PARA BRAZO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, DESCARGA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA LA C	PZA	20.00	20.00	0.00	20.00	-	\$3,832.52	\$76,650.40	\$0.00	\$76,650.40	\$0.00
JOCO-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ANTIVANDALICA, MODELO ENUR L FABRICADA A BASE DE POLIMERO TECNICO DE INGENIERIA REFORZADO S7 EN LA CARCASA Y TERMO POLIMERO TRANSPARENTE TROPICALIZADO DE ALTO IMPACTO T5 EN EL DIFUSOR. RESISTENTE A LA CORROSION Y HUM	PZA	20.00	0.00	20.00	20.00	-	\$11,954.12	\$239,082.40	\$239,082.40	\$0.00	\$0.00
JOCO-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	650.00	0.00	714.42	714.42	- 64.42	\$53.83	\$34,989.50	\$38,457.23	\$0.00	-\$3,467.73
JOCO-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 8, DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1,300.00	0.00	1,428.84	1,428.84	- 128.84	\$85.32	\$110,916.00	\$121,908.63	\$0.00	-\$10,992.63
										\$399,448.26		
	QUIOSCO CHANTEPEC											
	PRELIMINARES											
JOCO-024	TRAZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	90.00	99.17	0.00	99.17	- 9.17	\$14.59	\$1,313.10	\$0.00	\$1,446.92	-\$133.82
										\$0.00		
	CIMENTACION											
JOCO-025	EXCAVACION DE CEPA A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -1.50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	39.60	34.71	0.00	34.71	4.89	\$104.07	\$4,121.17	\$0.00	\$3,612.27	\$508.90
JOCO-026	CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	79.20	35.27	0.00	35.27	43.93	\$1,874.27	\$148,442.18	\$0.00	\$66,096.81	\$82,345.37
JOCO-027	ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00X0.20 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.35X0.35 M. DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARS.#4, Y ESTRIBOS #3 @ 0.2 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	8.00	8.00	0.00	8.00	-	\$2,029.10	\$16,232.80	\$0.00	\$16,232.80	\$0.00
JOCO-028	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	89.50	117.83	0.00	117.83	- 28.33	\$190.80	\$17,076.60	\$0.00	\$22,481.58	-\$5,404.98
										\$0.00		
	ALBAÑILERIA											



OPERADO
FOCOCI 2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO
 PERÍODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020
 OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

UBICACIÓN : CHANTEPEC
 CONTRATISTA : SERGIO CABRERA
 FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
JOCO-029	CADENA DE DESPLANTE DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m	31.30	46.28	0.00	46.28	-	14.98	\$246.70	\$7,721.71	\$0.00	\$11,417.28	-\$3,695.57
JOCO-030	IMPERMEABILIZACIÓN PARA DESPLANTE DE MUROS HASTA DE 15 CM. DE ANCHO A BASE DE CAPAS DE IMPERFEST E ALTERNADAS CON POLIETILENO 800, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m	31.30	46.28	0.00	46.28	-	14.98	\$72.14	\$2,257.98	\$0.00	\$3,338.64	-\$1,080.66
JOCO-031	CADENA DE CORONA DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m	78.77	0.00	32.00	32.00	46.77	\$246.70	\$19,432.56	\$7,894.40	\$0.00	\$11,538.16	
JOCO-032	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE BLOCK DE JALCRETO 0.11X0.14X0.28 M, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APARENTE, A PLOMO E HILO, INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	0.88	56.46	0.00	56.46	-	55.58	\$542.47	\$477.37	\$0.00	\$30,627.86	-\$30,150.49
JOCO-033	APLANADO FINO EN MUROS DE FACHADA, DE 1.5 CM. DE ESPESOR, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE HAMACA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76	\$139.31	\$245.19	\$0.00	\$0.00	\$245.19	
JOCO-034	PISO DE 10 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	89.60	0.00	77.28	77.28	12.32	\$382.06	\$34,232.58	\$29,525.60	\$0.00	\$4,706.98	
JOCO-035	LOSA DE ENTREPISO TIPO NERVADA DE 30 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=250 KG/CM2, ARMADO, ARMADA SEGUN PROYECTO ESTRUCTURAL CON ACERO DE FY= 4,200 KG/CM2, DEL NO. 3 Y 4, EN TRABES INTERMEDIAS Y PERIMETRALES, ALIGERADA A BASE DE CASOTON DE 90	m2	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	\$1,611.73	\$140,220.51	\$0.00	\$0.00	\$140,220.51	
	ESTRUCTURA									\$37,420.00			
JOCO-036	ESTRUCTURA METÁLICA (VIGAS IPR LIGERAS) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	kg	859.20	0.00	0.00	0.00	859.20	\$41.14	\$35,347.49	\$0.00	\$0.00	\$35,347.49	
JOCO-037	COLUMNA DE 30X30 CM. DE CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") @ 20 CM. AL CENTRO Y @ 10 CM. EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, ARMADO, CIMBRA	m	52.40	52.40	0.00	52.40	-	\$920.29	\$48,223.20	\$0.00	\$48,223.20	\$0.00	
F05	ACABADOS									\$0.00			
JOCO-038	PINTURA VINILICA EN MUROS, FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	m2	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96	\$88.84	\$262.97	\$0.00	\$0.00	\$262.97	
	PISOS									\$0.00			
JOCO-039	PISO DE CANTERA RECINTO DE 40X40X2 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	89.60	0.00	55.42	55.42	34.18	\$806.04	\$72,221.18	\$44,670.74	\$0.00	\$27,550.44	
	HERRERÍA									\$44,670.74			



OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDALICA, MODELO ENUR L FABRICADA A BASE DE POLIMERO TECNICO DE INGENIERIA REFORZADO S7 EN LA CARCASA Y TERMO POLIMERO TRANSPARENTE TROPICALIZADO DE ALTO IMPACTO T5 EN EL DIFUSOR. RESISTENTE A LA CORROSION Y HUM	FOTOGRAFÍA




SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[OPERADO
FOCOCI 2020]



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA
 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA

ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 8, DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA




 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA


 DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[OPERADO]
 [FOCOCI 2020]



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89


REGISTRO SIOF JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES

JOCO-031	CADENA DE CORONA DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	FOTOGRAFÍA
----------	---	------------

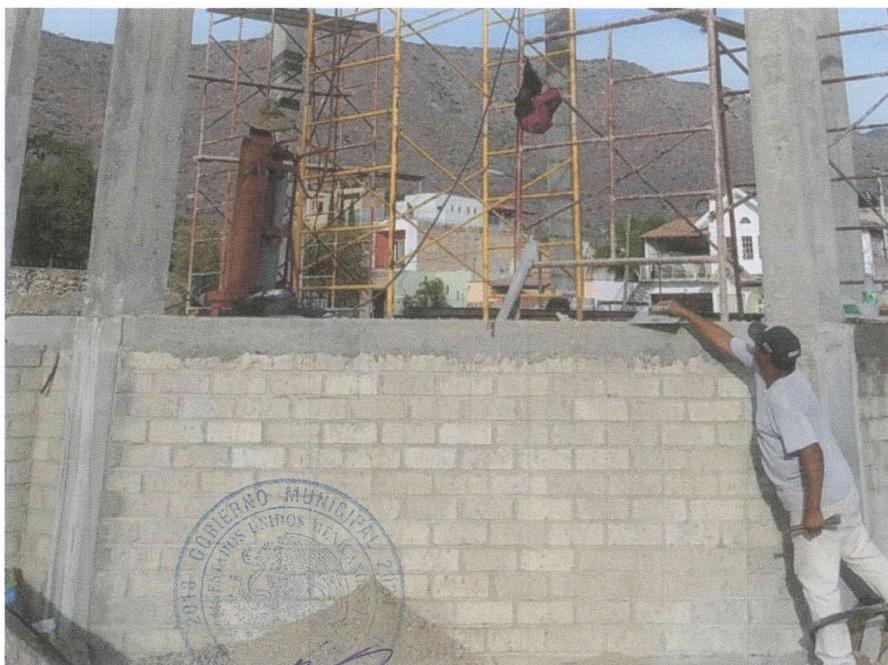


 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA


 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428


R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	LADOS	APOTEMA	AREA	TOTAL
JOCO-034	PISO DE 10 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
M2	ZONA 1	4.00	8.00	4.83	77.28	77.28
					SUMA	77.28

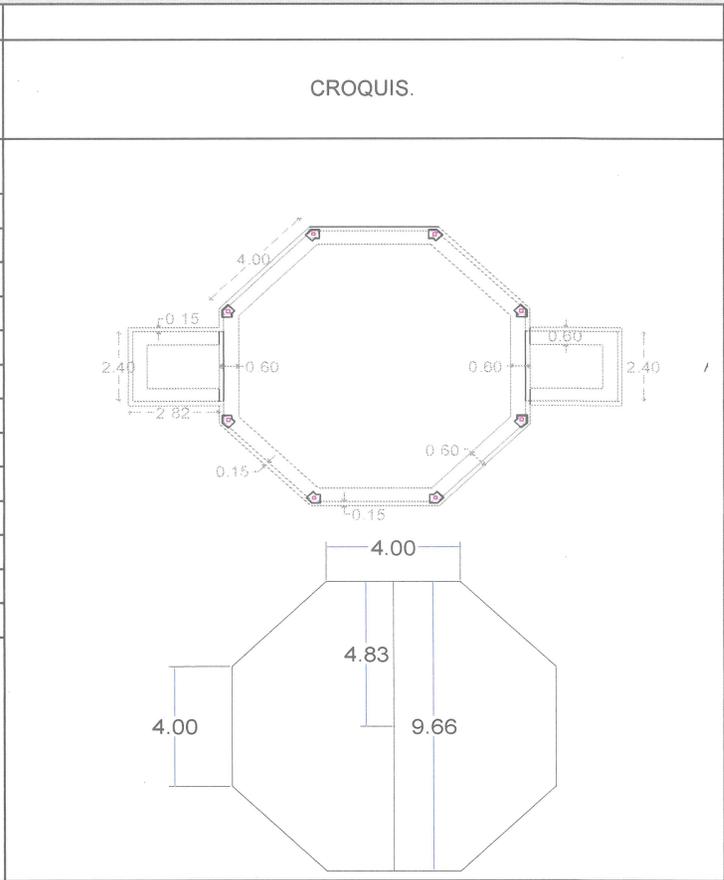

[Signature]
 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA

[Signature]
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-034	PISO DE 10 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA




 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA


 DIRECCION DE
 CONTRATACIONES
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:

SERGIO CABRERA

FECHA:

17 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES

JOCO-035 BOVEDA DE CATALANA, CONSTRUIDA CON LADRILLO COMÚN DE 7 x 14 x 28cm JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - AREANA 1:1:6, TERMINADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, AMO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ALTO	AREA	TOTAL
M2	ZONA 1			87.92	87.92
				SUMA	87.92

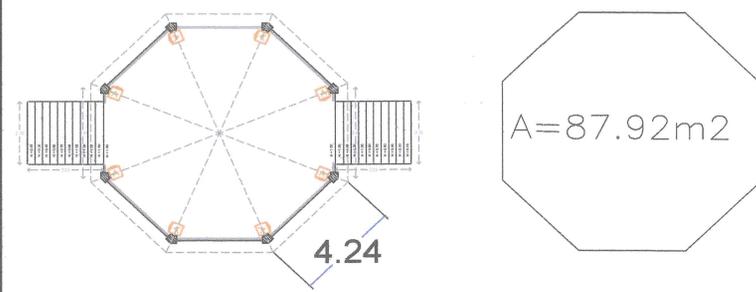

ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:

SERGIO CABRERA

FECHA:

17 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES

JOCO-035 BOVEDA DE CATALANA, CONSTRUIDA CON LADRILLO COMÚN DE 7 x 14 x 28cm JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - AREANA 1:1:6, TERMINADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, AMO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA




SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428




R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			


LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES						
PISO DE CANTERA RECINTO DE 40X40X2 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	APOTEMA	AREA	TOTAL
M2	ZONA 1	4.00	8.00	4.83	77.28	77.28
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	PIEZAS	AREA	
M2	ZONA 2	4.35	2.70	2.00	11.75	23.49
SE COBRA SOLO ESTA CANTIDAD POR QUE SE AGOTO PRESUPUESTO.						55.42
					SUMA	55.42

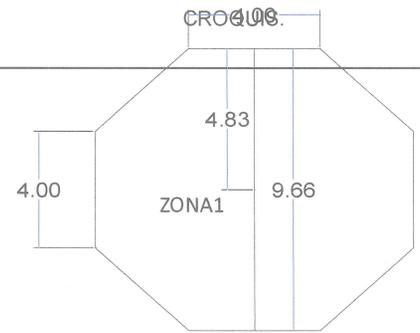

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-039	PISO DE CANTERA RECINTO DE 40X40X2 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA



Sergio Cabrera
 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA

Eduardo Romero Carrillo
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			


LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES

JOCO-040 BARANDAL DE 3.50 POR 0.9 M. DE ALTURA, CON DOS POSTES DE PTR 1 1/2"X1 1/2" DE 3.2 MM, ANCLADOS AL PISO CON PLACA A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 0.12X0.12 M. PASAMANOS DE TUBO CED 30 DE 2", Y PERFILES ADICIONALES DE CUADRADO DE ACERO 12.7 MM, CON 30 AROS DE 12 CM DE SOLERA DE 3/16"X1/2"INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	PIEZAS	TOTAL
PZA	ZONA 1			10.00	10.00
				SUMA	10.00

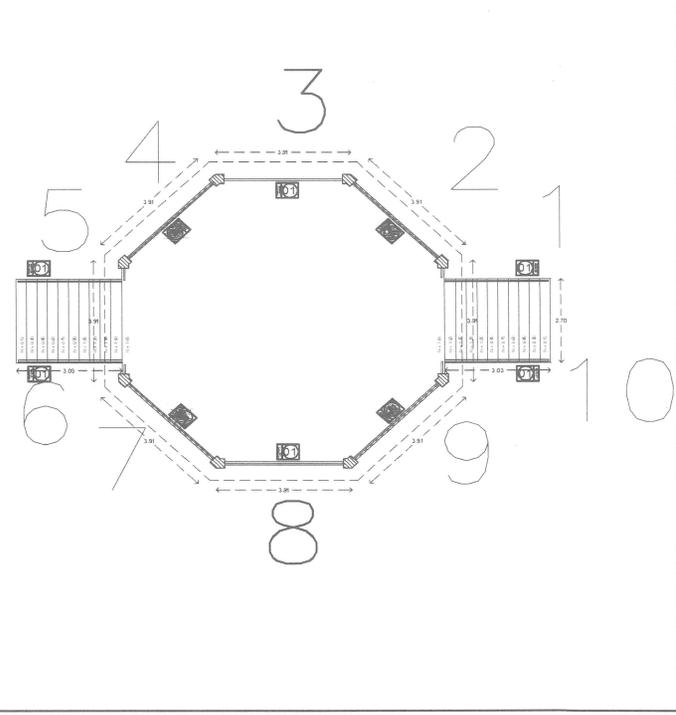

(Handwritten signature)
 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA

(Handwritten signature)
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

(Official seal and stamp)
 GOBIERNO MUNICIPAL
 JOCOTEPEC, JALISCO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-040	BARANDAL DE 3.50 POR 0.9 M. DE ALTURA, CON DOS POSTES DE PTR 1 1/2"X1 1/2" DE 3.2 MM, ANCLADOS AL PISO CON PLACA A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 0.12X0.12 M. PASAMANOS DE TUBO CED 30 DE 2", Y PERFILES ADICIONALES DE CUADRADO DE ACERO 12.7 MM, CON 30 AROS DE 12 CM DE SOLERA DE 3/16"X1/2"INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE	FOTOGRAFÍA




 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA


 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428


R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES						
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO Y PLACA.						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	PIEZAS	TOTAL	
PZA	ZONA 1			2.00		2.00
				SUMA		2.00

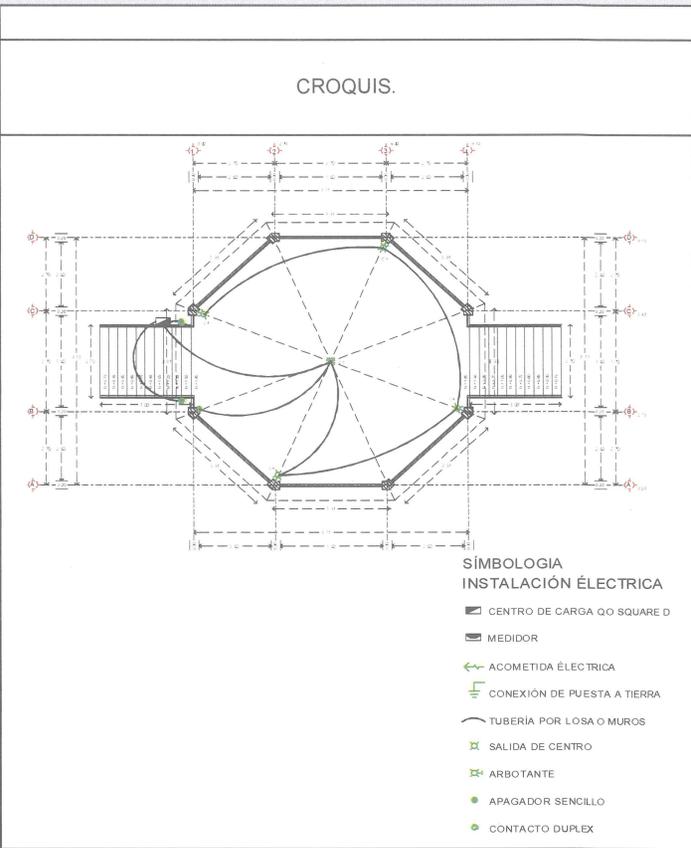

SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA

ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-041	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO Y PLACA.	FOTOGRAFÍA




 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA


 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[OPERADO]
 [FOCOCI 2020]



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428


R.F.C. CASE780113 C89


REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	PIEZAS	TOTAL	
JOCO-042	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET, APAGADOR Y PLACA.					
PZA	ZONA 1			5.00		5.00
				SUMA		5.00

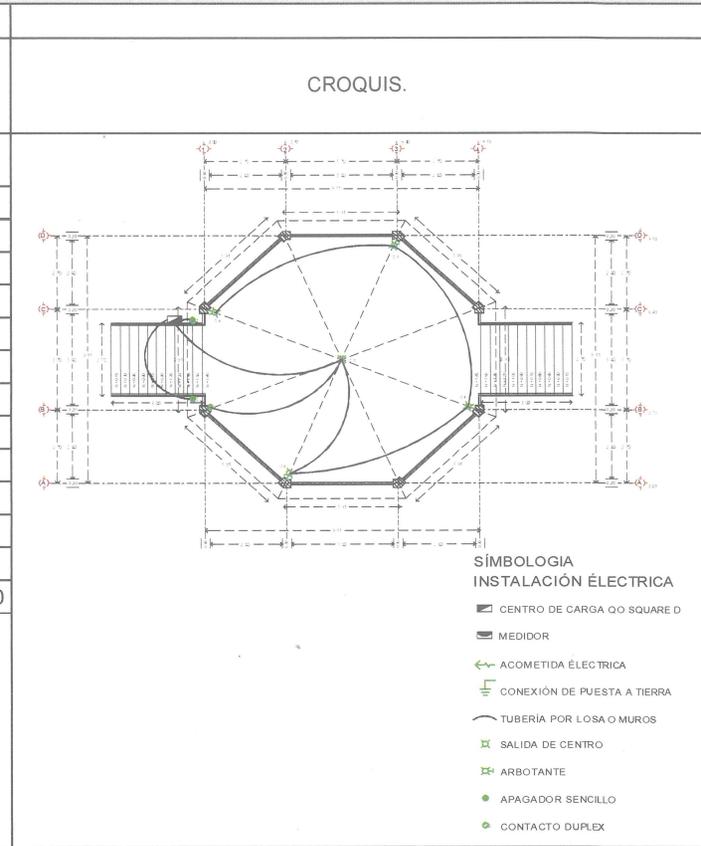


 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA


 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[OPERADO]
 [FOCOCI 2020]



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428





R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-042	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET, APAGADOR Y PLACA.	FOTOGRAFÍA

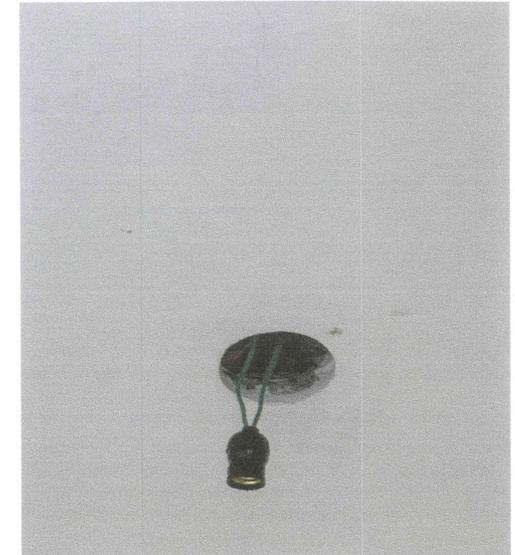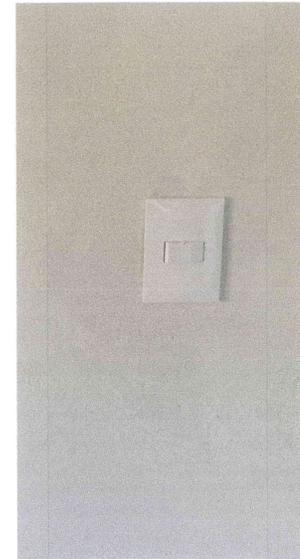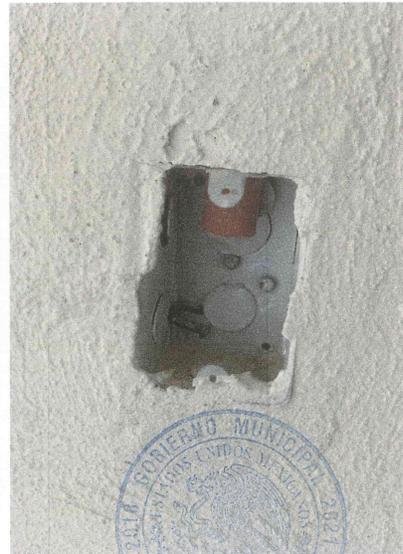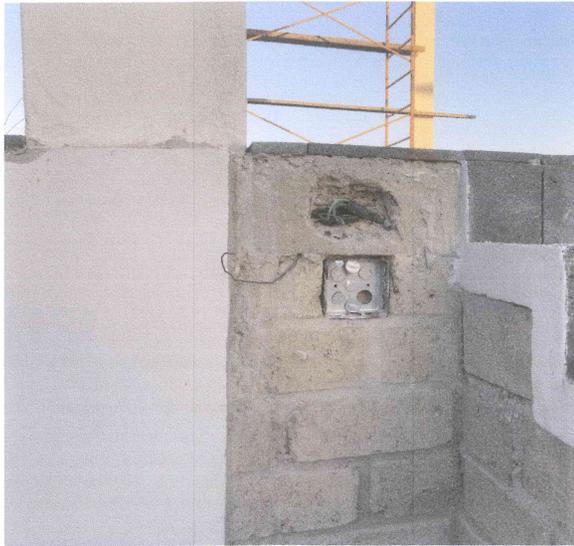


 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA


 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428


R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES							
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	PIEZAS	TOTAL		
JOCO-042	CENTRO DE CARGA 2 POLOS, 1F-3H, QO112L125F DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA 1, DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
PZA	ZONA 1			1.00		1.00	
				SUMA		1.00	

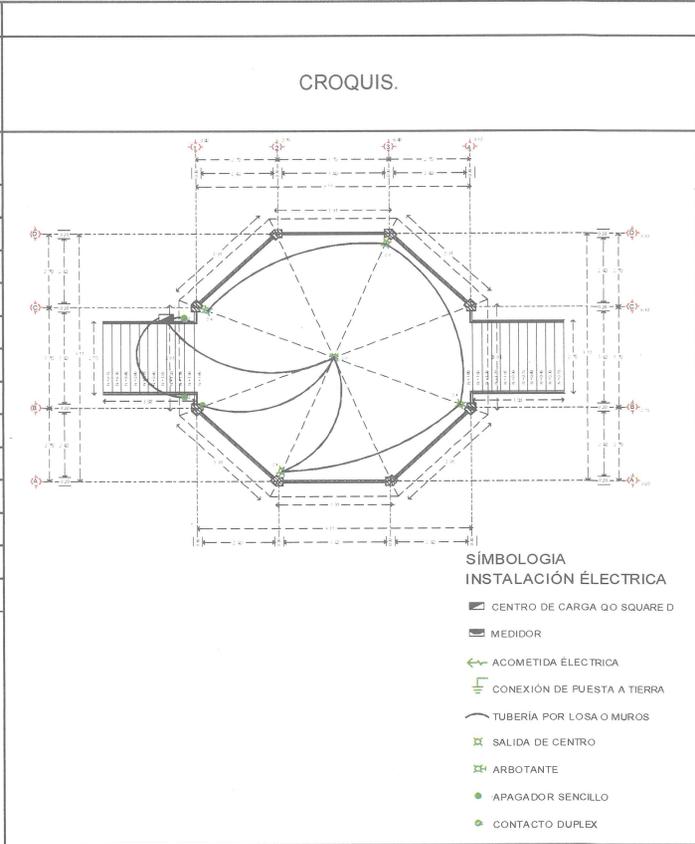

[Handwritten Signature]
 SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA

[Handwritten Signature]
 ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428

R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-042	CENTRO DE CARGA 2 POLOS, 1F-3H, QO112L125F DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA 1, DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA




SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[OPERADO]
[FOCOCI 2020]



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428
R.F.C. CASE780113 C89 REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES						
JOCO-044	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					CROQUIS.
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL	
PZA	ZONA 1			90.00		90.00
				SUMA		90.00

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

A=90.00m2

OPERADO
FOCOCI 2020



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 45428


R.F.C. CASE780113 C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES		
JOCO-044	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA

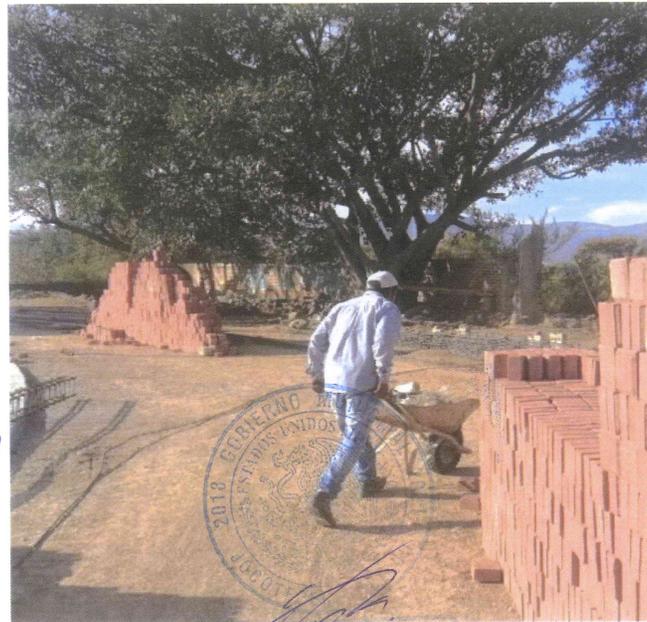


SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[OPERADO]
[FOCOCI 2020]
