



Jocotepec
Gobierno Municipal

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Dirección de Obras Públicas
Administración 2018-2021
Número de Oficio 972/2021

Jocotepec, Jal., a 05 de agosto del 2021.

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **SUPERVISIÓN, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$24,239.25 (Veinticuatro Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 25/100 M.N.)** por concepto de Estimación 02 y Finiquito, correspondiente al siguiente proyecto

Nombre del Proyecto:	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES (FRENTE 1)
Localidad:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO
Programa:	CUENTA CORRIENTE 2021
Partida Contable:	6151-2-11-050-296
Contrato:	GMJ 014C-OP/2021

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA	NETO A PAGAR
89-A	\$26/07/2021	156,948.51	\$ 676.50	\$ 24,239.25

Anexo:

1. Factura y CDFI
2. Estimación 02 y Finiquito
3. Formato D32 (SAT) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes

ATENTAMENTE
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Factura: 89 A

Folio fiscal: 8BE54C4D-7E57-4A21-9346-BC2E9DF20E54

RFC: SPY1302262V3

Domicilio fiscal: Calzada de las Flores # 115 Real del Bosque, Zapopan, Jalisco, México

CP de expedición: 45130

Cliente (RFC): MJJ850101KP8
Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO C.P. 45800 Jocotepec Jalisco México

Clave y unidad SAT	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
80111618 - E48	1	Rehabilitación de calles en Zapotitan, municipio de Jocotepec, Jalisco. Calles Pavimentación Calle Juárez de Allende a Pedro Mbreno Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre Pavimentación Pedro Mbreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo.	\$ 135,300.44	\$ 113,821.34	\$ 135,300.44
	IVA	Tasa: 16	Traslado	Federal	\$ 3436.66
	DERECHODEI	Tasa: 0.5	Retencion	Local	\$ 107.40
				Subtotal:	\$ 135,300.44
				IVA Traslado:	\$ 3,436.66
				Impuestos locales retenidos:	\$ 107.40
				Descuento:	\$ 113,821.34
				Total:	\$ 24,808.36

VEINTE Y CUATRO ML OCHOCIENTOS OCHO PESOS 36/100 MN.

Observación: spy1302262v3

Sello Digital del Emisor:

J8jLzulkjXqm8OUJwemVA/TfwZa/F0DbdgY71n5pkGVohH5oTN+xDIcQ64mgs+Frirt1s/gXYNZSXOwSbaJMGYXIGw/QE/WUeImYFre4O97qurCUe+T/B+7Z3T0E5UUhKNe+ivesCq5/UyIFvurLNEutAcapSwS+m4qTXub7v8gwdNWqWQNW6dMjcmUGDKF5yGvb4ch1v9myI7TL3G6FU611/+fFR4+NGobPdn71z0573M77nW18EWEQINderlawT/fvDSnf1Jx7dpCeTbW2JeriVAjC9jAOWT20XU46oDhKFNWQm8wJ9gibbBbHa10GCKJpXgZA==

Cadena Original del Timbre:

||3.3|A|89|2021-07-26T19:54:00|03|00001000000409427679|135300.44|113821.34|MXN|24808.36||FUE|45130|SPY1302262V3|SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |601|MJJ850101KP8|MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO|F01|80111618|E48|Rehabilitación de calles en Zapotitan, municipio de Jocotepec, Jalisco. Calles Pavimentación Calle Juárez de Allende a Pedro Mbreno Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre Pavimentación Pedro Mbreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo.|135300.44|135300.44|113821.34|21479.10|002|Tasa|0.160000|3436.66|002|Tasa|0.160000|3436.66|3436.66|1.0|107.40|0.00|DERECHODEI|0.01|107.40||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha emisión: 26/07/2021 07:54:00 p. m	Fecha certificación: 26/07/2021 08:05:34 p. m	Tipo de comprobante: I - Ingreso
Regimen fiscal: 601 - General de ley personas morales	CSD emisor: 00001000000409427679	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso CFDI: F01 - Pbr definir	CSD SAT: 30001000000400002495	Método de pago: FUE - Pago en una sola exhibición

Sello Digital SAT

BU98Ul8iXq/MLGnT65pV9hNZicdvp7M2/YueTEVAiNMgDwx5i7E9t1mA+96fwTDg2L0eysZ8NrwNZS2cPGzszYzN3hcHSQBL4npDMQJksyNYV0MEwliycTYRZ5znIsNXckvsSca02+9OwyHnGb4z1mARr9W+sPhrlcs7dy9m4AqVu1FKR4lo4LNaXC0E7TvsK/M0xhX/umMjDQ80tOPkCocPaHp2+vN6Z2Oxonv8mYN/9Qs9w9+ZSx+EiPDTVpGxPcNzPLx+hi8ARcRBh+HggJFxbGOU8II5ZCBxYMaiRDexAE98Y0LRy7R.JQeIX2A'sJQuTUacdE+BcYw==

SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIM PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

OBRA : REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITAI

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA : SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
ZAPOTITAN DE HIDALGO													
001	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.												
01	Pavimentación Calle Juarez de Allende a Pedro Moreno												
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	M3	19.00	2.45		2.45	16.55	\$4,343.40	\$82,524.60	\$0.00	\$10,641.33	\$71,883.27	
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	948.11		0.00	0.00	948.11	\$43.31	\$41,062.64	\$0.00	\$0.00	\$41,062.64	
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	50.00	40.00	0.00	40.00	10.00	\$4,222.47	\$211,123.50	\$0.00	\$168,898.80	\$42,224.70	
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	M	245.76		0.00	0.00	245.76	\$12.76	\$3,135.90	\$0.00	\$0.00	\$3,135.90	
	Pavimentación Calle Juarez de Allende a Pedro Moreno								\$337,846.64	\$0.00	\$179,540.13	\$158,306.51	
02	Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre												
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	M3	18.00	1.60	0.00	1.60	16.40	\$4,343.40	\$78,181.20	\$0.00	\$6,949.44	\$71,231.76	
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	2,306.75		2,042.00	2,042.00	264.75	\$43.31	\$99,905.34	\$88,439.02	\$0.00	\$11,466.32	
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	45.00	22.40		22.40	22.60	\$4,222.47	\$190,011.15	\$0.00	\$94,583.33	\$95,427.82	
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	M	692.58		0.00	0.00	692.58	\$12.76	\$8,837.32	\$0.00	\$0.00	\$8,837.32	
	Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre								\$376,935.01	\$88,439.02	\$101,532.77	\$186,963.22	
03	Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo												
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	M3	21.00	42.00		42.00	- 21.00	\$4,343.40	\$91,211.40	\$0.00	\$182,422.80	-\$91,211.40	
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	4,301.35		1,082.00	1,082.00	3,219.35	\$43.31	\$186,291.47	\$46,861.42	\$0.00	\$139,430.05	
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	30.00	50.14		50.14	- 20.14	\$4,222.47	\$126,674.10	\$0.00	\$211,714.65	-\$85,040.55	
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	M	904.16		0.00	0.00	904.16	\$12.76	\$11,537.08	\$0.00	\$0.00	\$11,537.08	
	Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo								\$415,714.05	\$46,861.42	\$394,137.45	-\$25,284.82	
									\$1,130,495.70	\$ 135,300.44	\$ 675,210.35	\$ 319,984.91	
									\$ 180,879.31	\$ 21,648.07	\$ 108,033.66	\$ 51,197.59	
									\$ 1,311,375.01	\$ 156,948.51	\$ 783,244.01	\$ 371,182.50	

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. SPY1302252V3

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: GMJ 014 C-OP/2021	HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1 ESTIMACIÓN No. <u>2 (DOS) FINIQUITO</u> PERIODO DE TRABAJO:
	CONTRATISTA: SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.
	UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO	

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTE S	
	Pavimentación Calle Juarez de Allende a Pedro Moreno			\$	-
	Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre			\$	88,439.02
	Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo			\$	46,861.42
	MONTO DE ESTIMACIÓN			\$	135,300.44
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %			\$	113,821.34
	SUBTOTAL			\$	21,479.10
	I.V.A. 16%			\$	3,436.66
	SUMA			\$	24,915.76
	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)			\$	676.50
	NETO A PAGAR			\$	24,239.25
EL CONTRATISTA					
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ	
ASIGNACIÓN	\$ 1,130,495.70	\$ 180,879.31	\$ 1,311,375.01	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 135,300.44	\$ 21,648.07	\$ 156,948.51	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 675,210.35	\$ 108,033.66	\$ 783,244.01		
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 810,510.79	\$ 129,681.73	\$ 940,192.52		
SALDO POR EJERCER	\$ 319,984.91	\$ 51,197.59	\$ 371,182.50		
ANTICIPO %	\$ 282,623.93	\$ 45,219.83	\$ 327,843.75	ING. ENRIQUÉ ENRIQUEZ VAZQUEZ	
AMORTIZACIÓN	\$ 113,821.34	\$ 18,211.41	\$ 132,032.75	ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 168,802.59	\$ 27,008.41	\$ 195,811.00		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 282,623.93	\$ 45,219.83	\$ 327,843.76		
FALTANTE POR AMORTIZAR	-\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00		

**SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3



EMPRESA: SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA:

17 DE MAYO DE 2021

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre

RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado							OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	LADO	area	
M2	0+000.00	0+010.00	10.00	5.40			54.00	
	0+010.00	0+020.00	10.00	5.40			54.00	
	0+020.00	0+030.00	10.00	5.40			54.00	
	0+030.00	0+040.00	10.00	6.40			64.00	
	0+040.00	0+050.00	10.00	6.40			64.00	
	0+050.00	0+060.00	10.00	8.00			80.00	
	0+060.00	0+070.00	10.00	8.00			80.00	
	0+070.00	0+080.00	10.00	7.30			73.00	
	0+080.00	0+090.00	10.00	7.00			70.00	
	0+090.00	0+100.00	10.00	5.10			51.00	
	0+100.00	0+110.00	10.00	5.60			56.00	
	0+110.00	0+120.00	10.00	5.60			56.00	
	0+120.00	0+130.00	10.00	5.60			56.00	
	0+130.00	0+140.00	10.00	5.60			56.00	
	0+140.00	0+150.00	10.00	5.60			56.00	
	0+150.00	0+160.00	10.00	5.60			56.00	
	0+160.00	0+170.00	10.00	5.60			56.00	
	0+170.00	0+180.00	10.00	6.80			68.00	
	0+180.00	0+190.00	10.00	6.80			68.00	
	0+190.00	0+200.00	10.00	6.80			68.00	
						SUMA	1,240.00	

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
EL CONTRATISTAING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

**SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3



EMPRESA: SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA:

17 DE MAYO DE 2021

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre

UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	LADO	area
	0+200.00	0+210.00	10.00	6.80			68.00
	0+210.00	0+220.00	10.00	6.80			68.00
	0+220.00	0+230.00	10.00	6.70			67.00
	0+230.00	0+240.00	10.00	6.70			67.00
	0+240.00	0+250.00	10.00	6.70			67.00
	0+250.00	0+260.00	10.00	6.70			67.00
	0+260.00	0+270.00	10.00	6.70			67.00
	0+270.00	0+280.00	10.00	6.70			67.00
	0+280.00	0+290.00	10.00	6.60			66.00
	0+290.00	0+300.00	10.00	6.60			66.00
	0+300.00	0+310.00	10.00	6.60			66.00
	0+310.00	0+320.00	10.00	6.60			66.00
						SUMA	802.00
						total	2,042.00

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ

EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3





EMPRESA:	SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FECHA:	17 DE MAYO DE 2021
OBRA:	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL Premezclado 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.		


LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA:REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre	
---	--

RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	FOTOGRAFÍA
-------	---	------------

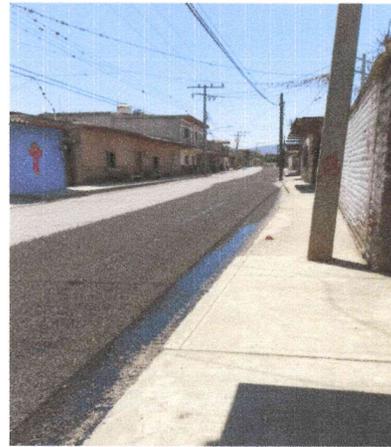


 ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
 EL CONTRATISTA


 ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3





EMPRESA:	SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FECHA:	17 DE MAYO DE 2021
OBRA:	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL Premezclado 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENOVACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.		

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA:REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre	
---	--

RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	CROQUIS
-------	---	---------

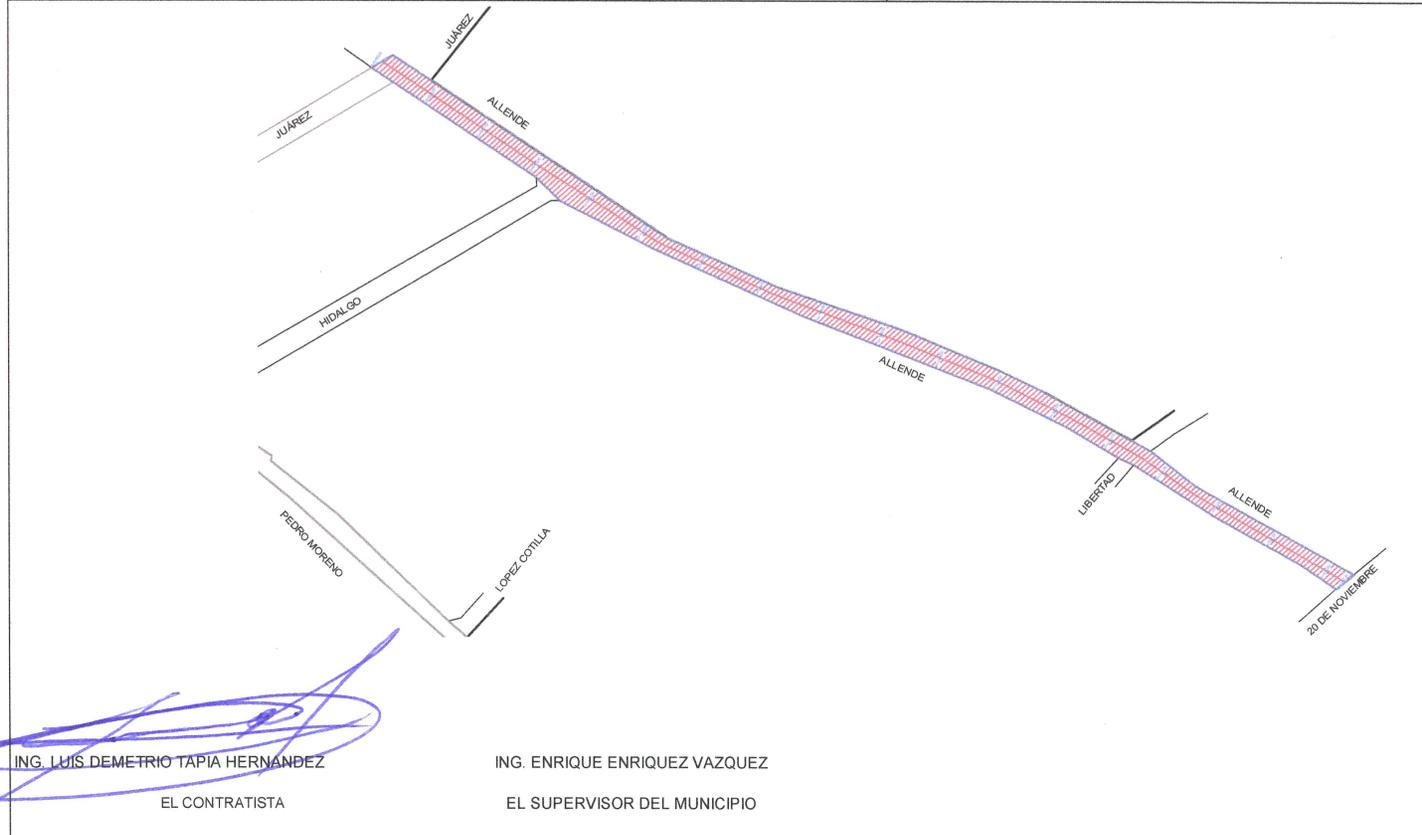


 ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
 EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3




EMPRESA:	SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FECHA:	17 DE MAYO DE 2021
OBRA:	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.		

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA:REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre		
BS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	FOTOGRAFIA




 ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
 EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL Premezclado 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO COESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo

RS-01

Riego de sello con material petreo 3A premezclado

OBSERVACIONES

UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	AREA	LADO	area
M2	0+000.00	0+010.00	10.00	4.50			45.00
	0+010.00	0+020.00	10.00	4.50			45.00
	0+020.00	0+030.00	10.00	4.50			45.00
	0+030.00	0+040.00	10.00	5.80			58.00
	0+040.00	0+050.00	10.00	5.80			58.00
	0+050.00	0+060.00	10.00	5.80			58.00
	0+060.00	0+070.00	10.00	4.90			49.00
	0+070.00	0+080.00	10.00	4.90			49.00
	0+080.00	0+090.00	10.00	4.90			49.00
	0+090.00	0+100.00	10.00	4.90			49.00
	0+100.00	0+110.00	10.00	4.90			49.00
						SUMA	554.00

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO COESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo

Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo

RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado						OBSERVACIONES
	0+110.00	0+120.00	10.00	4.80			48.00
	0+120.00	0+130.00	10.00	4.80			48.00
	0+130.00	0+140.00	10.00	4.80			48.00
	0+140.00	0+150.00	10.00	4.80			48.00
	0+150.00	0+160.00	10.00	4.80			48.00
	0+160.00	0+170.00	10.00	4.80			48.00
	0+170.00	0+180.00	10.00	4.80			48.00
	0+180.00	0+190.00	10.00	4.80			48.00
	0+190.00	0+200.00	10.00	4.80			48.00
	0+200.00	0+210.00	10.00	4.80			48.00
	0+210.00	0+220.00	10.00	4.80			48.00
	0+220.00	0+230.00	10.00	4.80			48.00
						SUMA	432.00

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO COESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo

Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo

RS-01

Riego de sello con material petreo 3A premezclado

OBSERVACIONES

UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	AREA	LADO	area
	0+230.00	0+240.00	10.00	4.80			48.00
	0+240.00	0+250.00	10.00	4.80			48.00
						SUMA	96.00
						TOTAL	1,082.00

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ

EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021



OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO COESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo

RS-01 Riego de sello con material petreo 3A premezclado

FOTOGRAFÍA

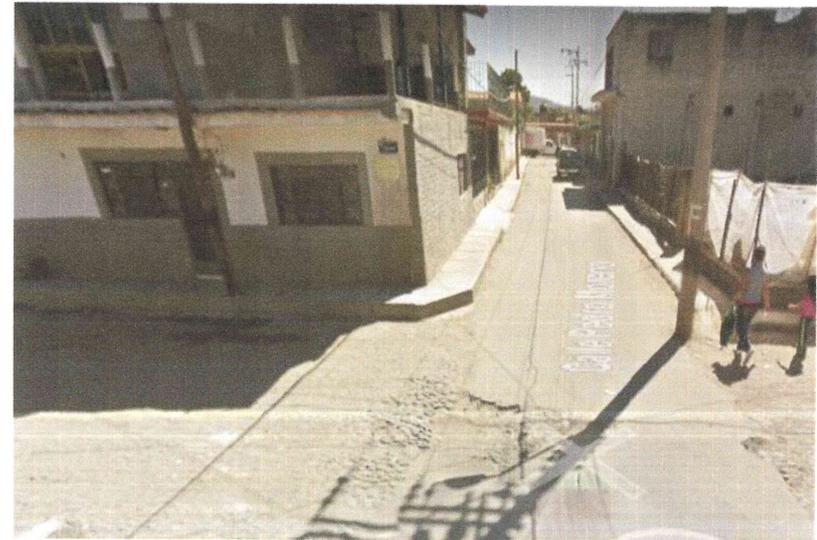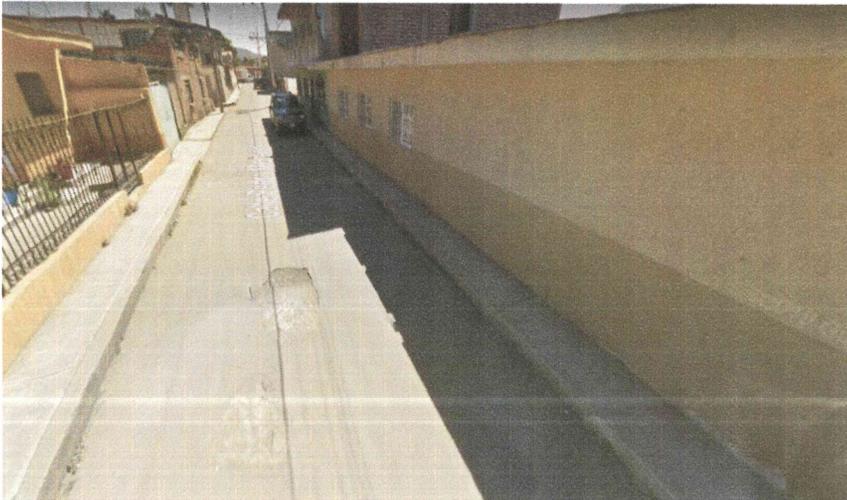

Sello Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3




SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO COESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo		
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	CROQUIS

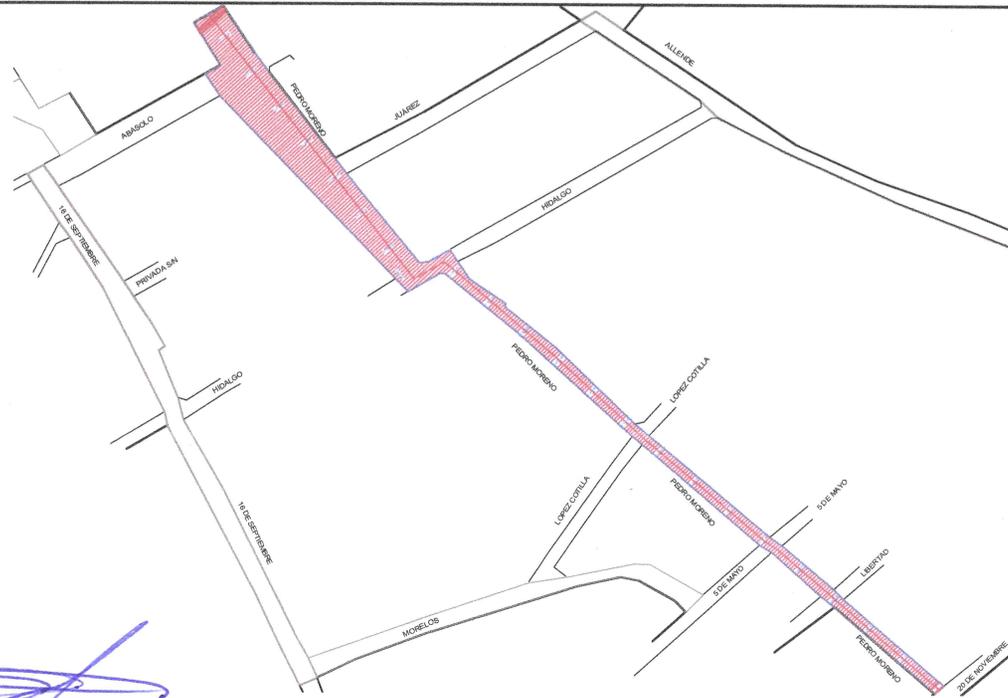


ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ
 EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CALZADA DE LAS FLORES #115 REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. SPY1302252V3



SUPERVISION, PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO COESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO

Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo

RS-01

Riego de sello con material petreo 3A premezclado

CROQUIS



ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ
EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
