

Jocotepec
Gobierno Municipal

Dirección de Obras Públicas
Administración 2018-2021
Número de Oficio 877/2021

Jocotepec, Jal., a 30 de junio del 2021

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **CONVADI, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de: **\$807,990.37 (Ochocientos Siete Mil Novecientos Noventa Pesos 37/100 M.N.)** por concepto de **Estimación 01 y Finiquito**, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2021** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN DE RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN.

Partida Contable: 6231-2-11-050-315

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
842	30/06/2021	\$812,660.83	\$4,670.46	\$ 807,990.37

Realizar un abono por la cantidad de **\$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.)** a la factura antes mencionada.

Anexo:

1. Factura
2. Verificación CFDI
3. Estimación 01 y Finiquito
4. Minuta de termino
5. Acta Entrega Recepción
6. Acta de extinción de derechos y obligaciones
7. Fianzas
8. Formato D32 (SAT) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes

ATENTAMENTE

"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
ENCARGADA DE OBRAS PUBLICAS



Se Abono 300,000
507,990.37
Liberar total





Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 080120940666

Usuario: FRANCISCO DELGADILLO LIMON 41410801

Referencia: 9920210701150415618840

Referencias del Movimiento:

Estado: ENVIADA

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 22000476922 - MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Cuenta Abono: 030320900001974493 - CONVADI SA DE CV

Importe: \$ 300,000.00 MXN

Concepto: A CUENTA FACT 842

Fecha aplicación: 01/07/2021

RFC Beneficiario:

Operación realizada por internet

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



FRANCISCO DELGADILLO LIMON | Últ. acceso: 09/07/21 - 10:21:49 hrs
Cont: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 080120940666

Hora actual: 10:44 Hrs
Fecha actual: 09/07/2021

Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: FRANCISCO DELGADILLO LIMON

Contrato: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 080120940666

Fecha de operación: 09/07/2021

Hora de operación: 10:44 hrs

Registros: 1

Referencia del Lote: 992021070910485808S976

Importe: 253995.18 MXN

Transferencias a enviar

[Exportar PDF](#)

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Sin Descripción Contrato	Estatus
09/07/2021	22000476922 - MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	030320900001974493 - CONVADI SA DE CV	FACT 842	\$ 253,995.18 MXN	992021070910485808S976	☐	ENVIADA

P-0
73

CONVADI S.A DE C.V.

Factura: 842



Folio fiscal: 6ADADDB2-D74D-4D40-AF1C-B1D6A31901C8

RFC: CON1401236F7

Domicilio fiscal: COLON # 1401 A MODERNA, Guadalajara, Jalisco, México

CP de expedición: 44190

Cliente (RFC): MJJ850101KP8

Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Domicilio

PALACIO MUNICIPAL S/N C.P. 45800 Jocotepec Jalisco
México

Clave y unidad SAT	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
72151900 - H87	1	PAGO ESTIMACIÓN 01 ÚNICA (FINIQUITO) DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. INCLUYE: LÍNEA DE IMPULSIÓN DE RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN CONTRATO GMJ 016C-OP/2021, MENOS RETENCIÓN 5 AL MILLAR	\$ 700,569.68	\$ 0.00	\$ 700,569.68
	IVA	\$4,670.46 NETO A PAGAR \$807,990.37	Traslado	Federal	\$ 112091.15
				Subtotal:	\$ 700,569.68
				IVA Traslado:	\$ 112,091.15
				Descuento:	\$ 0.00
				Total:	\$ 812,660.83

OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 83/100 MN.

Observación: con1401236f7


Sello Digital del Emisor:

nCb/sqNAKhfML1a1wPSAahl0wtf12thG81uVYNgcIEAi5cZqghX659IP7m6Dv6CdJMUhF3/9T1FCZCqZotb0ILQkQ7AuZcpTuAa3/zWTwEQLAL6cKX9c2s7AxqHwhCLUar+Juux5KVvH
4aUbYqsJUpfjQdhaV8nNubqeFjn8wf8DJ/0VjgnV0LdQVJpgC4luHmgs5hIWA+PnsTo7S+1FdO4OvrrOW6aVQB9JD4VEaFRNEPb2f8+kNuetZwZbxbLVMGrurhMBmz7oxX7r22vNQU
ckqbyl/Q4NYIB8yYL7Rb2cjXkGaTFgXYt+jh+qfIMy/nHC/bqu36Ati7g==

Cadena Original del Timbre:

||3.3|842|2021-06-30T16:43:00|27|00001000000409480578|700569.68|MXN|812660.83||PUE|44190|CON1401236F7|CONVADI S.A DE C.V.|601|MJJ850101KP8|MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
JALISCO|01|72151900|1|H87|PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 ÚNICA (FINIQUITO) PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO, ALLENDE, INCLUYE
LÍNEA DE IMPULSIÓN DE RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO,
No. CONTRATO GMJ 016C-OP/2021, NETO A PAGAR \$812,660.83|700569.68|700569.68|700569.68|002|Tasa|0.160000|112091.15|002|Tasa|0.160000|112091.15|112091.15|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha emisión: 30/06/2021 04:43:00 p. m.	Fecha certificación: 30/06/2021 04:47:36 p. m.	Tipo de comprobante: I - Ingreso
Regimen fiscal: 601 - General de ley personas morales	CSD emisor: 00001000000409480578	Forma de pago: 27 - A satisfacción del acreedor
Uso CFDI: I01 - Construcciones	CSD SAT: 00001000000505600468	Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Sello Digital SAT		
YD3cMCQ6mRRI7G4kGqN2OTgyVBI2Wisc7Nzd0G7NgnGd4XKN9uC/+LXFSjQqI4MX6An2+Pi3IX02xU5PnzYwK mTsyenIXs+Qf+YXT4iv9/AYHRdcRi/U/henePIMRgSm75CY40eB8FOuR/ygDGLVW41ndsVsgA69Im2AyyDbY+VWw 1vNrk3Zlv63xyd8q4xrkBLMPUjWAwoUTiai9aEbtC9qmei9zG/EFWX/R3OypSHdWYy34GJyp7PZlYUqC5fLZY170lq 2p7Ao6uhllQL8siHaSCR37YFH8hUptEYcW4+JR7CWZJdTpjIWA5AdA2npU4Kw2FjwQ6wLA==		

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44190" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="812660.83" Moneda="MXN" SubTotal="700569.68"
Certificado="MIHGTCCA/GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk0ODAlNzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb(
NoCertificado="00001000000409480578" FormaPago="27"
Sello="nCb/sgNAKhfML1Ia1wPSAahl0wtfi2thG81uVYNgdclEAi5cZqqhX659iP7m6Dv6OdJWUnF3/9T1PCZCqZotb0ILQtkQ7AuZcpTuAa3/zWTweQLAL6oKX
Fecha="2021-06-30T16:43:00" Folio="842" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONVADI S.A. DE C.V." Rfc="CON1401236F7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" Rfc="MJJ850101KP8" UsoCFDI="I01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="700569.68" ValorUnitario="700569.68" Descripcion="PAGODEESTIMACIÓN No. 01 UNICA (FINIQUITO)
      PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZOPROFUNDO, ALLENDE, INCLUYE: LINEA DE
      IMPULSION DE REDE EXISTENTE DE 8", CERCO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN EN LA
      CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, No. CONTRATO G/MJ 016C-OP/2021, NETO A PAGAR $812,660.83" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="72151900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="112091.15" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="700569.68"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos Total Impuestos Traslados="112091.15">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="112091.15" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
        SelloSAT="YD3cMCQ6mRR17Gi4kGqN2OTgyiVB12Wlsc7Nzd0G7NgnGd4XKN9uC/+LXFSjQqI4MX6An2+Pt3IX02xU5PnziyWkmTsyenIXs+Qf+r"
        NoCertificadoSAT="00001000000505600468"
        SelloCFD="nCb/sgNAKhfML1Ia1wPSAahl0wtfi2thG81uVYNgdclEAi5cZqqhX659iP7m6Dv6OdJWUnF3/9T1PCZCqZotb0ILQtkQ7AuZcpTuAa3/zY
        FechaTimbrado="2021-06-30T16:47:36" UUID="6ADADB2-D74D-4D40-AF1C-B1D6A31901C8"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>

```



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CON1401236F7	CONVADI S.A DE C.V.	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6ADADDB2-D74D-4D40-AF1C-B1D6A31901C8	2021-06-30T16:43:00	2021-06-30T16:47:36	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$812,660.83	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

CONVADI S.A. DE C.V.

 H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: GMJ 016C-OP/2021	HOJA DE RELACIÓN ESTIMACIÓN No. <u>1 (UNO)</u> PERÍODO DE TRABAJO:
	CONTRATISTA: CONVADI S.A. DE C.V.	HOJA No. 1 DE 1
	OBRA: "PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN	DEL: DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021
	UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL	FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2021

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.		P A R T I D A S				I M P O R T E S	
		LINEA DE IMPULSION A RED EXISTENTE 8" CERCA PERIMETRAL POZO CASETA DE CONTROL EN POZO ELECTRIFICACION Y SUBESTACION EXCEDENTES				\$	121,716.12 \$ 80,045.95 \$ 82,047.91 \$ 579,273.22 \$ 71,009.71
						\$	934,092.91
						\$	233,523.23
						\$	700,569.68
						\$	112,091.15
						\$	812,660.83
						\$	4,670.46
						\$	807,990.37
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A .		TOTAL		
ASIGNACIÓN		\$ 934,092.91	\$ 149,454.87	\$	1,083,547.78		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN		\$ 934,092.91	\$ 149,454.87	\$	1,083,547.78		
ACUMULADO ANTERIOR		\$ -	\$ -	\$	-		
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 934,092.91	\$ 149,454.87	\$	1,083,547.78		
SALDO POR EJERCER		\$ -	\$ -	\$	-		

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

OBRA : "PROYECTO DE ELTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE",
UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED
EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN

FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2021

[illegible]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

OBRA : "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE",
UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED
EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN

FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2021

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
8035 04	DE 115 MM. (6") DE DIAMETRO.	PZA	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$2,916.41	\$5,832.82	\$5,832.82	\$0.00	\$0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 CODOS DE 90° POR...											
CEA-1643	6" DE DIAMETRO.	PZA	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$291.61	\$583.22	\$583.22	\$0.00	\$0.00
2040 00	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE											
2040 02	DE 115 MM DE DIAMETRO.	ML	173.1800	0.0000	173.1800	173.1800	0.0000	\$10.10	\$1,749.12	\$1,749.12	\$0.00	\$0.00
2130 00	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE											
2130 01	FIERRO FUNDIDO	KG	169.6900	0.0000	169.6900	169.6900	0.0000	\$6.99	\$1,186.13	\$1,186.13	\$0.00	\$0.00
2160 00	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO											
2160 06	DE 115 MM. (6") DE DIAMETRO.	PZA	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$366.99	\$733.98	\$733.98	\$0.00	\$0.00
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....											
4030 04	DE F'C= 200 KG/CM2.	M3	0.2100	0.0000	0.2100	0.2100	0.0000	\$2,792.31	\$586.39	\$586.39	\$0.00	\$0.00
2240 00	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES....											
2240 03	TIPO 5 DE 1.40 x 1.20 M	PZA	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$10,837.37	\$21,674.74	\$21,674.74	\$0.00	\$0.00
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....											
2243 07	DOBLE DE 1.80 M. CON CANAL DE 100 MM. (4").	PZA	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$3,472.60	\$6,945.20	\$6,945.20	\$0.00	\$0.00
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE.....											
2244 02	FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 134 KG.	PZA	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$4,581.90	\$9,163.80	\$9,163.80	\$0.00	\$0.00
1004 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO											
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	4.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	\$22.43	\$89.72	\$89.72	\$0.00	\$0.00
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	150.0000	0.0000	150.0000	150.0000	0.0000	\$14.24	\$2,136.00	\$2,136.00	\$0.00	\$0.00
1060 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO....											
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M2	6.2800	0.0000	6.2800	6.2800	0.0000	\$144.22	\$905.70	\$905.70	\$0.00	\$0.00
4000 00	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON ..											
4000 02	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	16.5300	0.0000	16.5300	16.5300	0.0000	\$1,933.44	\$31,959.76	\$31,959.76	\$0.00	\$0.00
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....											
4030 04	DE F'C= 200 KG/CM2.	M3	1.2400	0.0000	1.2400	1.2400	0.0000	\$2,794.49	\$3,465.17	\$3,465.17	\$0.00	\$0.00
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..											
4080 02	DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS	M2	8.1000	0.0000	8.1000	8.1000	0.0000	\$226.80	\$1,837.08	\$1,837.08	\$0.00	\$0.00
4120 00	POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..											



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONVADI S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021

OBRA : "PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA : CONVADI S.A. DE C.V.

FECHA : 04 DE JUNIO DEL 2021

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
4120 05	POSTE GALVANIZADO 2.50 M ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.	PZA	19.0000	0.0000	19.0000	19.0000	0.0000	\$1,429.24	\$27,155.56	\$27,155.56	\$0.00	\$0.00
4120 06	TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR, O REF. HORIZONTAL	M	35.0000	0.0000	35.0000	35.0000	0.0000	\$121.02	\$4,235.70	\$4,235.70	\$0.00	\$0.00
4120 07	MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM CALIBRE 10.5 INCLUYE SOPORTERIA.	M2	70.0000	0.0000	70.0000	70.0000	0.0000	\$109.88	\$7,691.60	\$7,691.60	\$0.00	\$0.00
4122 00	REPISONES, POSTES PRECOLADOS Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...											
4122 06	ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12X 12 CON 4 PUAS CADA 76 MM INCLUYE COLOCACION	M	35.0000	0.0000	35.0000	35.0000	0.0000	\$9.70	\$339.50	\$339.50	\$0.00	\$0.00
9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...											
9000 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	6.2800	0.0000	6.2800	6.2800	0.0000	\$13.67	\$85.85	\$85.85	\$0.00	\$0.00
9002 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...											
9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3.KM	18.8400	0.0000	18.8400	18.8400	0.0000	\$7.66	\$144.31	\$144.31	\$0.00	\$0.00
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	9.50	0.0000	9.5000	9.5000	0.0000	\$ 14.37	\$136.52	\$136.52	\$0.00	\$0.00
1060 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO...											
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M2	2.96	0.0000	2.9600	2.9600	0.0000	\$ 144.22	\$426.89	\$426.89	\$0.00	\$0.00
4020 00	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 MT DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5...											
4020 01	DE 14CM DE ESPESOR	M2	34.80	0.0000	34.8000	34.8000	0.0000	\$ 352.92	\$12,281.62	\$12,281.62	\$0.00	\$0.00
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...											
4030 02	DE F'C= 150 KG/CM2.	M3	1.95	0.0000	1.9500	1.9500	0.0000	\$ 2,690.44	\$5,246.36	\$5,246.36	\$0.00	\$0.00
4030 04	DE F'C= 200 KG/CM2.	M3	0.51	0.0000	0.5100	0.5100	0.0000	\$ 2,794.51	\$1,425.20	\$1,425.20	\$0.00	\$0.00
4071 01	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO DE PISOS CON TEZONTLE O TEPÉTATE	M3	2.48	0.0000	2.4800	2.4800	0.0000	\$ 417.82	\$1,036.19	\$1,036.19	\$0.00	\$0.00
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...											
4080 02	DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS	M2	24.12	0.0000	24.1200	24.1200	0.0000	\$ 226.81	\$5,470.66	\$5,470.66	\$0.00	\$0.00
4080 04	LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA, HASTA 3.0 M	M2	9.80	0.0000	9.8000	9.8000	0.0000	\$ 286.46	\$2,807.31	\$2,807.31	\$0.00	\$0.00
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO	KG	194.00	0.0000	194.0000	194.0000	0.0000	\$ 26.16	\$5,075.04	\$5,075.04	\$0.00	\$0.00
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO)	KG	37.00	0.0000	37.0000	37.0000	0.0000	\$ 32.38	\$1,198.06	\$1,198.06	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONVADI S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021

OBRA : "PROYECTO DE ELTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE",
UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED
EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN

UBICACIÓN : CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA : CONVADI S.A. DE C.V.

FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2021

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
4100 00	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA											
4100 02	APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR	M	81.14	0.0000	81.1400	81.1400	0.0000	\$ 197.02	\$15,986.20	\$15,986.20	\$0.00	\$0.00
4100 06	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	M2	35.17	0.0000	35.1700	35.1700	0.0000	\$ 70.58	\$2,482.30	\$2,482.30	\$0.00	\$0.00
4130 00	ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA											
CEA-1553	COLOCACION DE TEJA DE BARRO ROJA DE 12x40X1.5 CM	M2	19.80	0.0000	19.8000	19.8000	0.0000	\$ 583.44	\$11,552.11	\$11,552.11	\$0.00	\$0.00
6010 00	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO											
6010 06	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO C/TUBERIA CONDUIT DE LAMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 1/2"DIAM	SAL	7.00	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	\$ 967.36	\$6,771.52	\$6,771.52	\$0.00	\$0.00
7001 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS..											
7001 01	DE HERRERIA ESTRUCTURAL, PERFILES ZT Y L TAMBOR	M2	3.92	0.0000	3.9200	3.9200	0.0000	\$ 1,246.78	\$4,887.38	\$4,887.38	\$0.00	\$0.00
7004 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA											
7004 01	VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS)	M2	88.19	0.0000	88.1900	88.1900	0.0000	\$ 51.86	\$4,573.53	\$4,573.53	\$0.00	\$0.00
7004 03	ESMALTE EN HERRERIA	M2	7.84	0.0000	7.8400	7.8400	0.0000	\$ 88.14	\$691.02	\$691.02	\$0.00	\$0.00
ELAT CAB ACSR 1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG.	77.00	0.0000	77.0000	77.0000	0.0000	\$ 477.14	\$36,739.78	\$36,739.78	\$0.00	\$0.00
ELAT ENT LIN ALI 3 AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE A LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, DE ACUERDO AL PROYECTO REVISADO Y APROBADO POR C.F.E. INCLUYE: UNA ESTRUCTURA RD-30, UNA ESTRUCTURA 3CF3B, UNA AMPLIACION DE ESTRUCTURA AD 20 A ESTRUCTURA AD30 MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 36,325.90	\$36,325.90	\$36,325.90	\$0.00	\$0.00
ELAT EST CONV TS20-T	CONVERSION DE ESTRUCTURA TS20 A ESTRUCTURA TS30 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 6,080.24	\$6,080.24	\$6,080.24	\$0.00	\$0.00
ELAT EST CONV RD2N-RD3N	CONVERSION DE ESTRUCTURA RD2N A ESTRUCTURA RD3N, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 6,550.44	\$6,550.44	\$6,550.44	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONVADI S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021

OBRA : "PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE",
UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED
EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN

UBICACIÓN : CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA : CONVADI S.A. DE C.V.

FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2021

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
ELAT CAB ACSR 1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG.	204.00	0.0000	204.0000	204.0000	0.0000	\$ 477.14	\$97,336.56	\$97,336.56	\$0.00	\$0.00
ELAT EST RD 3N	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 3N, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 17,167.27	\$17,167.27	\$17,167.27	\$0.00	\$0.00
ELAT EST AS 3N / AS 3	ESTRUCTURA AS3N /AS 3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	\$ 18,488.72	\$55,466.16	\$55,466.16	\$0.00	\$0.00
ELAT EST TS 3N	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 3N EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 14,664.01	\$14,664.01	\$14,664.01	\$0.00	\$0.00
ELAT POS PC 11 700	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-11-700, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	\$ 10,076.60	\$50,383.00	\$50,383.00	\$0.00	\$0.00
ELAT RET RSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	\$ 2,865.88	\$11,463.52	\$11,463.52	\$0.00	\$0.00
ELAT EST 3CF3B	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF3B, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZ.	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 19,288.34	\$19,288.34	\$19,288.34	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONVADI S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021

OBRA : "PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN

UBICACIÓN : CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA : CONVADI S.A. DE C.V.

FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2021

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
ELAT PRO TRA LIB	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES, APROBACIONES, UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXION.	PROY	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 71,266.13	\$71,266.13	\$71,266.13	\$0.00	\$0.00
ELAT MUR MED 150X200	MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m, CON MURO DE TABIQUE ROJO 7X14X28 DE 28 cm DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, DALAS, CASTILLOS, APLANADO POR AMBAS CARAS Y EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PROY	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 22,535.28	\$22,535.28	\$22,535.28	\$0.00	\$0.00
ELAT T 75KVA/23 KV/440	SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UN BANCO 1 TR 3 B, 75 KVA DE CAPACIDAD, 23 KV/440-254 V, UN POSTE DE CONCRETO 11-700, UNA PLATAFORMA "T3", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CONEX	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 134,006.59	\$134,006.59	\$134,006.59	\$0.00	\$0.00
TRIFAS1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, NCLUYE CABLEADO CAL. 8 Y 10, BASE DE WATIMETRO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 23,900.05	\$23,900.05	\$23,900.05	\$0.00	\$0.00
EXT3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SQUARE D PG 3F 3KVA 440-220/127	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 23,368.13	\$23,368.13	\$23,368.13	\$0.00	\$0.00
EXT4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 50W100-240V6500K	PZA	2.00	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$ 3,648.64	\$7,297.28	\$7,297.28	\$0.00	\$0.00
4120 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE MALLA GALVANIZADA DESPLEGABLE CAL. 10.55X55, DE 7.50 X 2.00M DE ALTURA, (DOS HOJAS DE 3.75 M DE ANCHO C/U) BASTIDORES E INTERMEDIO EN CADA PUERTA CON TUBO GALV. DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CANDADO No.25, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 16,444.25	\$16,444.25	\$16,444.25	\$0.00	\$0.00
								SUMA	\$ 934,092.90	\$ 934,092.90	\$	\$
								IVA	\$ 149,454.86	\$ 149,454.86	\$	\$
								TOTAL	\$ 1,083,547.77	\$ 1,083,547.77	\$	\$

ING. MARIO LÓPEZ ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


ING. HECTOR JESÚS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	1

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
001	TRAZO DE TERRENOS	CASETA		1	5.00	1.90			9.50	M2	9.50
									TOTAL		
002	EXCAVACIÓN A EN CEPAS PARA CIMENTACIÓN	CASETA	A-C	2	5.00	0.40	0.50		2.00	M3	2.96
			B-D-E	3	1.60	0.40	0.50		0.96		
									TOTAL		
003	MAMPOSTERÍA EN CIMIENTO DE PIEDRA PRAZA PARA CIMENTACIÓN	CASETA	A-C	2	5.00	0.40	1.00		4.00	M3	5.92
			B-D-E	3	1.60	0.40	1.00		1.92		
									TOTAL		
004	ANCLAJE DE CASTILLOS CON CONCRETO DE 40 X 50 CM EN CIMENTACIÓN	CASETA	A	3					3.00	PZA	6.00
			C	3					3.00		
									TOTAL		
005	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	CASETA	A	1	4.60				4.60	M	14.40
			B-D-E	3	1.60				4.80		
			C	1	5.00				5.00	M	18.42
									TOTAL		
006	CASTILLO DE 15 X 20 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	CASETA	A	2			3.13		6.26	M	18.42
				1			2.95		2.95		
			C	2			3.13		6.26	M	18.42
				1			2.95		2.95		
									TOTAL		
OBSERVACIONES VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ELABORO  ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA					AUTORIZO  ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA				




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	2

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
007	MURO DE TABIQUE DE BARRO DE 14 CM DE ESPESOR	CASETA	A	1	2.53		3.13	1.68	6.24		
				1	0.15		3.13		0.47		
				1	1.78		2.95	1.68	3.57		
				1	0.40		0.70		0.28		
				1	5.00		0.40	1.38	0.62		
			B	1	1.60		2.15	0.16	3.28		
			C	1	2.18		2.95	1.38	5.05		
				1	2.53		3.13		7.92		
				1	0.15		3.13		0.47		
			D	1	1.60		2.15	0.40	3.04		
			E	1	1.60		2.45		3.92		
									TOTAL	M2	34.86
008	DALA DE CORONACIÓN DE 15 X 20 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	CASETA	A	1	4.73				4.73		
			B-D-E	3	1.60				4.80		
			C	1	4.73				4.73		
									TOTAL	M	14.26
009	CERRAMIENTO DE 15 X 20 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	CASETA	A	1	2.15				2.15		
			B	1	1.60				1.60		
			D	1	1.60				1.60		
									TOTAL	M	5.35
010	VIGA IPS DE 4"	CASETA	B-D	2	2.20	11.46 KG/MT			50.42		
									TOTAL	KG	50.42
OBSERVACIONES VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ELABORO ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA					AUTORIZO ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA				




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	2

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL			
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal					
007	MURO DE TABIQUE DE BARRO DE 14 CM DE ESPESOR	CASETA	A	1	2.53		3.13	1.68	6.24	M2	34.86			
				1	0.15		3.13		0.47					
				1	1.78		2.95	1.68	3.57					
				1	0.40		0.70		0.28					
				1	5.00		0.40	1.38	0.62					
				B	1	1.60		2.15	0.16			3.28		
		C	1	2.18		2.95	1.38	5.05	M			14.26		
				2.53		3.13		7.92						
				0.15		3.13		0.47						
				D	1	1.60		2.15					0.40	3.04
				E	1	1.60		2.45					3.92	
				TOTAL										
008	DALA DE CORONACIÓN DE 15 X 20 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	CASETA	A	1	4.73			4.73	M	14.26				
				B-D-E	3	1.60					4.80			
				C	1	4.73					4.73			
				TOTAL										
009	CERRAMIENTO DE 15 X 20 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	CASETA	A	1	2.15			2.15	M	5.35				
				B	1	1.60					1.60			
				D	1	1.60					1.60			
				TOTAL										
010	VIGA IPS DE 4"	CASETA	B-D	2	2.20	11.46 KG/MT		50.42	KG	50.42				
				TOTAL										

OBSERVACIONES	ELABORO	AUTORIZO
VER CROQUIS DE UBICACIÓN	ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA	ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	2

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
011	BOVEDUKA DE JALCRETO PREFABRICADA	CASETA		2	2.20	1.60			7.04	M2	7.04
									TOTAL		
012	LECHADEADA DE CEMENTO GRIS	CASETA		2	2.20	1.60			7.04	M2	7.04
									TOTAL		
013	CAPA DE COMPRESIÓN EN BOVEDUKA	CASETA		2	2.20	1.60			7.04	M2	7.04
									TOTAL		
014	TEJA DE BARRO TIPO RANCHERA DE 50 CM	CASETA		2	2.30	1.60			7.36	M2	7.36
									TOTAL		
015	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	LOCAL 1		1	1.60	1.55	0.50		1.24	M3	
		LOCAL 2		1	1.60	1.55	0.50		1.24		
									TOTAL		2.48
016	FIRME DE 10 CM DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 ACABADO PULIDO	LOCAL 1		1	1.60	1.55			2.48	M2	
		LOCAL 2		1	1.60	1.55			2.48		
									TOTAL		4.96
017	SARPEADO DE BÓVEDAS CON MORTERO	LOCAL 1		1	1.60	1.55			2.48	M2	
		LOCAL 2		1	1.60	1.55			2.48		
									TOTAL		4.96
OBSERVACIONES		ELABORO					AUTORIZO				
VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA					ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA				




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	2



CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
018	APLANADO EN MUROS Y BÓVEDAS CON MORTERO	LOCAL 1	1	1	1.60		2.45		3.92	M2	81.14
		2	1	1.55		2.30		3.56			
		3	1	1.60		2.15	0.16	3.28			
		4	1	1.55		2.30	1.68	1.88			
		BOV	1	1.55	1.60		2.48				
		LOCAL 2	1	1	1.55		2.30	1.68	1.88		
		2	1	1.60		2.15	0.40	3.04			
		3	1	1.55		2.30		3.26			
		4	1	1.60		2.45		3.92			
		BOV	1	1.55	1.60		2.48				
		CASETA	A	1	2.53		3.13	1.68	6.24		
			1	0.15		3.13		0.47			
			1	1.78		2.95	1.68	3.57			
			1	0.40		0.70		0.28			
			1	5.00		0.40		2.00			
			B	2	0.75		3.53		5.29		
				2	0.15		3.53		1.06		
				1	1.60		3.53	0.16	5.49		
			BOV	1	1.60	0.40		0.64			
			C	1	2.18		3.53		7.70		
				1	2.53		3.53		8.93		
				1	0.15		3.53		0.53		
			D	1	0.40		3.53		1.41		
				1	1.60		3.23	0.40	4.79		
				1	0.40		0.60		2.40		
			BOV	1	1.60	0.40		0.64			
								TOTAL			
OBSERVACIONES		ELABORO				AUTORIZO					
VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA				ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA					




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	2

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
019	EMBOQUILLADOS EN MUROS Y BÓVEDAS HASTA 20 CM	CASETA	A	4	2.10				8.40		
				2	0.80				1.60		
				1	4.71				4.74		
				1	0.20				0.20		
			B	2	3.53				7.06		
				1	1.60				1.60		
				4	0.40				1.60		
			C	1	4.71				4.74		
				1	0.20				0.20		
			D	1	3.53				3.53		
				2	0.40				0.80		
				2	1.00				2.00		
				1	0.70				0.70		
				1	0.40				0.40		
				1	1.60				1.60		
									TOTAL	M	39.17
020	FABRICACIÓN DE HERRERÍA CON PERFILES CAL 18 TIPO PERSIANA	CASETA	A	2		0.80	2.10		3.36		
			B	1		0.40	0.40		0.16		
			D	1		1.00	0.40		0.40		
									TOTAL	M2	3.92
021	ESCALONES DE TABIQUE	CASETA	4	2	2.75				5.50		
									TOTAL	M	5.50
022	NIVELACIÓN DE MAMPOSTERIA EN CIMENTACIÓN	CASETA	A-C	2	5.00				10.00		
			B-D-E	3	1.60				4.80		
									TOTAL	M	14.80
OBSERVACIONES VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ELABORO  ING. MARIO LÓPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA				AUTORIZO  ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA					



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA


OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	2

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL		
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal				
023	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BÓVEDAS	LOCAL 1	1	1	1.60		2.45		3.92	M2	88.19		
			2	1	1.55		2.30		3.56				
			3	1	1.60		2.15	0.16	3.28				
			4	1	1.55		2.30	1.68	1.88				
		LOCAL 2	BOV	1	1.55	1.60			2.48				
			1	1	1.55		2.30	1.68	1.88				
			2	1	1.60		2.15	0.40	3.04				
			3	1	1.55		2.30		3.26				
		CASETA	4	1	1.60		2.45		3.92				
			BOV	1	1.55	1.60			2.48				
			A	1	2.53		3.13	1.68	6.24				
				1	0.15		3.13		0.47				
		BOQUILLAS		1	1.78		2.95	1.68	3.57				
				1	0.40		0.70		0.28				
				1	5.00		0.40		2.00				
			B	2	0.75		3.53		5.29				
		BOV		2	0.15		3.53		1.06				
				1	1.60		3.53	0.16	5.49				
				1	1.60	0.40			0.64				
			C	1	2.18		3.53		7.70				
		BOV		1	2.53		3.53		8.93				
				1	0.15		3.53		0.53				
			D	1	0.40		3.53		1.41				
				1	1.60		3.23	0.40	4.79				
		BOV		1	0.40		0.60		2.40				
				1	1.60	0.40			0.64				
					39.17	0.18			7.05				
									TOTAL				
		OBSERVACIONES		ELABORO			AUTORIZO						
		VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA			ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA						



OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
1005 01	LINEA DE CONDUCCION LIMPIEZA Y TRAZO				173.18	0.70			121.23	M2	6.10
1100 02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, ZONA B DE 0 A 6.00				173.18	0.90	0.40		62.34	M3	
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJA, EN SECO ZONA B, HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD,				173.18	0.90	0.75		116.90	M3	
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO,				173.18	0.50	0.10		8.66	M3	
1130 02	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO				173.18	0.90	0.90		140.28	M3	
	MENOS M3 TUBERIA				173.18	0.0177	AREA TUBO		3.07	M3	
									137.21	M3	
1100 02	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO,				173.18	0.90	0.40		62.34	M3	
					173.18	0.90	0.75		116.90	M3	
									179.24	M3	
1100 02	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO,				173.18	0.90	0.40		62.34	M3	
					173.18	0.90	0.75		116.90	M3	
									179.24	M3	
							3.00	KM	537.72	M3	
1005 01	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NOEMA NMX-E-145/1, L.A.B. FABRICA TUBERIA HID. ANº RD/26 DE 6" DE DIAMETRO				173.18				173.18	ML	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
1005 01	CERCO PERIMETRAL DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES	EJE A	HOR		10.00	0.50	0.20		1.00	M3	
		EJE A	VERT		15.00	0.50	0.20		1.50	M3	
		EJE A	VERT		15.00	0.50	0.20		1.50	M3	
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO								4.00	M3	
		EJE A			15.00	10.00			150.00	M3	
1005 01	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN	EJE A	HOR		10.00	0.50	0.30		1.50	M3	
		EJE 1	VERT		3.75	0.50	0.40		0.75	M3	
		EJE 1	VERT		3.75	0.50	0.35		0.66	M3	
		EJE 1	VERT		3.75	0.50	0.40		0.75	M3	
		EJE 1	VERT		3.75	0.50	0.25		0.47	M3	
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.25		0.47	M3	
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.30		0.56	M3	
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.30		0.56	M3	
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.30		0.56	M3	
									6.28	M3	
		EJE A	HOR		10.00	0.50	0.70		3.50	M3	
		EJE 1	VERT		3.75	0.50	0.85		1.59	M3	
		EJE 1	VERT		3.75	0.50	0.90		1.69	M3	
		EJE 1	VERT		3.75	0.50	1.05		1.97	M3	
1005 01	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS	EJE 1	VERT		3.75	0.50	1.15		2.16	M3	6.10
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.70		1.31	M3	
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.65		1.22	M3	
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.75		1.41	M3	
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.90		1.69	M3	
									16.53	M3	
		OBSERVACIONES VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ELABORO ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA					AUTORIZO ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA		



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

OBRA:	"PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN			UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO			PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.			FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021			HOJA	

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL	
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal			
1005 01	CERCO PERIMETRAL MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS	EJE A	HOR		10.00	0.50	0.08		0.40	M3		
		EJE 1	VERT		15.00	0.50	0.09		0.68	M3		
		EJE2	VERT		3.75	0.50	0.09		0.17	M3		
1005 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS								1.24	M3		
		EJE A	HOR	2	10.00		0.12		2.40	M2		
		EJE 1	VERT	1	15.00		0.12		1.80	M2		
1005 01	POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA POSTE GALVANIZADO 2.00 M ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIÁMETRO	EJE 1	VERT	1	15.00		0.07		1.05	M2		
		EJE2	VERT	1	15.00		0.12		1.80	M2		
		EJE2	VERT	1	15.00		0.07		1.05	M2		
										8.10	M2	
		EJE A	HOR	3					3.00	PZA		
		EJE 1	VERT	8					8.00	PZA		
		EJE2	VERT	8					8.00	PZA		
1005 01	POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE-DIAMETRO PARA BARRA SUPERIO								19.00	PZA		
		EJE A	HOR		5.00				5.00	ML		
		EJE1	VERT		15.00				15.00	ML		
1005 01	ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA MALLA GALVANIZADA	EJE2	VERT		15.00				15.00	ML		
										35.00	ML	
		EJE A	HOR		5.00		2.00		10.00	M2		
		EJE 1	VERT		15.00		2.00		30.00	M2		
		EJE2	VERT		15.00		2.00		30.00	M2		
										70.00	M2	
OBSERVACIONES VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ELABORO ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA				AUTORIZO ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA						




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA



CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
1005 01	BANQUETA EXTERIOR LIMPIEZA DESPALME , TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, TRAZANDO EJES,				4.60	0.60			2.76	M2	
									2.76	M3	
1005 01	LIMPIEZA DESPALME , TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, TRAZANDO EJES,				4.60	0.60	0.55		1.52	M3	
		MENOS REGISTRO			0.50	0.40	0.60		-0.12	M3	
									1.40	M3	
1005 01	PISO D ECONCRETO				4.60	0.60	0.55		2.76	M3	
		MENOS REGISTRO			0.50	0.40			-0.20	M3	
									2.56	M3	
1005 01	POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIO	EJE A	HOR		5.00				5.00	ML	
		EJE 1	VERT		15.00				15.00	ML	
		EJE2	VERT		15.00				15.00	ML	
									35.00	ML	
1005 01	ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA MALLA GALVANIZADA	EJE A	HOR		5.00		2.00		10.00	M2	
		EJE 1	VERT		15.00		2.00		30.00	M2	
		EJE2	VERT		15.00		2.00		30.00	M2	
									70.00	M2	
OBSERVACIONES VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ELABORO ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA					AUTORIZO ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA				




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.**

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
	EXCEDENTES										
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA,			1					1.00	PZA	
									1.00	PZA	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SQUARE D PG 3F 3KVA 440-220/127			1					1.00	PZA	
									1.00	PZA	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 50W100-240V6500K			2					2.00	PZA	
									2.00	PZA	
	PORTON DE MALLA GALVANIZADA DESPLEGABLE CAL. 10,55X55, DE 7.50 X 2.00M DE ALTURA			1					1.00	PZA	
									1.00	PZA	
OBSERVACIONES		ELABORO			AUTORIZO						
VER CROQUIS DE UBICACIÓN		 ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA			 ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA						




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.**

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 8", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
ELAT CAB ACSR 1/0	ALTA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	VER CROQUIS MARCADO N°1		KG	0.00	77.00	0.00		77.00		
ELAT ENT LIN ALI 3 AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE A LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, DE ACUERDO AL PROYECTO REVISADO Y APROBADO POR C.F.E. INCLUYE: UNA ESTRUCTURA RD-30, UNA POSTE DE CONCRETO Y UN CABLE DE ALUMINIO.	VER CROQUIS MARCADO N°7		1	0.00	0.00	0.00		1.00		
ELAT EST CONV TS20-T	CONVERSION DE ESTRUCTURA TS20 A ESTRUCTURA TS30 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	VER CROQUIS MARCADO N°4		1	0.00	0.00	0.00		1.00		
ELAT EST CONV RD2N-RD3N	CONVERSION DE ESTRUCTURA RD2N A ESTRUCTURA RD3N,	VER CROQUIS MARCADO N°5		1	0.00	0.00	0.00		1.00		
ELAT CAB ACSR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR 1/0,	VER CROQUIS MARCADO N°1		KG	0.00	204.00	0.00				
ELAT EST RD 3N	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 3N,	VER CROQUIS MARCADO N°2		1	0.00	0.00	0.00		1.00		
ELAT EST AS 3N	ESTRUCTURA AS3N /AS 3,	VER CROQUIS MARCADO N°3		3	0.00	0.00	0.00		3.00		
ELAT EST TS 3N	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 3N EN POSTE DE CONCRETO	VER CROQUIS MARCADO N°6		1	0.00	0.00	0.00		1.00		
ELAT POS PC 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-11-700,	VER CROQUIS MARCADO N°9		6	13.00	0.00	0.00		5.00		
ELAT RET RSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA,	VER CROQUIS MARCADO N°10		4	0.00	0.00			4.00		
ELAT EST 3CF3B	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF3B,	VER CROQUIS MARCADO N°8		1	0.00	0.00			1.00		
OBSERVACIONES VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ELABORO  ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA					AUTORIZO  ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA				



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

GENERADOR DE OBRA EJECUTADA

OBRA:	"PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO TERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE 3", CERCA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	1
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			MEDIDAS Y/O OPERACIONES					UNIDAD	TOTAL
		Local	Muro	Pza	Largo	Ancho	Alto	Descuentos	Subtotal		
ELAT PRO TRA LI	ALTA TENSION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES, APROBACIONES, UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXION.										
				1	0.00	0.00			1.00		
ELAT MUR MED 1	MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m, CON MURO DE TABIQUE ROJO 7X14X28 DE 28 cm DE ESPESOR,	VER CROQUIS MARCADO N°11		1	0.00	0.00			1.00		
ELAT T 75KVA23K	SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UN BANCO 1 TR 3 B, 75 KVA DE CAPACIDAD, 23-KV/440-254 V, UN POSTE DE CONCRETO 11-700, UNA PLATAFORMA "T3", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	VER CROQUIS MARCADO N°11			0.00	0.00			1.00		
OBSERVACIONES VER CROQUIS DE UBICACIÓN		ELABORO ING. MARIO LOPEZ E. SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA					AUTORIZO ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA				

LOGO
DEPENDENCIA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

MEMORIA FOTOGRAFICA

CASETA

TRAZO Y NEVELACION
EXCAVACION A MANO
DESPLANTE D EMUROS
DALA DE DESPLANTE
MUROS

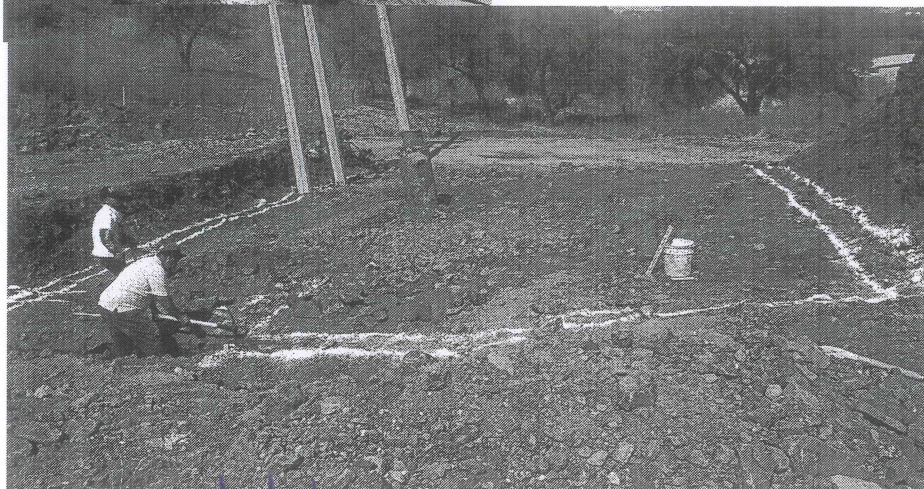

OBSERVACIONES

VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ELABORO

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

AUTORIZO

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA

LOGO
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

CASETA

DALAS DE CORONA

CASTILLO

BOVEDUCA

HORMIGON

APLANADOS

PUERTAS METALICAS



OBSERVACIONES

VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ELABORO

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

AUTORIZO

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA

LOGO
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

LÍNEA D EIPULSION

TRAZO
EXCAVACIO



INSTALACION DE PZAS ESPECIALES

VALVULA

TORNILLOS

JUNTA

EMPAQUE

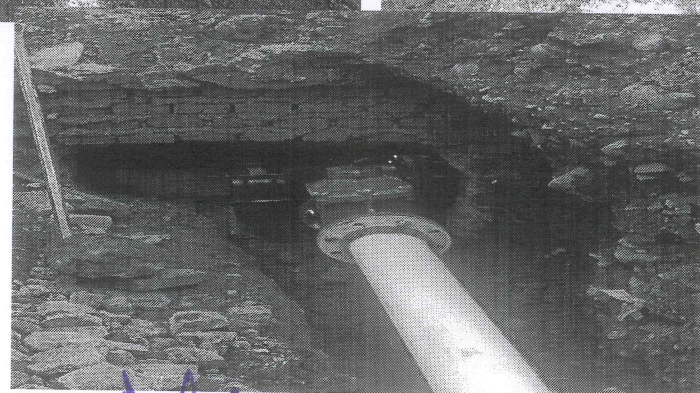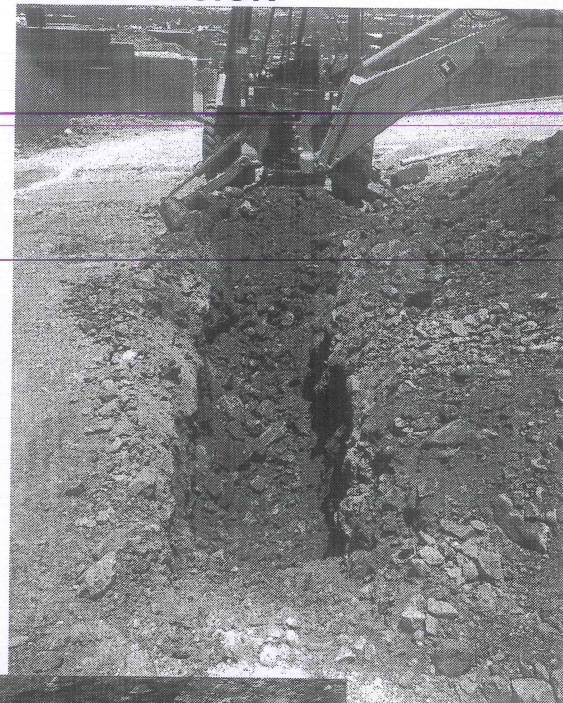

OBSERVACIONES

VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ELABORO

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

AUTORIZO

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA

LOGO
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

MEMORIA FOTOGRAFICA



OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

TRAZO
EXCAVACION

INSTALACION DE PZAS ESPECIALES
VALVULA
TORNILLOS
JUNTA
EMPAQUE

TEPETATE EN ZANJAS
COMPACTACION D EZANJAS

LINEA D EIPULSION

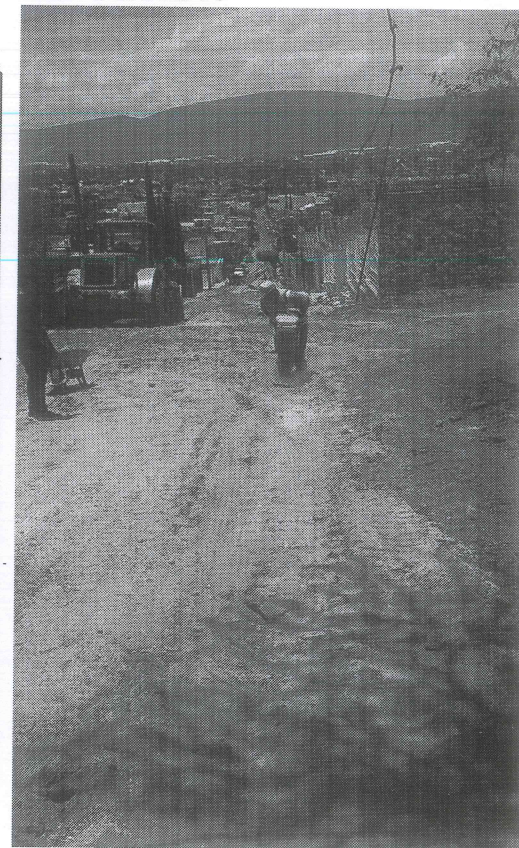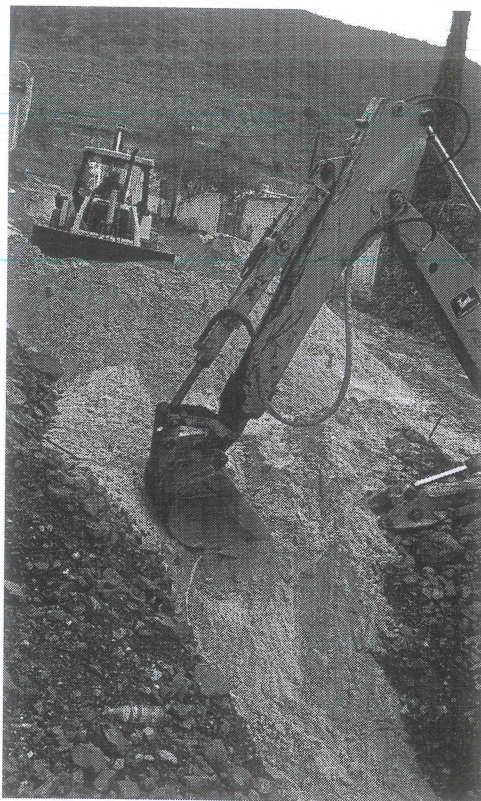

OBSERVACIONES

VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ELABORO

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

AUTORIZO

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA


LOGO
DEPENDENCIA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	"PROYECTO DE ELTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

LINEA D EIPULSION

ENCAMADO

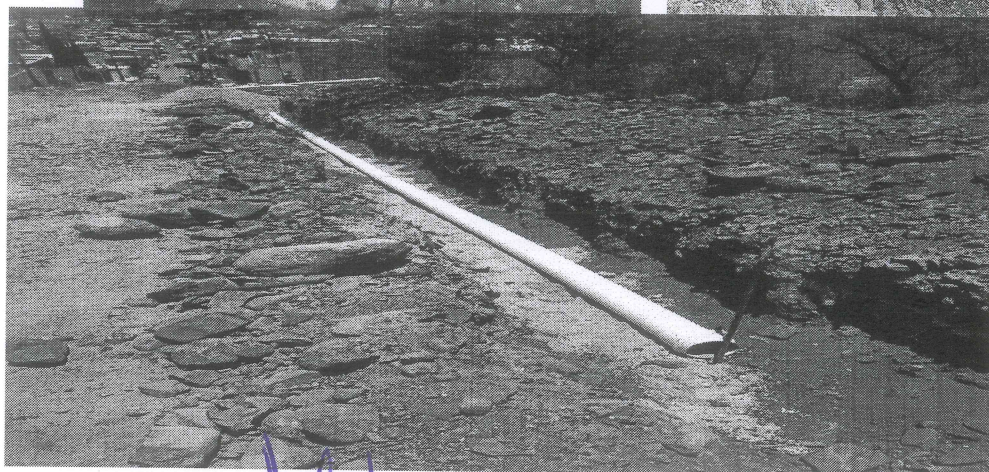

VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA

LOGO
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

MEMORIA FOTOGRAFICA


CERCADO PERIMETRAL

MAMPOSTEO DE MURO

POSTE GALV.

REPISON DE CONCRETO

MALLA CICLONICA

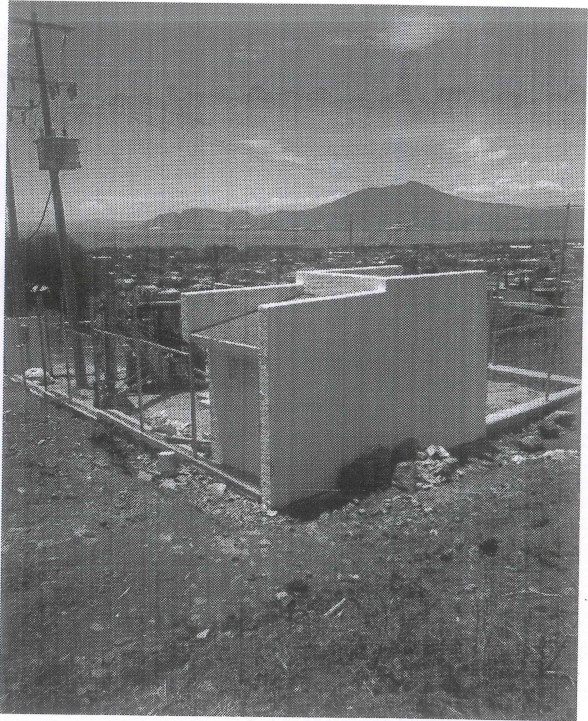

OBSERVACIONES

VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ELABORO

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

AUTORIZO

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA

LOGO
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	


CERCADO PERIMETRAL

MAMPOSTEO DE MURO

POSTE GALV.

REPISON DE CONCRETO

MALLA CICLONICA

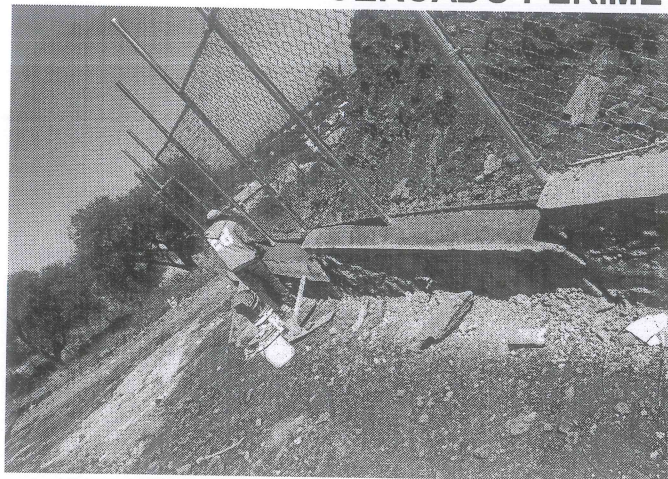

OBSERVACIONES

VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ELABORO

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

AUTORIZO

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA

LOGO
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	"PROYECTO DE ELTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

EXCEDENTE

ACOMETIDA ELECTRICA

PORTON D EINGRESO PRINCIPAL



OBSERVACIONES

VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ELABORO

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

AUTORIZO

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA








LOGO
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"PROYECTO DE ELCTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO, INCLUYE; LÍNEA DE IMPULSIÓN A RED EXISTENTE DE	UNIDAD	
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC JALISCO	PLANO	
CONTRATISTA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA	04/06/2021
PERIODO	DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2021	HOJA	

MEMORIA FOTOGRAFICA

ALTA TENSION

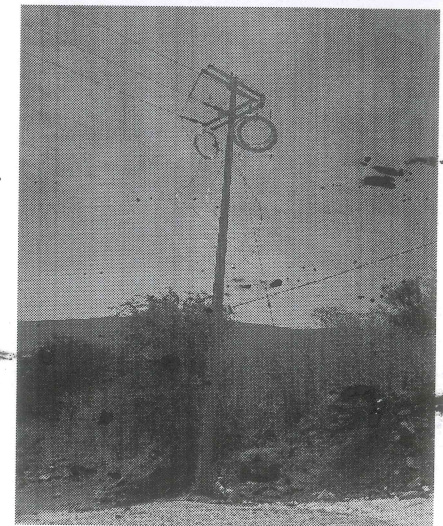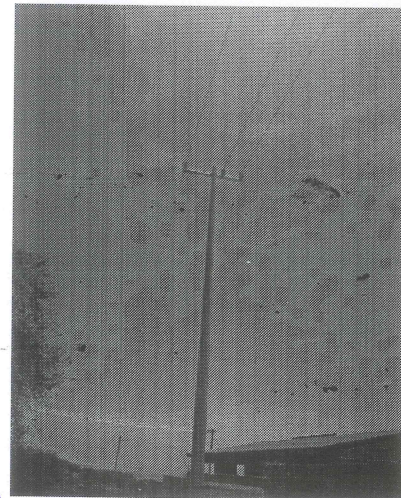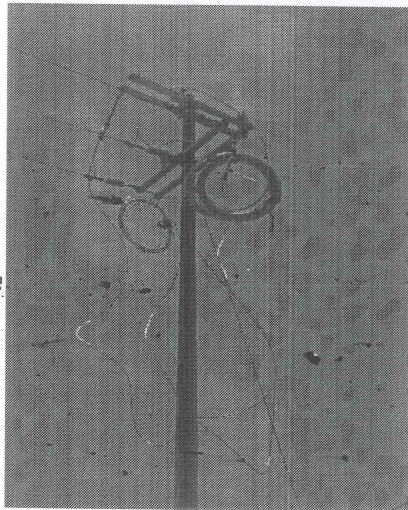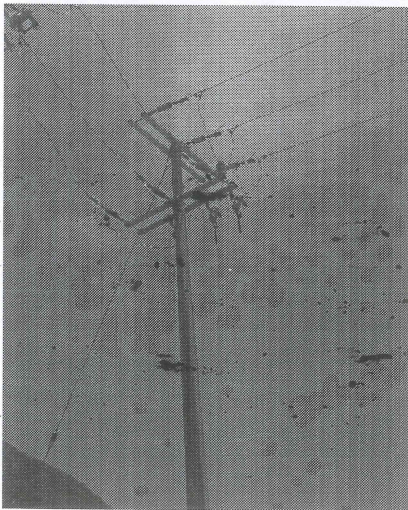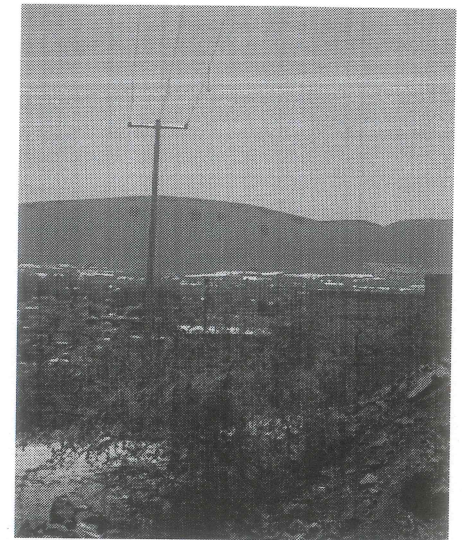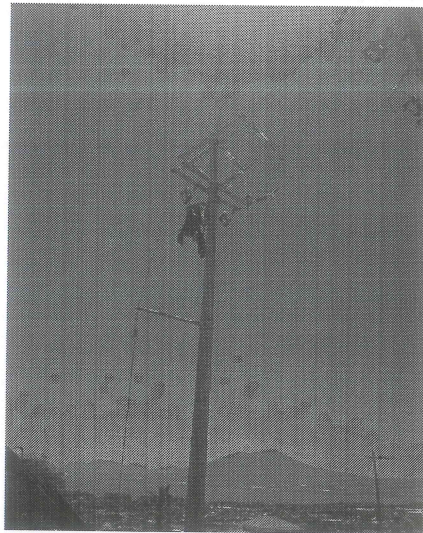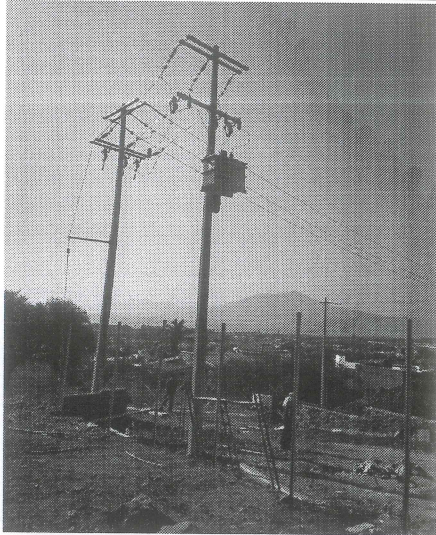

OBSERVACIONES
VER CROQUIS DE UBICACIÓN

ELABORO

ING. MARIO LOPEZ E.
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

AUTORIZO

ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA
RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA
