

Jocotepec
Gobierno Municipal

Dirección de Obras Públicas
Administración 2018-2021
Número de Oficio 988/2020

Jocotepec, Jal., a 26 de noviembre del 2020.

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a **CONVADI SA DE CV** por la cantidad de **\$ 459,141.11 (Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 11/100 M.N.)** Correspondiente a la **Estimación 03 y Finiquito** del siguiente proyecto;

Concepto:	Construcción de pozo profundo en calle allende norte
Localidad:	Cabecera Municipal
Programa:	Programa Ramo 33/2020
Codificación contable:	6132-2-25.1-050-280
Contrato:	GMJ 027C- OP/2020

Anexo:

1. Factura y CFDI
2. Estimación 03 y Finiquito
3. Minuta
4. Acta Entrega Recepción
5. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones
6. Fianzas
7. Formato D32 (SAT) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Nº. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL FACTURA	SUB TOTAL DE FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR PARA LA CONTRALORÍA	NETO A PAGAR
772	25/11/2020	\$ 461,128.74	\$ 397,524.77	\$ 1,987.62	\$ 459,141.11

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente

"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"

ING. HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CONVADI S.A DE C.V.

Factura: 775

Folio fiscal: FA271702-A513-4A34-9D61-C2DB54740934

RFC: CON1401236F7

Domicilio fiscal: COLON # 1401 A MODERNA, Guadalajara, Jalisco, México

CP de expedición: 44190



Cliente (RFC): MJJ850101KP8

Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Domicilio

PALACIO MUNICIPAL S/N C.P. 45800 Jocotepec Jalisco México

Clave y unidad SAT	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
72151900 - H87	1	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 03 ULTIMA (FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO No. CONTRATO GMJ 027C-OP/2020 FAIS RAMO33/2020, RETENCION 0.5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO \$ 1,987.62 NETO A PAGAR \$ 459,141.11	\$ 397,524.77	\$ 0.00	\$ 397,524.77
	IVA	Tasa: 16	Traslado	Federal	\$ 63603.96
	CINCOMILLAR	Tasa: 0.5	Retencion	Local	\$ 1987.62
				Subtotal:	\$ 397,524.77
				IVA Traslado:	\$ 63,603.96
				Impuestos locales retenidos:	\$ 1987.62
				Descuento:	\$ 0.00
				Total:	\$ 459,141.11

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

vQcfSNA Tw mGdAR54VJDrBnFBKMSDQORS9CKR9QxtvdKC40DMH+yRq7nCh5N7IVQdUXdTzsvTv3ZJlw xVLZhuSnHjp21pLa0rJGoWzYurqJ3RUsNbsdGXAp/5aRZd+ocPn8nR31z Q+qxjrbPaBEZlz2cqhbEgfsBSLQpmf6GvBKVdlxqzWCHdbpS9Co9n/b48m40F7Aa/GKvFZelDfUBoOVf9KUYkBlzqoOLsqUCTb6kZW27/dgagB1w3ZZJ4AMbeccIQRFefJuNBxhCqsKvZs bIEvpwkEJ0qFDUjr9qQumw+w+LkLZe16rJc7Wsuvo++4Tpmrfxu7a5Lg==

Cadena Original del Timbre:

||3.3|775|2020-12-07T08:57:00|27|00001000000409480578|397524.77||MxN459141.11||FUE44190|CON1401236F7|CONVADI S.A DE C.V. |601|MJJ850101KP8|MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO|01|72151900|1|H87|PAGO DE ESTIMACIÓN No. 03 ULTIMA (FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO No. CONTRATO GMJ 027C-OP/2020 FAIS RAMO33/2020, RETENCION 0.5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO \$ 1,987.62 NETO A PAGAR \$ 459,141.11|397524.77|397524.77|397524.77|002|Tasa|0.160000|63603.96|002|Tasa|0.160000|63603.96|63603.96|1.0|1987.62|0.00|CINCOMILLAR|0.01|1987.62||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fecha emisión: 07/12/2020 08:57:00 a. m	Fecha certificación: 07/12/2020 09:05:12 a. m	Tipo de comprobante: I - Ingreso
Regimen fiscal: 601 - General de ley personas morales	CSD emisor: 00001000000409480578	Forma de pago: 27 - A satisfacción del acreedor
Uso CFDI: 101 - Construcciones	CSD SAT: 00001000000505600468	Método de pago: FUE - Pago en una sola exhibición

Sello Digital SAT

gppMq1Im13JGg3bQQToaf4E9GQHmN0zs5RokBxKN/ukRdsR/cE/VJfUHeNV45qfC7T2I74VJ3mraqLZJYPBp6n is14qylgaS+Mc9TD/Z3D1yJ0QoE8Sio8cnDjNWPESJAN/3HB37oRdNHM6XNSYKU7sjinPaJ3coHSAUABysKAez DkYm6KNzs+w+n2slyuX5u8buro2T5pzYb7MMwVTlockw/SFxe61OL02uuqbmBVNn3ACJqqPN/OIC3KxywqKPG3 SQWV67Q/3n0AitMae910ZYCKr4IYg9s1KAXoDLAsVoyG8SD1y1/QEsPI0R7PRnV4D8uNiBe6uzGA==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CON1401236F7	CONVADI S.A DE C.V.	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA271702-A513-4A34-9D61-C2DB54740934	2020-12-07T08:57:00	2020-12-07T09:05:12	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$459,141.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx>



CONVADI S.A. DE C.V.

 <p>H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</p> <p>Jocotepec Gobierno Municipal</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</p>	<p>No. DE CONTRATO: JOCOTEPEC-OPM-CSS-027/2020</p>	<p>HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1</p>
	<p>CONTRATISTA: CONVADI S.A. DE C.V.</p>	<p>ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) y <i>Insiquito</i></p>
	<p>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</p>	<p>PERÍODO DE TRABAJO:</p>
	<p>UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL</p>	<p>DEL: 01/09/2020 AL 25/09/2020</p> <p>FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2020</p>

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES	
1 a 4	ESTAPA DE TERMINACIÓN Y PRUEBAS			\$	397,524.77
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 397,524.77
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0 %	
				SUBTOTAL	\$ 397,524.77
				I. V. A. 16%	\$ 63,603.96
				SUMA	\$ 461,128.74
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 1,987.62
				NETO A PAGAR	\$ 459,141.11
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL	
ASIGNACIÓN		\$ 2,267,778.98	\$ 362,844.64	\$ 2,630,623.62	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN		\$ 397,524.77	\$ 63,603.96	\$ 461,128.74	
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 1,871,211.58	\$ 299,393.85	\$ 2,170,605.43	
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 2,268,736.35	\$ 362,997.82	\$ 2,631,734.17	
SALDO POR EJERCER		-\$ 957.37	-\$ 153.18	-\$ 1,110.55	
<i>excedente</i>					
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO					
ANTICIPO %		\$ -	\$ -	\$ -	
AMORTIZACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -	
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.		\$ -	\$ -	\$ -	
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$ -	\$ -	\$ -	
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ -	\$ -	\$ -	
				EL REPRESENTANTE LEGAL	
				<i>[Signature]</i>	
				ING. MARIO LÓPEZ ELIZALDE	
				EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
				ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ	ING. HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONVADI S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) *y finiquito*
PERÍODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO
CONTRATISTA : CONVADI S.A. DE C.V.
FECHA : 02 DE OCTUBRE DEL 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
1	MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN, HASTA LOS PRIMEROS 15 KM	FLETE	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$13,072.80	\$26,145.60	\$0.00	\$26,145.60	\$0.00
2	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION, INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$8,548.58	\$8,548.58	\$0.00	\$8,548.58	\$0.00
3	EXCAVACIÓN DE FOSAS PARA LODOS, INCLUYE: AFINE DEL FONDO, EL SARPEO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE TALUDES DE EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$7,898.37	\$15,796.74	\$0.00	\$15,796.74	\$0.00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BENTONITA PARA PREPARACION DE FLUIDO, INCLUYE: LA PREPARACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	TON	10.0000	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000	\$4,849.45	\$48,494.50	\$0.00	\$48,494.50	\$0.00
5	SUMINISTRO DE AGUA PRIMER KM., INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	142.8600	142.8600	0.0000	142.8600	0.0000	\$77.35	\$11,050.22	\$0.00	\$11,050.22	\$0.00
6	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KM. SUBSECUENTES, INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3-KM	1,428.5700	1,428.5700	0.0000	1,428.5700	0.0000	\$7.53	\$10,757.13	\$0.00	\$10,757.13	\$0.00
7	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO DE 0 A 100 M. EN MATERIAL TIPO 1, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	ML	10.0000	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000	\$918.77	\$9,187.70	\$0.00	\$9,187.70	\$0.00
8	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO DE 0 A 100 M. EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	ML	50.0000	50.0000	0.0000	50.0000	0.0000	\$1,494.01	\$74,700.50	\$0.00	\$74,700.50	\$0.00
9	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO DE 0 A 100 M. EN MATERIAL TIPO 3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	ML	40.0000	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000	\$3,140.90	\$125,636.00	\$0.00	\$125,636.00	\$0.00
10	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO DE 100 A 200 M. EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	ML	30.0000	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000	\$1,572.85	\$47,185.50	\$0.00	\$47,185.50	\$0.00
11	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO DE 100 A 200 M. EN MATERIAL TIPO 3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	ML	70.0000	70.0000	0.0000	70.0000	0.0000	\$3,364.68	\$235,527.60	\$0.00	\$235,527.60	\$0.00



Alf

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONVADI S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

PERÍODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA : CONVADI S.A. DE C.V.

FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
12	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO DE 200 A 300 M. EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	ML	20.0000	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	\$1,605.74	\$32,114.80	\$0.00	\$32,114.80	\$0.00
13	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO DE 200 A 300 M. EN MATERIAL TIPO 3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	ML	30.0000	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000	\$3,461.08	\$103,832.40	\$0.00	\$103,832.40	\$0.00
14	REGISTRO ELECTRICO MULTIPARAMETROS P/PROFUNDIDADES HASTA DE 1000 M CON 10 CURVAS DE INFORMACION SP AUTOPOTENCIAL, GAMA, TEMPERATURA GRADIENTE CONTINUO, DELTA TEMPERATURA, RESISTIVIDAD 16, 64, LATERAL, RESISTENCIA, RESISTIVIDAD DE FLUIDO Y CONDUCTIVIDAD, TRASLADOS Y VIATICOS DE 2 TECNICOS ESPECIALIZADOS	LOTE	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$18,905.81	\$37,811.62	\$0.00	\$37,811.62	\$0.00
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BENTONITA PARA PREPARACION DE FLUIDO, INCLUYE: LA PREPARACIÓN, HARRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	TON	13.0000	13.0000	0.0000	13.0000	0.0000	\$4,849.45	\$63,042.85	\$0.00	\$63,042.85	\$0.00
16	SUMINISTRO DE AGUA PRIMER KM., INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	185.7100	185.7100	0.0000	185.7100	0.0000	\$77.35	\$14,364.67	\$0.00	\$14,364.67	\$0.00
17	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KM. SUBSECUENTES, INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3-KM	1,857.1400	1857.1400	0.0000	1,857.1400	0.0000	\$7.53	\$13,984.26	\$0.00	\$13,984.26	\$0.00
18	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12 1/4" A 18" 0 A 100 M MATERIAL TIPO 1	ML	10.0000	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000	\$744.89	\$7,448.90	\$0.00	\$7,448.90	\$0.00
19	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12 1/4" A 18" 0 A 100 M MATERIAL TIPO 2	ML	50.0000	50.0000	0.0000	50.0000	0.0000	\$1,186.09	\$59,304.50	\$0.00	\$59,304.50	\$0.00
20	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12 1/4" A 18" 0 A 100 M MATERIAL TIPO 3	ML	40.0000	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000	\$2,576.19	\$103,047.60	\$0.00	\$103,047.60	\$0.00
21	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12 1/4" A 18" 100 A 200 M MATERIAL TIPO 2	ML	30.0000	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000	\$1,483.98	\$44,519.40	\$0.00	\$44,519.40	\$0.00
22	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12 1/4" A 18" 100 A 200 M MATERIAL TIPO 3	ML	70.0000	70.0000	0.0000	70.0000	0.0000	\$2,689.22	\$188,245.40	\$0.00	\$188,245.40	\$0.00
23	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12 1/4" A 18" 200 A 300 M MATERIAL TIPO 2	ML	20.0000	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	\$1,537.39	\$30,747.80	\$0.00	\$30,747.80	\$0.00
24	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12 1/4" A 18" 200 A 300 M MATERIAL TIPO 3	ML	30.0000	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000	\$2,799.73	\$83,991.90	\$0.00	\$83,991.90	\$0.00
25	SUMINISTRO TRASLADO Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE TUBERIA LISA PARA ADEME DE 12" x 1/4"	ML	36.5000	36.5000	0.0000	36.5000	0.0000	\$1,603.41	\$58,524.47	\$0.00	\$58,524.47	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONVADI S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

PERÍODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA : CONVADI S.A. DE C.V.


FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
26	SUMINISTRO TRASLADO Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE TUBERIA RANURADA PARA ADEME DE 12" x 1/4"	ML	214.0000	214.0000	0.0000	214.0000	0.0000	\$1,808.43	\$387,004.02	\$0.00	\$387,004.02	\$0.00
27	SUMINISTRO TRASLADO Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE TUBERIA LISA PARA CONTRA-ADEME DE 20" x 1/4"	ML	12.0000	12.0000	0.0000	12.0000	0.0000	\$2,516.41	\$30,196.92	\$0.00	\$30,196.92	\$0.00
28	SOLDADURA CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO EN TUBERIA LISA O RANURADA DE 12" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	250.5000	0.0000	250.5000	250.5000	0.0000	\$103.99	\$26,049.50	\$26,049.50	\$0.00	\$0.00
29	SOLDADURA CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO EN TUBERIA LISA DE 20" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.0000	0.0000	12.0000	12.0000	0.0000	\$156.92	\$1,883.04	\$1,883.04	\$0.00	\$0.00
30	CEMENTACION DE ESPACIO ANULAR DE POZO POR GRAVEDAD, INCLUYE: APLICACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA	M3	1.7600	0.0000	1.7600	1.7600	0.0000	\$4,284.58	\$7,540.86	\$7,540.86	\$0.00	\$0.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA POZO DE 1/4 A 1/2", INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M3	23.9400	0.0000	23.9400	23.9400	0.0000	\$1,533.05	\$36,701.22	\$36,701.22	\$0.00	\$0.00
32	ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL 1RO., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3-KM	3,351.6000	0.0000	3469.2124	3,469.2124	-117.6124	\$8.14	\$27,282.02	\$28,239.39	\$0.00	-\$957.36
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	LTS	300.0000	0.0000	300.0000	300.0000	0.0000	\$66.76	\$20,028.00	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
34	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 18" A 26" O A 100 M MATERIAL TIPO 1	ML	12.0000	0.0000	12.0000	12.0000	0.0000	\$1,469.54	\$17,634.48	\$17,634.48	\$0.00	\$0.00
35	LAVADO DE POZO CON CIRCULACION DIRECTA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	HR	24.0000	0.0000	24.0000	24.0000	0.0000	\$2,182.61	\$52,382.64	\$52,382.64	\$0.00	\$0.00
36	EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO EN ESPERA DEL FRAGUADO Y REGISTRO ELECTRICO Ó POR INSTRUCCIONES DE LA CONAGUA O EL CLIENTE	HR	24.0000	0.0000	24.0000	24.0000	0.0000	\$1,061.13	\$25,467.12	\$25,467.12	\$0.00	\$0.00
37	DESARROLLO Y AFORO, BOMBA DE 6", 220 MTS DE COLUMNNA Y 24 HRS DE DURACION	LOTE	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$91,605.72	\$91,605.72	\$91,605.72	\$0.00	\$0.00
38	HORA EFECTIVA DE BOMBEO ADICIONALES A LAS 1eras 24 HR.	HR	24.0000	0.0000	24.0000	24.0000	0.0000	\$1,389.38	\$33,345.12	\$33,345.12	\$0.00	\$0.00
39	ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA DE ACUERDO A NORMA	LOTE	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$16,717.59	\$16,717.59	\$16,717.59	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONVADI S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

PERÍODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA : CONVADI S.A. DE C.V.

FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
40	LIMPIEZA Y RELLENO DE FOSAS DE LODOS BENTONITICOS INCLUYE: LA EXTRACCIÓN DE LODOS POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	\$19,965.05	\$39,930.10	\$39,930.10	\$0.00	\$0.00
								SUMA	\$ 2,267,778.99	\$ 397,524.77	\$ 1,871,211.59	-\$ 957.36
								IVA	\$ 362,844.64	\$ 63,603.96	\$ 299,393.85	-\$ 153.18
								TOTAL	\$ 2,630,623.63	\$ 461,128.74	\$ 2,170,605.43	-\$ 1,110.54

ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




ING. HECTOR JESUS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD: CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

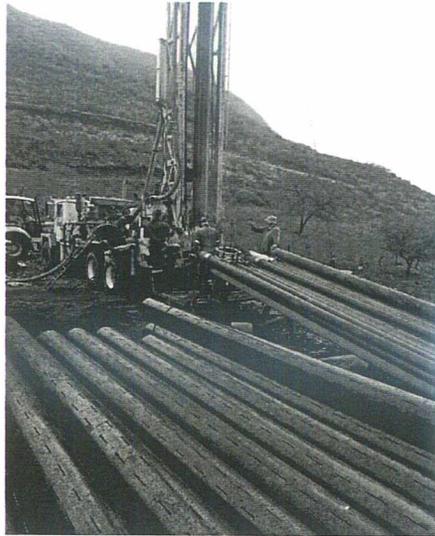NUMEROS GENERADORES							CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
28	SOLDADURA CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO EN TUBERIA LISA O RANURADA DE 12" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
ML		250.5000				250.5000	
					SUMA	250.5000	

TUBERIA LISA INSTALADA	36.50 MT
TUBERÍA RANURADA INSTALADA	214.00 MT
TOTAL	250.50 MT


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE BARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD: CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
29	SOLDADURA CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO EN TUBERIA LISA DE 20" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
ML		12.0000				12.0000
					SUMA	12.0000

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

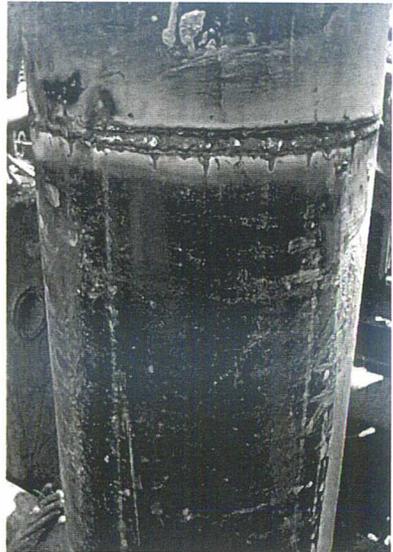

TUBERIA PARA CONTRA ADEME INSTALADA 12.00 MT


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD: CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES						
30	CEMENTACION DE ESPACIO ANULAR DE POZO POR GRAVEDAD, INCLUYE: APLICACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	M3	TOTAL
M3					1.7600	1.7600
					SUMA	1.7600

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES



CALCULO DEL VOLUMEN DE CEMENTACIÓN DEL POZO				
	DIAM EN PLG	PI	RADIO	AREA
AREA DE CIRC. TUBO	20	3.1416	0.254	0.2027
		PI	RADIO	AREA
AREA DE CIRC. PERF.	26	3.1416	0.3302	0.3425
CALCULO	PROF.	VOL. M3		DIF.
VOL DE CEMENTACIÓN EN M3	12	1.678		0.1399
		CON 5%		1.76


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES						
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA POZO DE 1/4 A 1/2", INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	M3	TOTAL
M3					23.9400	23.9400
					SUMA	23.9400

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

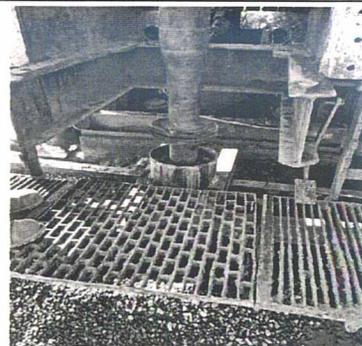

CALCULO DEL VOLUMEN DE GRAVA DEL POZO				
AREA DE CIRC. TUBO	DIAM EN PLG	PI	RADIO	AREA
	12	3.1416	0.1524	0.0730
AREA DE CIRC. PERF.	18	PI	RADIO	AREA
		3.1416	0.2286	0.1642
VOL DE GRAVA EN M3	CALCULO PROF.	VOL. M3		DIF.
	250	22.802		0.0912
	CON 5%		23.94	


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL



 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD: CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES						
32	ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL 1RO., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	KM	M3	TOTAL
M3-KM				144.9128	23.9400	3,469.2124
					SUMA	3,469.2124

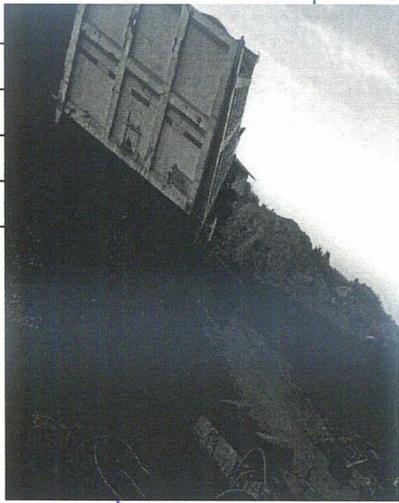


SE SUMINISTRARON 23.94 M3 DE GRAVA (HOJA 4)


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE BARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

TERMINO: POZO ALLENDE

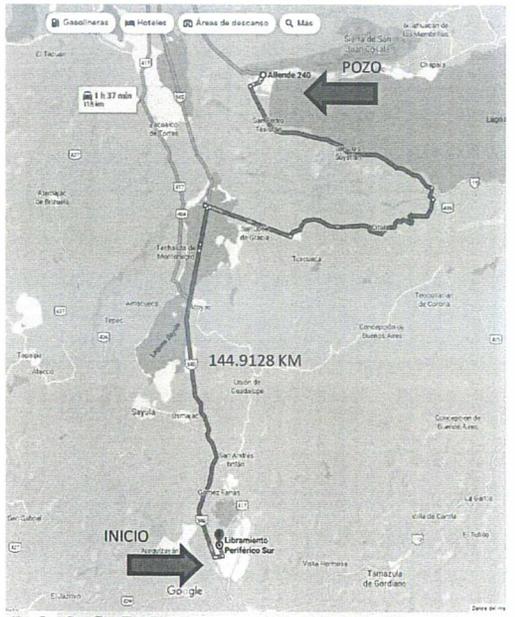


INICIO: LIBRAMIENTO SUR No. 341 ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.

GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES						
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.					CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	LT	TOTAL
LTS		250.0000			1.2000	300.0000
					SUMA	300.0000

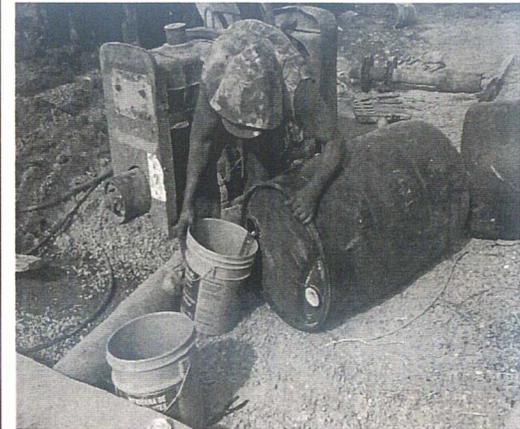

SE CONSIDERA UN RENDIMIENTO DE 1.20 LT POR METRO LINEAL DE EXCAVACIÓN




 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD: CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

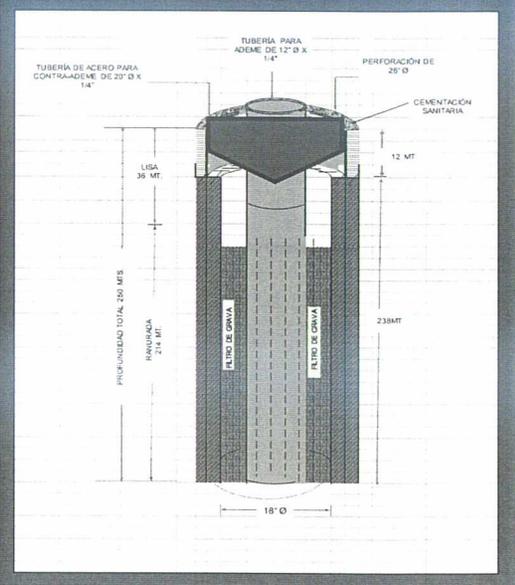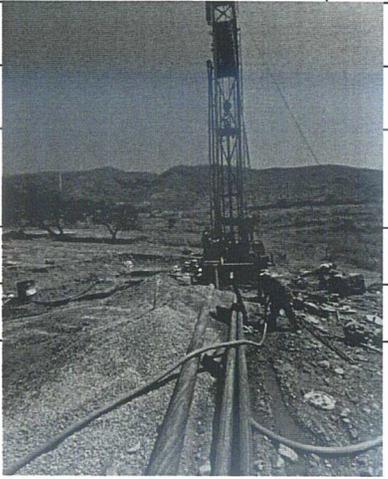NUMEROS GENERADORES							CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES	
34	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 18" A 26" O A 100 M MATERIAL TIPO 1							
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	KG/ML	ALTO	PZA	TOTAL	DISEÑO CONSTRUCTIVO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> CLIENTE: <u>H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</u> NOMBRE DEL POZO: <u>ALLENDE NORTE</u> UBICACIÓN: <u>JOCOTEPEC, JALISCO</u> FECHA: <u>5 DE AGOSTO DE 2020</u> </div> 	
ML				12.0000		12.0000		
						SUMA		12.0000


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES						
35	LAVADO DE POZO CON CIRCULACION DIRECTA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	HR	TOTAL
HR					24.0000	24.0000
					SUMA	24.0000




 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL



 ING. J. GUADALUPE BARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES						
36	EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO EN ESPERA DEL FRAGUADO Y REGISTRO ELECTRICO Ó POR INSTRUCCIONES DE LA CONAGUA O EL CLIENTE					CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	HR	TOTAL
HR					24.0000	24.0000
					SUMA	24.0000

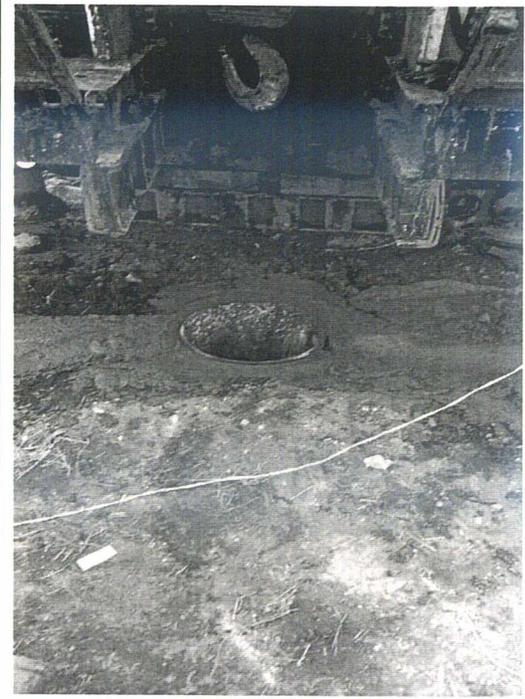


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL




 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES							CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
37	DESARROLLO Y AFORO, BOMBA DE 6", 220 MTS DE COLUMNA Y 24 HRS DE DURACION						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
LOTE					1.0000	1.0000	
					SUMA	1.0000	

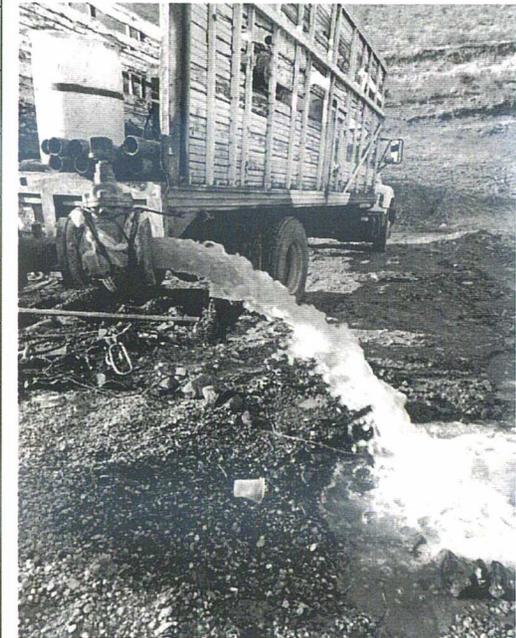


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES						
38	HORA EFECTIVA DE BOMBEO ADICIONALES A LAS 1eras 24 HR.					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	KG/ML	ALTO	HR	TOTAL
HR					24.00	24.0000
					SUMA	24.0000

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

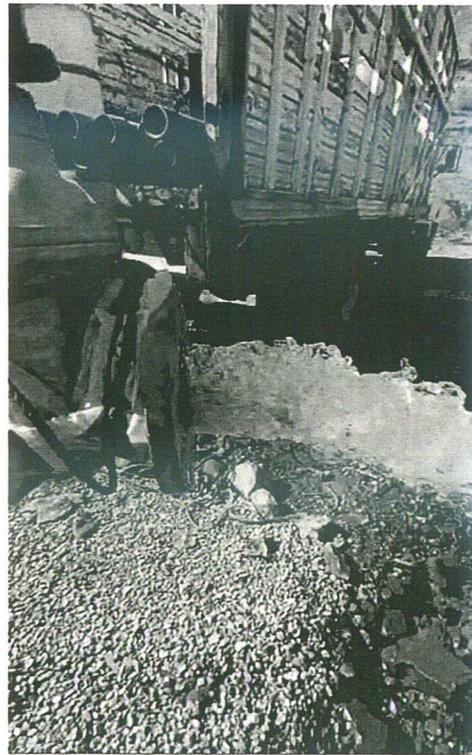


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE BARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES							CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
39	ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA DE ACUERDO A NORMA						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
LOTE					1.00	1.0000	
					SUMA	1.0000	


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE BARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

EMPRESA:	CONVADI S.A. DE C.V.	FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE ALLENDE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD: CABECRA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 01/09/2020 AL 25/09/2020

NUMEROS GENERADORES							
40	LIMPIEZA Y RELLENO DE FOSAS DE LODOS BENTONITICOS INCLUYE: LA EXTRACCIÓN DE LODOS POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES	
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
PZA					2.00	2.0000	
				SUMA	2.0000		


 ING. MARIO LOPEZ ELIZALDE
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





Hora actual: **14:24 Hrs**
Fecha actual: **15/12/2020**

Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: FRANCISCO DELGADILLO LIMON
 Contrato: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 080120940666
 Fecha de operación: 15/12/2020
 Hora de operación: 14:22 hrs
 Registros: 1
 Referencia del Lote: 992020121514222006P433
 Importe: 459141.11 MXN

Transferencias a enviar

[Exportar PDF](#)

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Sin Descripción Contrato	Estatus
15/12/2020	18000143324 - MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	030320900001974493 - CONVADI SA DE CV	factura 772 finiquito	\$ 459,141.11 MXN	992020121514222006P433	<input type="checkbox"/>	ENVIADA

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave de R.F.C.

20ND1567806

CON1401236F7

Nombre, Denominación o Razón social

CONVADI SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 20 de octubre de 2020, a las 11:01 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||CON1401236F7|20ND1567806|20-10-2020|P||0000108888800000031||



Sello Digital

Ct0ABczv+6tWgGMLy/YH4CNA/MwS2c0y4zL7E+xi9254bI/C7rRm8snXh5RoN+s+y1Rjau1TWf7TFCzw9k1v5kjmljtq
rj0YuBGZJUTPlozn/ziAAk4NQ7XXHy+GieWNLPSVscZ9tBheKwC2Fuk58j8KvOQp8j0pdu3XdqHPZPI=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

- 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
- 4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
- 5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
- 6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||CON1401236F7|20ND1567806|20-10-2020|P||00001088888800000031||



Sello Digital

Ct0ABczv+6tWgGMLy/YH4CNA/MwS2c0y4zL7E+xi9254bI/C7rRm8snXh5RoN+s+y1Rjau1TWf7TFCZw9k1v5kjmljtq
rj0YyBGZJUTPlozn/ziAAk4NQ7XXHy+GieWNLPsVscZ9tBheKwC2Fuk58j8KvOQp8j0pdu3XdqHPZPI=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
