



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 0366/2023

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$6,203.75 (Seis Mil Doscientos Tres Pesos 75/100 M.N.)** por concepto de Estimación 04 y Finiquito, del programa FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2022-correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6231-2-25.1-050-357

Contrato: GMJ 001C- OP/2023

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
18	19/05/2023	\$5,371.21	\$6,230.60	\$26.86	\$6,203.75

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 04 y Finiquito
4. Fianza de Cumplimiento
5. Fianza de Vicios Ocultos
6. Minuta de Término
7. Acta Entrega Recepción
8. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 19 DE MAYO DEL 2023
"2023, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Tú decides mejorar

C.c.p. Archivo
D.O.P./cvch

Hidalgo Sur No.6, Colonia Centro Jocotepec, Jalisco.
C.P. 45800 Telefonos: 01 (387) 76 3 19 19 / 76 3 00 74

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH

RFC: ETC220211Q32

Domicilio: MORELOS No. 67 No. Int D, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio
Fecha

- 18
19/5/2023 13:34:04

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141205 - Servicio de construcción de sistemas de drenaje	PAGO DE ESTIMACION NO.4 (CUATRO) FINIQUITO, RELATIVO A LA OBRA;"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO." MENOS \$ AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$26.86 MONTO EFECTIVO A PAGAR; \$ 6,203.75	5,371.21	0.00	002 - IVA - 859.39	5,371.21

Importe con letra:

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.

Subtotal 5,371.21
Impuestos Traslados 859.39
Total 6,230.60

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000515019517

Folio fiscal

6914875E-40A7-4B59-9DC4-C2388F5A725B

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Mayo 19 2023 - 13:34:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

i5/jRbOZcR/cpaxIWk4HLciksI+mL8wuyCheEN979BvvtGchVsSiZHx8q3jalpHMYcFJQ0HI+IHMURtM998cf
SMbVQcduK8NLCAfug1M2ibvCu+bHwfg2O8zEHNIrEZp0uWVvFi2JEUVOX9kUhrNxs2IAob7ULZyxnLSYsg7m9t
qX7z1a/DLQGSStQ09OIFlrqxUq6yBldTuBvELyaYaRG4zp36NqeO9kDeShwxd01xYumbPLbCnu46HioTshaaO4
Bw6e6lZlJym6cx3Sgi6QdoiU24Oc81/ULWEibejROvILEPiS1psuSPqmaV36GPT65KGWDSJxGz2IEYr02ew==

Sello del SAT

e3Y48fMPbVGSepPNJu2MdAqdnZwH52UEatEz7f6u80/EWtAF8kO8YquzgaeCkf9mCW6xN9gsUZlegZDh
FvivCemrXNY9irSF0KolrIYulrBoen0LzSEYj7cwfmqzqxNwEceDVIWltYeU/4dDz4tFHVpyFSGGorgk
2PfJYnDa98AOdf8f3r+3sz5wryQeVRMSl7YJWzGHlMDQuhJtG2yb612Xe9eGQeCxpTwlpTEd76kHfDn
CMKzPIGs5nLCCERvTIHaouvnZaPyp9+Dnya53aw8ERFkq99lxZe2JXV8PsnioDVHXishwPBsutrmzG+9
w8rcSQXLNLRQredxohWsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6914875E-40A7-4B59-9DC4-C2388F5A725B|2023-05-19T13:34:05|MAS0810247C0|I5/j
RbOZcR/cpaxIWk4HLciksI+mL8wuyCheEN979BvvtGchVsSiZHx8q3jalpHMYcFJQ0HI+IHMURtM998
cfSMbVQcduK8NLCAfug1M2ibvCu+bHwfg2O8zEHNIrEZp0uWVvFi2JEUVOX9kUhrNxs2IAob7ULZyxnL
SYsg7m9tqX7z1a/DLQGSStQ09OIFlrqxUq6yBldTuBvELyaYaRG4zp36NqeO9kDeShwxd01xYumbPLbC
nu46HioTshaaO4Bw6e6lZlJym6cx3Sgi6QdoiU24Oc81/ULWEibejROvILEPiS1psuSPqmaV36GPT65
KGWDSJxGz2IEYr02ew==|00001000000505142236||



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45800" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="6230.60" Moneda="MXN"
SubTotal="5371.21"
Certificado="MIIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTUwMTk1MTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRF
NoCertificado="00001000000515019517" FormaPago="03"
Sello="i5/jRbOZcR/cpaxIwK4HLciksI++mL8wuyCHeEN979BvvTGchVsSiZHx8q3jalpHMYcFJQ0Hi+IHMURtM998cfSMbVQcduK8NLCAFuglM2ibvCu+t
Fecha="2023-05-19T13:34:04" Folio="18" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor Nombre="EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH" Rfc="ETC220211Q32" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" Rfc="MJJ850101KP8" UsoCFDI="101" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="45800"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="5371.21" ValorUnitario="5371.21" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION NO.4 (CUATRO) FINIQUITO,
RELATIVO A LA OBRA;" CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSEFA
ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC,
JALISCO." MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$26.86 MONTO EFECTIVO A PAGAR; \$ 6,203.75" NoIdentificacion="SER03"
Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72141205">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="859.39" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5371.21"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="859.39">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="859.39" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5371.21"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="e3Y48fMPbVGSehPNJu2MdAqdnZwH52UEatEz7f6u80/EWtAF8kO8YquzgaeCkf9mCW6xN9gsUZlegZDhFvivCemrXNY9irSF0Kt
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="i5/jRbOZcR/cpaxIwK4HLciksI++mL8wuyCHeEN979BvvTGchVsSiZHx8q3jalpHMYcFJQ0Hi+IHMURtM998cfSMbVQcduK8NLC
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2023-05-19T13:34:05" UUID="6914875E-40A7-4B59-9DC4-C2388F5A725B"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ETC220211Q32	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6914875E-40A7-4B59-9DC4-C2388F5A725B	2023-05-19T13:34:04	2023-05-19T13:34:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,230.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



R.F.C. ETC220211Q32

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.
R.F.C. ETC220211Q32

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 4(CUATRO) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2023

OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILOSÓFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA : EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ												
A	DRENAJE											
A01	EXCAVACIONES											
ADS-D-EXC-01	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	161.65	161.65	0.00	161.65	-	\$13.28	\$2,146.71	\$0.00	\$2,146.71	\$0.00
ADS-D-EXC-03	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III. A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	147.10	147.10	0.00	147.10	-	\$160.40	\$23,594.84	\$0.00	\$23,594.84	\$0.00
ADS-D-EXC-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE	M3	147.10	147.10	0.00	147.10	-	\$79.76	\$11,732.70	\$0.00	\$11,732.70	\$0.00
ADS-D-EXC-05	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION	M2	113.16	113.16	0.00	113.16	-	\$20.80	\$2,353.73	\$0.00	\$2,353.73	\$0.00
Total:	EXCAVACIONES								\$39,827.98	\$0.00	\$39,827.98	\$0.00
A02	RELLENOS											
ADS-D-REL-01	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	113.16	113.16	0.00	113.16	-	\$98.39	\$11,133.81	\$0.00	\$11,133.81	\$0.00
ADS-D-REL-02	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	161.65	161.65	0.00	161.65	-	\$307.32	\$49,678.28	\$0.00	\$49,678.28	\$0.00
ADS-D-REL-03	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	79.21	79.21	0.00	79.21	-	\$757.40	\$59,993.65	\$0.00	\$59,993.65	\$0.00
Total:	RELLENOS								\$120,805.74	\$0.00	\$120,805.74	\$0.00
A03	INSTALACION DE TUBERIA											
ADS-D-IT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE	ML	161.65	161.65	0.00	161.65	-	\$691.33	\$111,753.49	\$0.00	\$111,753.49	\$0.00
ADS-D-IT-02	SUMINISTRO Y COLCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 10" X 6" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	23.00	23.00	0.00	23.00	-	\$3,399.21	\$78,181.83	\$0.00	\$78,181.83	\$0.00
ADS-D-IT-03	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=200 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	-	\$17,994.55	\$53,983.65	\$0.00	\$53,983.65	\$0.00
Total:	INSTALACION DE TUBERIA								\$243,918.97	\$0.00	\$243,918.97	\$0.00
B	AGUA POTABLE 3" Y 6"											
B01	EXCAVACIONES											
ADS-A-EXC-01	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	167.67	167.67	0.00			\$13.28	\$2,226.66	\$0.00	\$2,226.66	\$0.00
ADS-A-EXC-03	EXCAVACIONES EN CORTES EN MATERIAL TIPO II Y III, A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	234.74	234.74	0.00			\$60.40	\$37,652.30	\$0.00	\$37,652.30	\$0.00
ADS-A-EXC-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES.	M3	234.74	234.74	0.00			\$79.76	\$18,722.86	\$0.00	\$18,722.86	\$0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 4(CUATRO) FINIQUITO
 PERÍODO: DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2023
 OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILOSÓFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATISTA : EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
 FECHA: 07 DE ABRIL DE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
ADS-A-EXC-05	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION	M2	234.74	234.74	0.00	234.74	-	\$20.80	\$4,882.59	\$0.00	\$4,882.59	\$0.00
Total:	EXCAVACIONES								\$63,484.41	\$0.00	\$63,484.41	\$0.00
B02	RELLENOS											
ADS-A-REL-01	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISON.	M2	234.74	234.74	0.00	234.74	-	\$98.39	\$23,096.07	\$0.00	\$23,096.07	\$0.00
ADS-A-REL-02	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISON.	ML	335.34	335.34	0.00	335.34	-	\$307.32	\$103,056.69	\$0.00	\$103,056.69	\$0.00
ADS-A-REL-03	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISON.	M3	93.90	93.90	0.00	93.90	-	\$757.40	\$71,119.86	\$0.00	\$71,119.86	\$0.00
Total:	RELLENOS								\$197,272.62	\$0.00	\$197,272.62	\$0.00
B03	INSTALACION DE TUBERIA											
ADS-A-IT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 3" HIDRAULICO DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	167.67	167.67	0.00	167.67	-	\$188.03	\$31,526.99	\$0.00	\$31,526.99	\$0.00
ADS-A-IT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 3 A 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	23.00	23.00	0.00	23.00	-	\$2,144.06	\$49,313.38	\$0.00	\$49,313.38	\$0.00
ADS-A-IT-03	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	-	\$14,385.02	\$43,155.06	\$0.00	\$43,155.06	\$0.00
ADS-A-IT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 3"	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	-	\$808.25	\$808.25	\$0.00	\$808.25	\$0.00
ADS-A-IT-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" DE DIAMETRO, DE Fo. Fo., INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	-	\$5,897.85	\$17,693.55	\$0.00	\$17,693.55	\$0.00
ADS-A-IT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	-	\$5,529.48	\$16,588.44	\$0.00	\$16,588.44	\$0.00
ADS-A-IT-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 6" DE DIAMETRO DE 40 CM. DE LARGO DE Fo.Fo., INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	-	\$3,502.76	\$10,508.28	\$0.00	\$10,508.28	\$0.00
ADS-A-IT-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO DE FO.FO. INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	-	\$9,034.85	\$27,104.55	\$0.00	\$27,104.55	\$0.00
ADS-A-IT-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	-	\$1,516.03	\$6,064.12	\$0.00	\$6,064.12	\$0.00
ADS-A-IT-10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	167.67	167.67	0.00	167.67	-	\$946.12	\$158,635.94	\$0.00	\$158,635.94	\$0.00
ADS-A-IT-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	-	\$4,900.10	\$4,900.10	\$0.00	\$4,900.10	\$0.00
ADS-A-IT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45° POR 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$3,521.59	\$7,043.18	\$0.00	\$7,043.18	\$0.00




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 4(CUATRO) FINIQUITO
PERÍODO: DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2023
OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILOSÓFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA : EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
FECHA: 07 DE ABRIL DE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
ADS-A-IT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 6" A 3" DE DIAMETRO, DE Fo. Fo., INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	-	\$5,371.21	\$5,371.21	\$5,371.21	\$0.00	\$0.00
Total:	INSTALACION DE TUBERIA								\$378,713.05	\$5,371.21	\$373,341.84	\$0.00
								SUMA	\$ 1,044,022.77	\$ 5,371.21	\$ 1,038,651.56	\$ -
								IVA	\$ 167,043.64	\$ 859.39	\$ 166,184.25	\$ -
								TOTAL	\$ 1,211,066.41	\$ 6,230.60	\$ 1,204,835.81	\$ -
 EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL  DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA SUPERVISOR DEL MUNICIPIO  IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS												



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA:

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA:

07 DE ABRIL DE 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDANA HASTA LA CALLE FILOSOFOS, ETAPA 1.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 4(CUATRO) FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1

ADS-A-IT-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 6" A 3" DE DIAMETRO, DE Fo. Fo., INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS.

UNIDAD

CADENAMIENTO

LARGO

ANCHO

ALTURA
PROM

PZA

TOTAL

PZA

0+253.35

0+420.50

1.00

1.00

LINEA DE AGUA POTABLE
CRUCE EN CALLE FILOSOFOS

SUMA

1.00

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA:

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA:

07 DE ABRIL DE 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDANA HASTA LA CALLE FILOSOFOS, ETAPA 1.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 4(CUATRO) FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1

ADS-A-IT-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 6" A 3" DE DIAMETRO, DE Fo. Fo., INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA



REDUCCION

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA:

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA:

07 DE ABRIL DE 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDANA HASTA LA CALLE FILOSOFOS, ETAPA 1.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 4(CUATRO) FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1

ADS-A-IT-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 6" A 3" DE DIAMETRO, DE Fo. Fo., INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

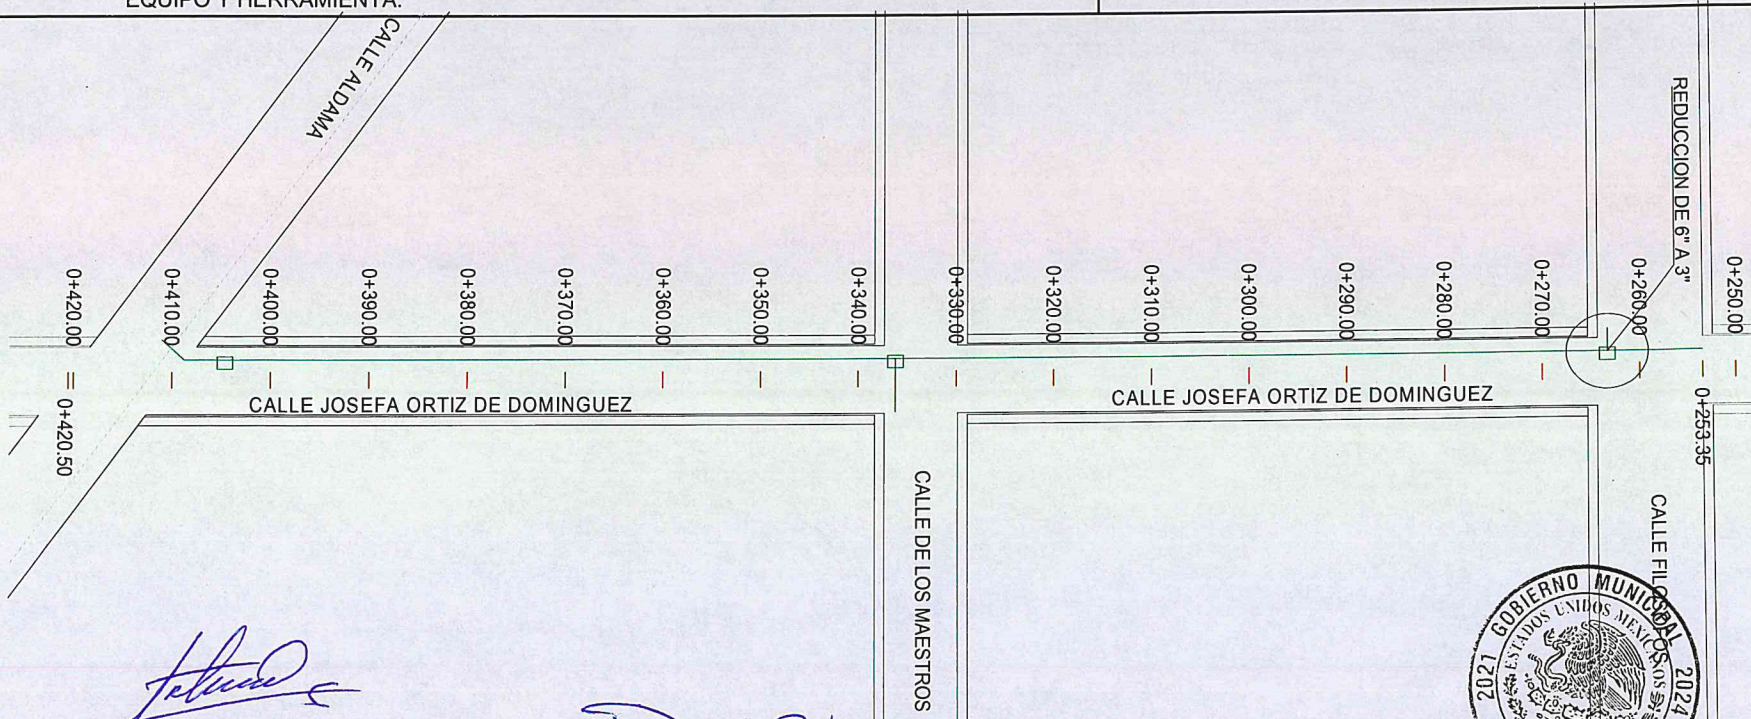

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
