

URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE

Lugar de Expedición: 44270
 AV. NORMALISTAS No. 464 No. Int 9
 Cofinas de La Normal Guadalajara Jalisco, México
 R.F.C. UPM1608305A4
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL

EBF766CA-EC0E-4E5C-AC38-2560E758E85E

CLIENTE: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	FECHA
PALACIO MUNICIPAL No. S/N C.P. 45800	18/10/2023 17:53:25
Jocotepec Jalisco, México	
R.F.C.: MJJ850101KP8 Teléfono:	Factura
Uso CFDI: I01 - Construcciones	- 455
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	72101500	72101500 -	* PAGO DE ESTIMACION 04 FINIQUITO DE LA OBRA COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, No. DE CONTRATO: GMJ 004-OP/2023 RETENCION DEL 005 AL MILLAR, \$569.88 NETO A PAGAR: \$30,268.58	26,584.88	0.00	002 - IVA - 4,253.58	26,584.88

Importe con letra
 TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.
 FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 METODO DE PAGO:
 PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:	26,584.88
IMPUESTOS TRASLADADOS:	4,253.58
TOTAL:	30,838.46

Tipo de relación: -
 CFDI Relacionado:

Cadena original del complemento de certificación del SAT: [1,1]EBF766CA-EC0E-4E5C-AC38-2560E758E85E2023-10-18T17:53:29[MAS0810247C0]eIn9 J3G6Z713XA0z9GCS03LmgRdCD0YXWXLJJo2zG08KkPka2KpMNGICNnQEEep21dFB7JZM4TUP PPKNhpK7WkF2vcANuP7M2vWWhx1Fv0KGM7YDq8HEHkYKQz2NWRYLKdWInveSige3WBSGfY UFDTFE040mNUBIMULJLJAJOs+HR9dCCUzG6sTP2Sm4dD95wZJayUYrx1EwN08U4PcWkM3y5d7 M6ZgdRAzmgbQAGBmfFdcqchmQSZz5vJk4Mz9IMVdxUeBnd7ZLJUGSKWVppvProcyY8xWUNz0 NEYVJJDs8uVzmEwA==[00001000000505142236]	Serie del Certificado del emisor: 00001000000505365187
Señe digital CFDI: eHNSJGc13X0UzGCS03LmgRdCD0YXWXLJJo2zG08KkPka2KpMNGICNnQEEep21dFB7JZM4TUP KNHjK7WkF2vcANuP7M2vWWhx1Fv0KGM7YDq8HEHkYKQz2NWRYLKdWInveSige3WBSGfYUFDTFE04 0mNUBIMULJLJAJOs+HR9dCCUzG6sTP2Sm4dD95wZJayUYrx1EwN08U4PcWkM3y5d7M6ZgdRAzmgbQA GBm7fdqchmQSZz5vJk4Mz9IMVdxUeBnd7ZLJUGSKWVppvProcyY8xWUNz08YVJDXS8uVzmEwA==	No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Señe del SAT: 07JdDQIkJGah2FG9aw1oyPDNhXZPXWouRiCBvqYqKADQ85mUJUBAPhGv9H3Pqg3HFTeVeMv4 S4j/Sku8iGaYXJS9H7I0h257grRcTX9WcX8H4Op3nOHgV4DyLus1aXzefkq7E2wmpBcUM4g paVsu8YB3G54JhyW0KNRafvqgkLsE8xMmodwnlpASNf0eYe7aUG7meuCFVWusf8poco24UQ p7DVk7dx9yc3Lce99Y5dfm85Gic32kR2InWuK1Wk3+QYsQqIad0RU152PT35JZZZFRsod9G VRpSbSPs1RDaE73dEXqOg==	Fecha y hora de certificación: Octubre 18 2023 - 17:53:29



DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.
 El Octubre 18 2023 LA CANTIDAD DE \$ 30,838.46 TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.
 VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION.

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER
 PAGARE OBLIGADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS DE NO VERIFICARSE EL
 PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES AL _____ % MENSUAL.

Firma de Conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UPM1608305A4	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EBF766CA-EC0E-4E5C-AC38-2560E758E85E	2023-10-18T17:53:25	2023-10-18T17:53:29	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$30,838.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES H.
AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

No. DE CONCURSO: GMJ 004- OP/2023

**CONTRATISTA: URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA
MONLE SA. DE CV.**



OBRA: "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA)

UBICACIÓN:
CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE
CUAUHTÉMOC EL CHANTE

ESTIMACIÓN No. 4 CUATRO FINIQUITO

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 30 DE JUNIO AL
04 DE JULIO DEL 2023

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTE	
1	TREN DE DESCARGA Y BOMBEO			\$	28,372.50
2	PRELIMINARES			\$	-
3	CIMENTACIÓN			\$	1,323.30
6	ALBAÑILERÍA			\$	1,009.89
7	ACABADOS			\$	-
8	HERRERIA			\$	71,618.35
9	COMPLEMENTARIOS			\$	-
10	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO			\$	11,652.00
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 113,976.04
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	\$ 87,391.16
				SUBTOTAL	\$ 26,584.88
				I. V. A. 16%	\$ 4,253.58
				SUMA	\$ 30,838.46
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 569.88
				NETO A PAGAR	\$ 30,268.58
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:	
ASIGNACIÓN	\$	1,031,290.14	\$ 165,006.42	\$	1,196,296.56
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$	113,976.04	\$ 18,236.17	\$	132,212.21
ACUMULADO ANTERIOR	\$	739,995.23	\$ 118,399.24	\$	858,394.47
ACUMULADO A LA FECHA	\$	853,971.27	\$ 136,635.40	\$	990,606.67
SALDO POR CANCELAR	\$	177,318.87	\$ 28,371.02	\$	205,689.89
ATICIPO					
ANTICIPO %	\$	309,387.03	\$ 49,501.92	\$	358,888.95
AMORTIZACIÓN	\$	87,391.16	\$ 13,982.59	\$	101,373.75
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$	221,995.87	\$ 35,519.34	\$	257,515.21
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$	309,387.03	\$ 49,501.92	\$	358,888.95
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$	-	\$ -	\$	-
			RESIDENTE DE OBRA		CONTRATISTA
			 ARQ. PABLO CESAR LARIOS		 URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.
			SUPERVISOR DE OBRA POR EL MUNICIPIO		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
			 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. GUADALUPE BARRA RAMIREZ		 C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACION: 4 CUATRO PINKUITO NO. DE CONCURSO: 310 001-01222

OBRA: PERÍODO DE TRABAJO: DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023

"COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA)


UBICACIÓN : UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE

CONTRATISTA : CONTRATISTA: URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
TREN DE DESCARGA Y BOMBEO												
1	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 15LPS P/40HP AC 6" DES 3	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$67,400.00	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00
2	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE 50HP MARCA ALTAMIRA SERIE X AC 6" DES 3	ML	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00
3	COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4"X 6.4 METROS CED. 40 CON ROSCAS Y COPLÉ	PZA	35.00	28.00	0.00	28.00	7.00	4,927.85	172,474.75	0.00	137,979.80	34,494.95
4	CABLE PLANO SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 4 AWG	ML	250.00	182.50	14.00	196.50	53.50	299.75	74,937.50	4,196.50	54,704.38	16,036.63
5	POLIDUCTO DE 3/4" PARA CABLE DE SONDEO	ML	220.00	182.50	0.00	182.50	37.50	8.42	1,852.40	0.00	1,536.65	315.75
6	TABLERO DE CONTROL TIPO PD-FC-37KW-460V- GD-IP55 ARMADO EN GABINETE METALICO PARA AUTOMATIZACION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: VARIADOR DE 1 FRECUENCIA DE 37 KW 73 AMPERES, ESPECIAL PARA BOMBEO DE AGUA SERIE AQUA DRIVE FC202 CON TARJETA DE TIEMPO REAL, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SUPRESOR DE PICOS, FUSIBLES ULTRARAPIDOS, VENTILACION FORZADA (POSITIVO Y NEGATIVO).	PZA	1.00	0.80	0.20	1.00	0.00	120,880.00	120,880.00	24,176.00	96,704.00	0.00
7	CABEZAL DE DESCARGA DE 4" CON TERMINACION EN CODO BRIDADO DE 4" CON PLACA DE 18 X 18" REFORZADA CON CARTABONES Y PASO PARA EL CABLE SUMERGIBLE Y PARA LA MANGUERA DE NIVELES	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	12,550.76	12,550.76	0.00	12,550.76	0.00
8	TREN DE DESCARGA CONFORME A EL DIBUJO CON MEDIDOR DE FLUJO DE PROPELA	PZA	1.00	0.80	0.00	0.80	0.20	59,406.40	59,406.40	0.00	47,525.12	11,881.28
9	MANIOBRA DE INSTALACION E A 180 METROS DE PROFUNDIDAD	MANIOBRA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	25,300.01	25,300.01	0.00	25,300.01	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE TREN DE DESCARGA Y BOMBEO									624,201.82	28,372.50		
PRELIMINARES												
10	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	\$ 8.95	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
11	DESPALME DE 20 CM DE ESPESOR DE TERRENO VEGETAL A MANO, INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	\$ 23.49	939.60	0.00	0.00	939.60
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE PRELIMINARES									2,729.60	0.00		
CIMENTACION												
12	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -1.50 M, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	45.73	57.50	0.00	57.50	-11.77	\$ 54.97	2,513.78	0.00	3,160.78	647.00
13	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	45.73	74.71	0.00	74.71	-44.58	\$ 176.68	8,079.58	0.00	13,199.76	7,676.39




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signatures and initials]

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
14	CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE 0.60 M. DE BASE POR 2.00 M. DE ALTURA Y 0.30 M. DE CORONA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	65.33	43.76	0.00	43.76	21.57	\$ 946.29	61,821.13	0.00	41,409.65	20,411.48
15	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15-15-4 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	8.00	0.00	8.00	2.00	\$ 451.46	4,514.60	0.00	3,611.68	902.92
16	SILLETA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 50X50 CM. PARA SOPORTE DEL TREN DE DESCARGA, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DOBLES DEL NO. 3 (3/8") @ 20 CM. AL CENTRO Y @ 10 CM. EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.50	0.50	1.00	0.00	\$ 2,646.60	2,646.60	1,323.30	1,323.30	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CIMENTACION									79,575.69	1,323.30		
ALBAÑILERIA												
17	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE BLOCK SOLIDO DE CONCRETO DE 11X14X28 CM., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	31.36	43.79	0.00	45.47	-11.43	\$ 412.20	12,926.59	0.00	18,050.24	-4,711.45
18	MURO PARA EL MEDIDOR DE CFÉ DE 14 CM. DE ESPESOR DE BLOCK SOLIDO DE CONCRETO DE 11X14X28 CM., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APLANADO APALILLADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	\$ 412.20	1,009.89	1,009.89	0.00	0.00
19	CADENA DE 15X20 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	35.30	90.10	0.00	93.62	-54.80	\$ 254.39	8,979.97	0.00	22,920.54	-13,940.57
20	CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	22.50	18.40	0.00	18.40	4.10	\$ 246.53	5,546.93	0.00	4,536.15	1,010.77
21	APLANADO APALILLADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	78.93	77.35	0.00	77.35	1.58	\$ 215.01	16,970.74	0.00	16,631.02	339.72
22	LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4.83	12.46	0.00	12.46	-7.63	\$ 1,100.00	5,313.00	0.00	13,706.00	-8,393.00
23	MURO DE CELOSIA CUADRO EN MEDIO DE CONCRETO DE 30X30 CM., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	3.26	2.17	0.00	2.17	1.09	\$ 535.57	1,745.96	0.00	1,162.19	
24	FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	8.27	10.45	0.00	10.45	-2.18	\$ 491.83	4,067.43	0.00	5,139.62	1,072.19




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1072-19

[Handwritten signatures and initials]

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
25	REPISÓN DE CONCRETO FC = 150 KG/CM² DE 70 CM DE ANCHO X 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM DE SEPARACIÓN EN SENTIDO LARGO Y @ 15 CM EN EL SENTIDO CORTO. INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, CIMBRADO APARENTE, CHAFLÁN DE PINO DE 1" DE 3/4" EN ARISTAS, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, DESCIMBRADO, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.	ML	42.05	0.00	0.00	0.00	42.05	\$ 396.80	16,685.44	0.00	0.00	16,685.44
26	BASE PARA TINACO DE 1.10X1.10M Y 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO APARENTE DE F'C=150 KG/CM2, SOBRE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO 14 CM. DE ESPESOR DE BLOCK SOLIDO DE CONCRETO DE 11X14X28 CM., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,499.47	1,499.47	0.00	0.00	1,499.47
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ALBAÑILERIA									74,745.42	1,009.89		
ACABADOS												
27	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	7.60	73.69	0.00	73.69	-66.09	\$ 99.90	759.24	0.00	7,361.63	-6,602.39
28	TEJA DE BARRO DE MEDIA CAÑA DE 16.5X30 CM., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACAREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4.83	0.00	0.00	0.00	4.83	\$ 191.38	924.37	0.00	0.00	924.37
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE TEZONTLE DE 0.20CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	164.38	0.00	0.00	0.00	164.38	\$ 104.06	17,105.38	0.00	0.00	17,105.38
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ACABADOS									18,788.99	0.00		
HERRERIA												
30	PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE 1.00X1.10M, DE TABLERO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20 Y CELOSÍA METÁLICA, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PORTACANDADO, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	\$11,026.09	22,052.18	0.00	0.00	22,052.18
31	PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE 1.00X2.25M, DE TABLERO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20 Y CELOSÍA METÁLICA, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PORTACANDADO, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	3.00	0.00	3.00	-1.00	\$17,627.65	35,255.30	0.00	0.00	-17,627.65
32	CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5, DE 2.50 M. DE ALTURA MAS ALAMBRES DE PUAS, CON POSTES DE ARRANQUE Y DEFLEXIÓN DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	42.60	0.00	42.60	42.60	0.00	\$884.42	37,676.29	37,676.29	0.00	0.00
33	PUERTA DE 2.50X2.50 M. EN DOS HOJAS ABATIBLES, CON MARCO PTR DE 1 1/2" (2.8 MM "BLANCO") Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 3/16"X 1 1/2", Y MALLA CICLÓNICA, CON BISAGRAS TUBULARES, PORTACANDADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	\$33,942.06	67,884.12	33,942.06	0.00	33,942.06
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE HERRERIA									162,867.89	71,618.35		







DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
COMPLEMENTARIOS												
34	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	40.00	0.00	0.00	60.00	-20.00	\$202.81	8,112.40	0.00	0.00	-4,056.20
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIÁMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	\$4,627.11	23,135.55	0.00	0.00	0.00
36	TEE DE 3"X3" DE FOFO BRIDADA. INCLUYE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA, ACARREOS Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$3,512.88	7,025.76	0.00	0.00	0.00
37	EXTREMIDAD CAMPANA DE 3" PVC . INCLUYE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA, ACARREOS Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	\$411.21	2,467.26	0.00	0.00	0.00
38	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$ 9,110.78	18,221.56	0.00	0.00	0.00
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110 KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$ 4,709.10	9,418.20	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS									68,380.73	0.00		
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO												
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTR DE 4 PULGADAS CALIBRE 14, PARA SUJETAR PORTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO.	ML	0.00	0.00	8.00	0.00	-8.00	\$930.00	0.00	7,440.00	0.00	-7,440.00
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 2 ¼ PULGADAS, INCLUYE EXCAVACIÓN HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	ML	0.00	0.00	14.00	0.00	-14.00	\$88.00	0.00	1,232.00	0.00	-1,232.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PREFABRICADO DE CONCRETO CON MEDIDAS DE 40X40X60, CMM. INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	\$2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	-2,980.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS									0.00	11,652.00		
TOTAL									1,031,290.14	113,976.0	777,582.56	\$ 139,731.58

[Signature]
 URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.
 CONTRATISTA

[Signature]
 ING. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
 RESIDENTE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
 C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

	MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: OBRA: "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE	
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: GMJ 004- OP/2023

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023		4 CUATRO FINIQUITO
FECHA:	05 DE JULIO DEL 2023	PAGINA: 04 de 39

NÚMEROS GENERADORES										
CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			LARGO	AREA	A1+A2	SUPERFICIE	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO						
4	CABLE PLANO SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 4 AWG				14 ml					
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									14.00	ml

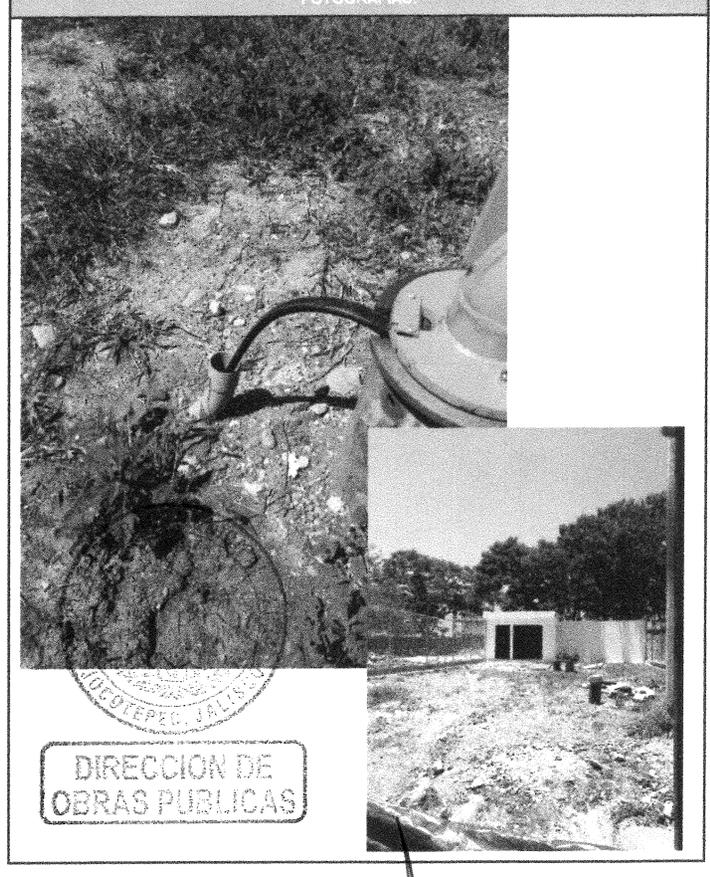
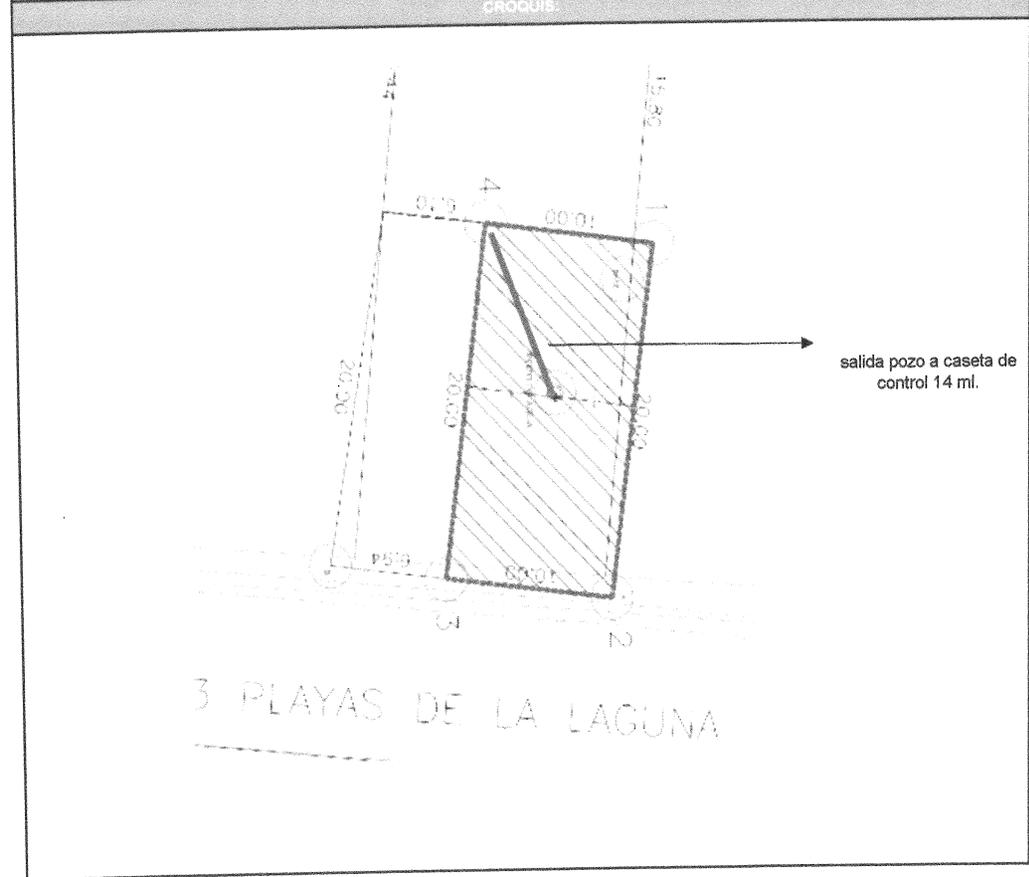


RESPONSABLE DE OBRA: _____
 ARQ. PABLO CESAR LABIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS _____
 ING. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

	MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
	OBRA: "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE JALISCO.		DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	4 CUATRO FINIQUITO
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: GMJ 004- OP/2023		FECHA:	PAGINA: 06 de 39
			05 DE JULIO DEL 2023	

NÚMEROS GENERADORES										
CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			LARGO	AREA	A1+A2	SUPERFICIE	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO						
6	TABLERO DE CONTROL TIPO PD-FC-37KW-480V- GD-IP55 ARMADO EN GABINETE METALICO PARA AUTOMATIZACION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: VARIADOR DE 1 FRECUENCIA DE 37 KW 73 AMPERES, ESPECIAL PARA BOMBE DE AGUA SERIE AQUA DRIVE FC202 CON TARJETA DE TIEMPO REAL, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SUPRESOR DE PICOS, FUSIBLES ULTRARAPIDOS, VENTILACION FORZADA (POSITIVO Y NEGATIVO), TRANSFORMADOR DE CONTROL INDUSTRIAL, LAMPARAS	00+000							1.00	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									1.00	PZA.

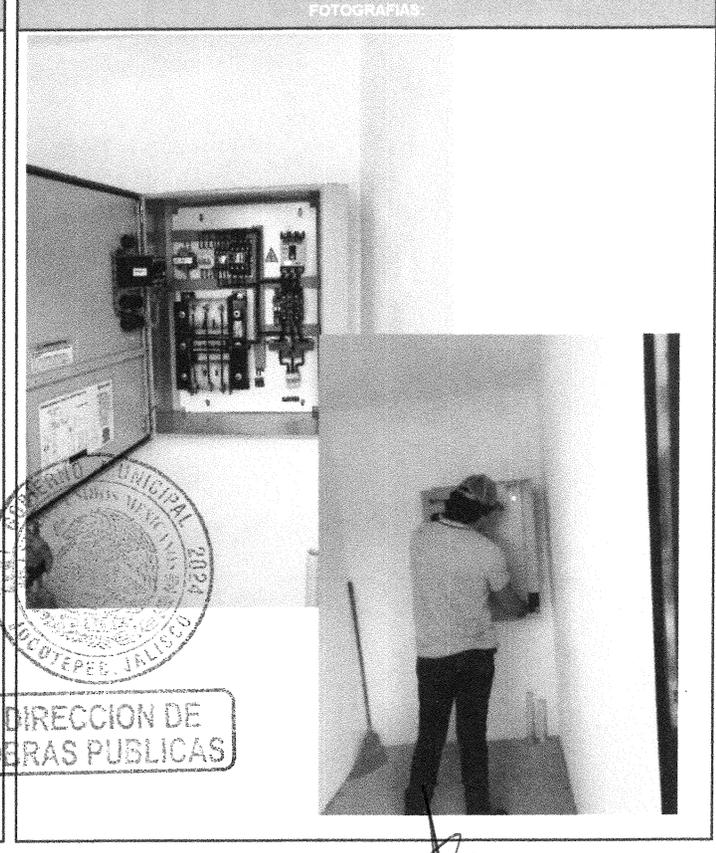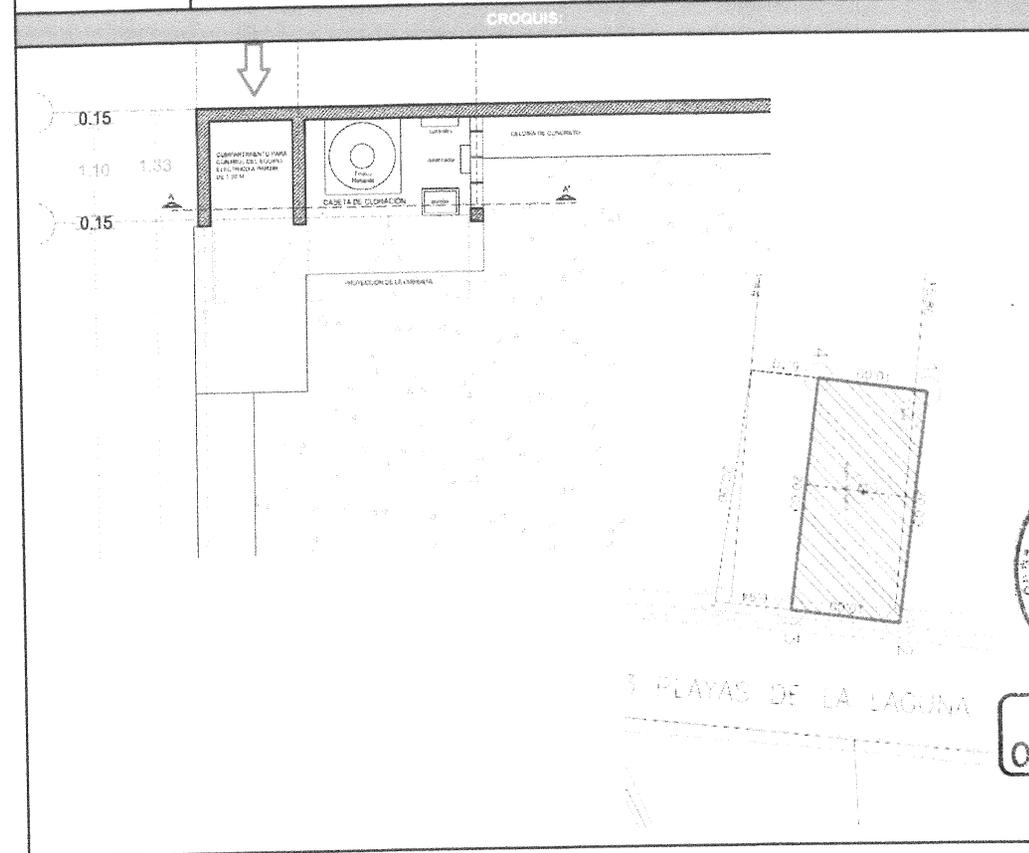

RESPONSABLE DE OBRA: ARQ. PABLO CESAR LARIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ






MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: GMJ 004- OP/2023

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	4 CUATRO FINIQUITO
FECHA:	PAGINA: 16 DE 39
05 DE JULIO DEL 2023	

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			ALTO	DISTANCIA	ALTURA	PZA.	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO						
16	SILLETA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 50X50 CM. PARA SOPORTE DEL TREN DE DESCARGA, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DOBLES DEL NO. 3 (3/8") @ 20 CM. AL CENTRO Y @ 10 CM. EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									1.00	PZA

CROQUIS:

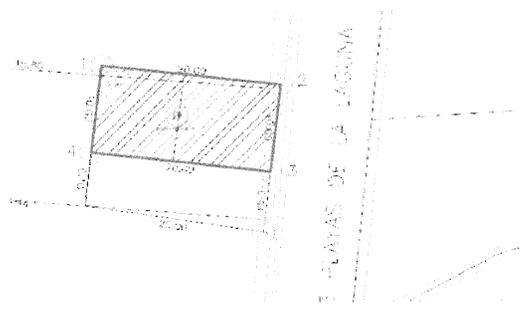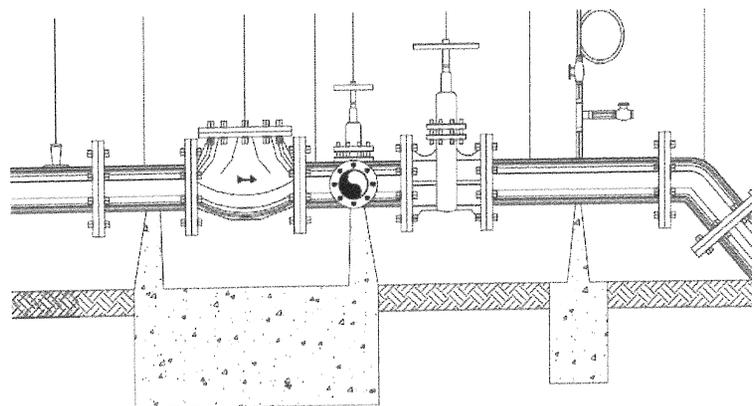

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS:



RESPONSABLE DE OBRA:
ARQ. PABLO CESAR LARIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ



MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: OBRA: "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: GMJ 004- OP/2023

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	No. DE ESTIMACION: 4 CUATRO FINIQUITO
FECHA:	05 DE JULIO DEL 2023	PAGINA: 18 DE 40

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			ALTO	DISTANCIA	ALTURA	PZA.	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO						
18	MURO PARA EL MEDIDOR DE CFE DE 14 CM. DE ESPESOR DE BLOCK SOLIDO DE CONCRETO DE 11X14X28 CM., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APLANADO APALILLADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									2.45	M2

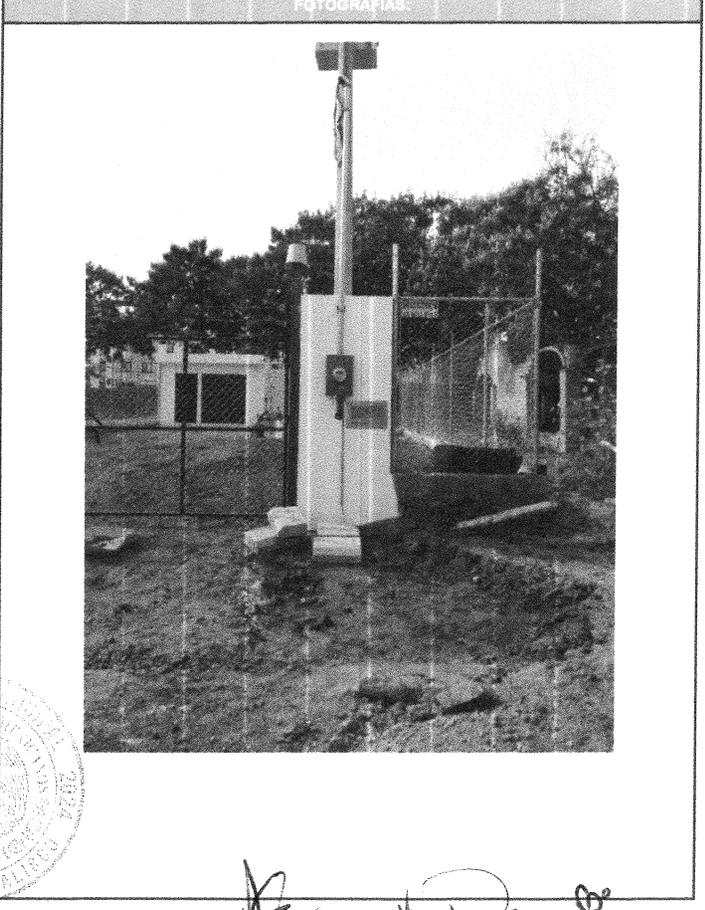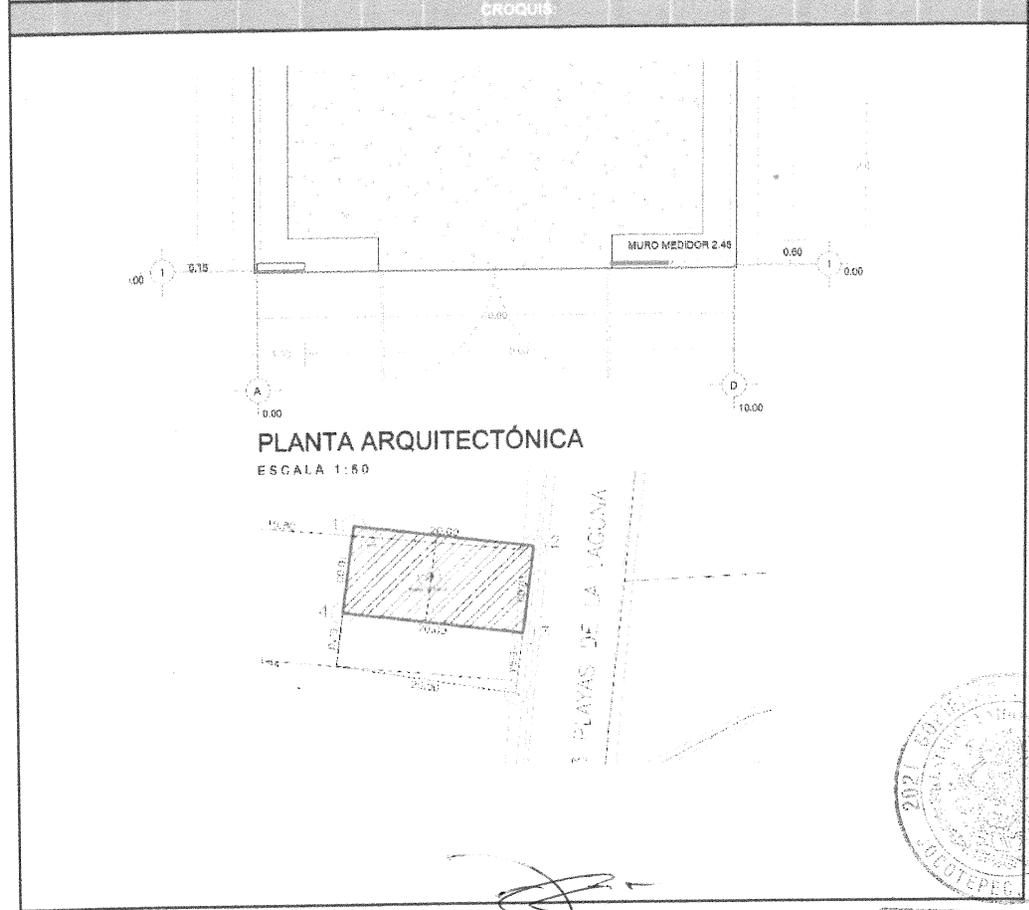

RESPONSABLE DE OBRA:
ARQ. PABLO CESAR LARIOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RESIDENTE DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ



MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: GMJ 004- OP/2023

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:	NUMEROS GENERADORES
URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	4 CUATRO FINIQUITO
FECHA:	PAGINA: 33 DE 40
05 DE JULIO DEL 2023	

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			EJE	EJE	LARGO	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO					
		33	PUERTA DE 2.50X2.50 M. EN DOS HOJAS ABATIBLES, CON MARCO PTR DE 1 1/2" (2.8 MM "BLANCO") Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 3/16"X 1 1/2". Y MALLA CICLÓNICA, CON BISAGRAS TUBULARES, PORTACANDADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:							1.00	PZA	

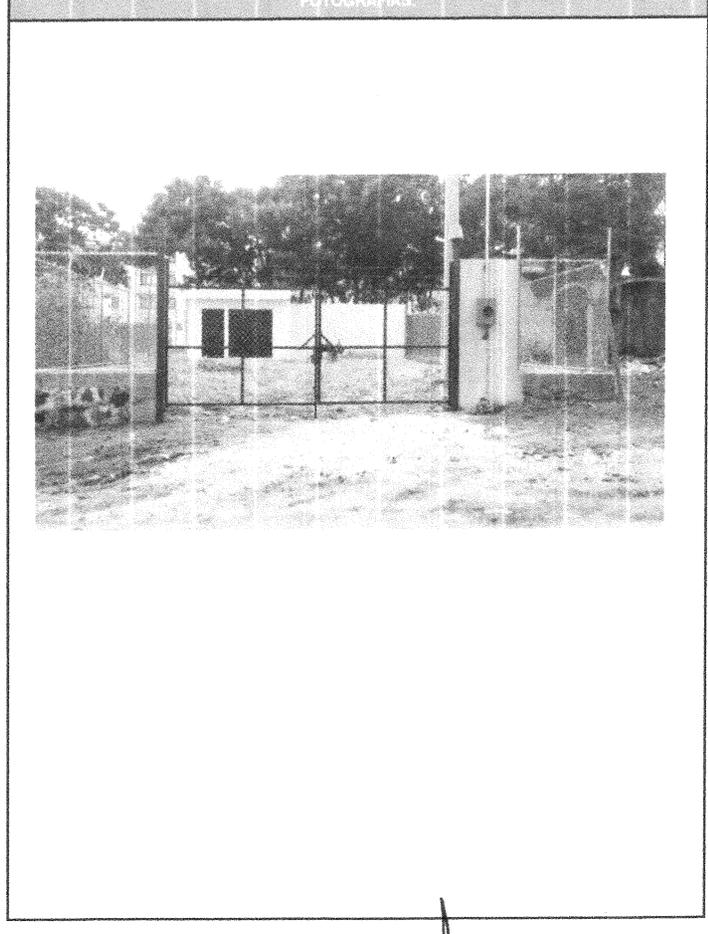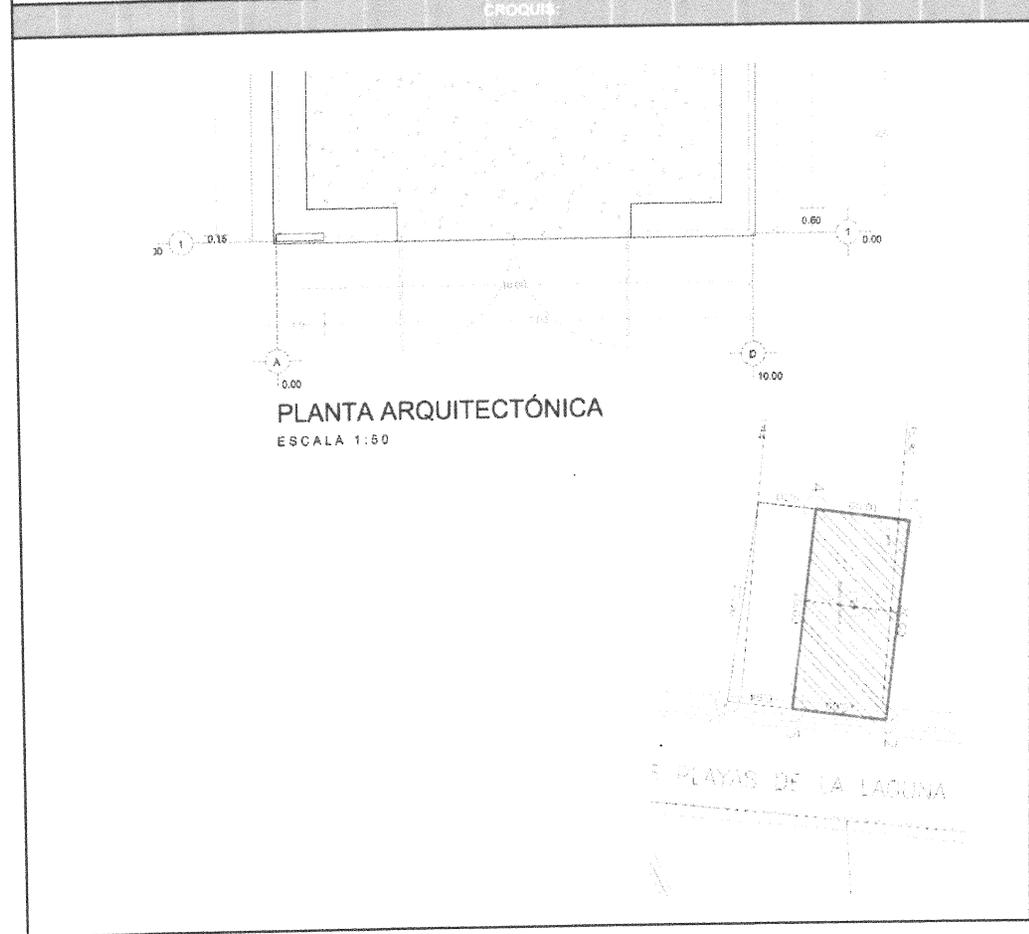

RESPONSABLE DE OBRA:
ARQ. PABLO CESAR LARIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ



MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE

LOCALIDAD:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 OBRA: "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE

No. DE CONTRATO: No. DE CONCURSO: GMJ 004-OP/2023

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.



PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES: No. DE ESTIMACION: 4 CUATRO FINIQUITO

PAGINA: 40 DE 40

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			EJE	EJE	ALTURA	TOTAL	ONSERVACIONES	
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO						
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTR DE 4 PULGADAS CALIBRE 14, PARA SUJETAR PORTO, INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y 2 MANGS DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO									
						PTR 1	4.00 ML	4		
						PTR 2	4.00 ML	4		
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:							8.00	ML		

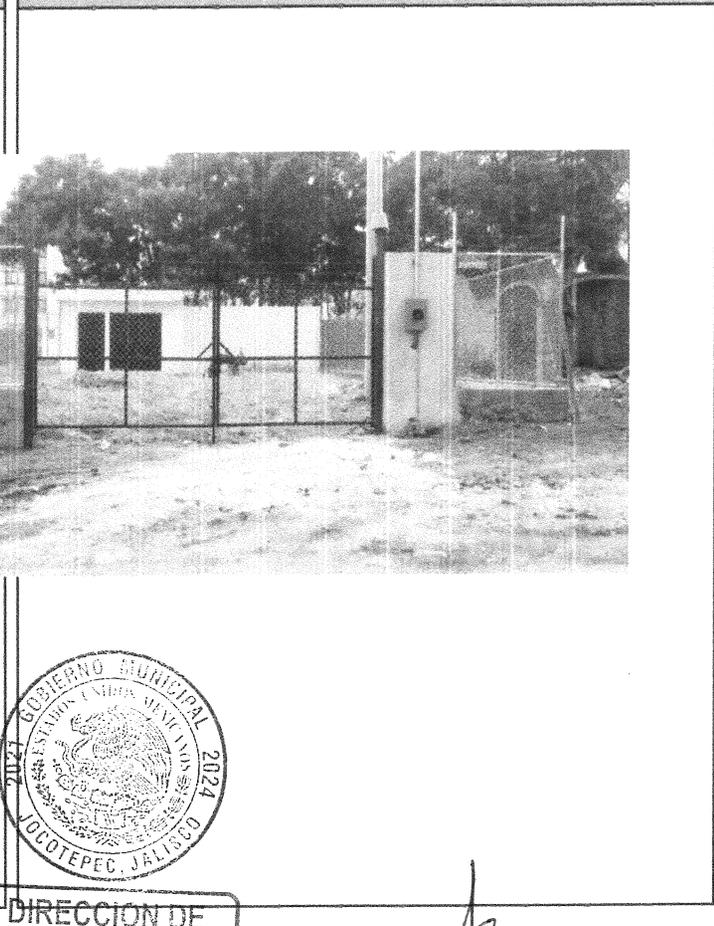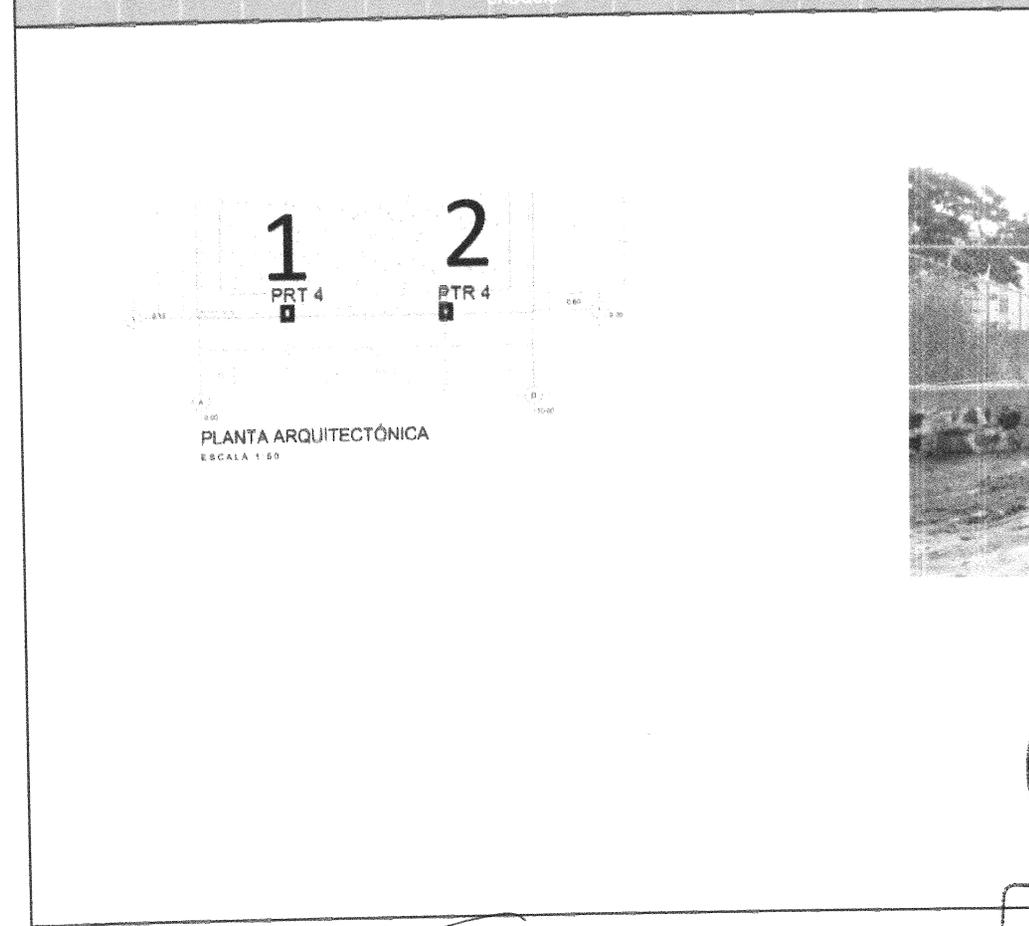

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE OBRA: ARQ. PABLO CESAR LARIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ




MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. (ESTA ADJUDICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA LOS CONCEPTOS DE EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: GMJ 004- OP/2023

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	4 CUATRO FINIQUITO
FECHA:	PAGINA: 42 DE 42
05 DE JULIO DEL 2023	


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			LARGO	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO			
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PREFABRICADO DE CONCRETO CON MEDIDAS DE 40X40X60, CMM. INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:						1.00	pza

CROQUIS:

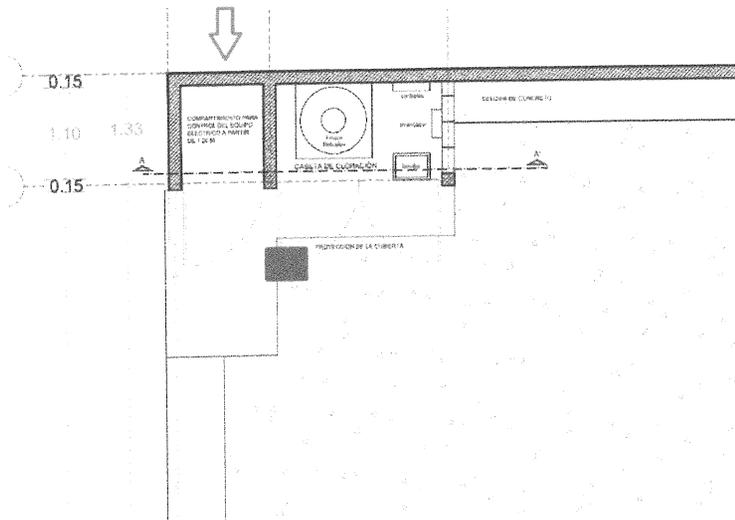

FOTOGRAFÍAS:



RESPONSABLE DE OBRA:

ARQ. PABLO CESAR LARIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
