



ALSERCON
ALS040828T32
Régimen Fiscal 626
Régimen Simplificado de
Confianza

Factura
Serie Folio 263
Tipo de Comprobante 1 - Ingreso
Lugar de Expedición 45655
Fecha de Expedición 5/12/2023 12:23:34

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	MJJ850101KP8
CLIENTE	R.F.C.
Palacio Municipal No. S/N	Jocotepec Centro
DOMICILIO	COLONIA
Jocotepec Jalisco México	45800
CIUDAD ESTADO PAÍS	C.P.
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
REGIMEN FISCAL DEL CLIENTE	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	Unidad de Medida: ACT ACT Actividad 72141121 Servicio de construcción de tubería maestra de agua SERVICIO PAGO DE LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA: "TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)", EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. No. DE CONTRATO GMJ 015-OP/2023, PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO 2023. FIANZA DE CUMPLIMIENTO 069110-00000 FIANZA DE ANTICIPO 069107-00000 RETENCION 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$2,020.22 NETO A PAGAR: \$430,499.34	372,861.69	372,861.69

Impuestos Traslados: Tipo de Impuesto 002 - IVA Tipo de Factor Tasa Tasa de Impuesto
0.160000 Importe del Impuesto 59,657.87

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N.

SUBTOTAL: 372,861.69
IVA TRASLADADO: 59,657.87
TOTAL: 432,519.56



Este Documento es una
Representación Impresa de un CFDI

Folio Fiscal: 645AA808-CC6C-489E-8F40-7F4C5FBBD19C
Serie Certificado del SAT: 00001000000505142236
Serie Certificado del Emisor: 00001000000508610421
Fecha y Hora de Certificación: Diciembre 5 2023 - 12:23:36
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Número Cuenta de Pago:
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000
Uso del CFDI: 603 Gastos en general.
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
Versión CFDI: 4.0

Sello Digital del CFDI
IQrwsW6h25s1M6kV/aSIRJIY+lh0IdtWKTbrK9YgaEUxK7d5f8ZOHXkqf+iQ5+0nSia+Se2igxaQe9eJommZu2/aXA/se1fWxFLc4woBRvWEq+0KeSgDoUQPpJlUoIaN8LyOMRG/XG0EII4jkhBcnmyUvarJ5PcJSPNbn1/cKDFN+hv07FsVsrAl+YyWBJm7tB+tdW/dCohKoe2XhISzaxXBqclve0ZRUUvVQtkMklucZnOclTrzwfNyCE9qGW2cClEoQzpzDS4cwDOs1To2BsvWUVVSLUTRfnllS7IYQpqqfWYXQ5ei7VL0xnr2X+1UQmwpex6ABYEPvJPr6xA==


Sello del SAT
PPZ91o/vyYJqeQ/+cMo6LepXTan8zrISOsNcw/TUTBeyoHWc0+5R0pOYa3Hi4fuKLSQf5+0apwHug2mk/GsTqCTwMXVmi59FrdCe63E4BrvG8JROJIGqnxawSPiyodXpVd7Ber29xZ4A1pl5qpAy+IZsOAKFFXazP/WCpdES1hfqIRBoudmyTq+vsN+0MPJWx/AWQuH50i41DK5vsHSIfhPc6kl7RGRur2fLGVTWazOPEG+ZUVmeY3GFQfX8HkPMmx1Z+CLQJWk5k4MimN4yH8uve5aGwtcY52CeVMYy4/nS9NQX+LeJNOsvqgOWWoZns7IDl3gFMLE8EIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 645AA808-CC6C-489E-8F40-7F4C5FBBD19C 2023-12-05T12:23:36 MAS0810247C0 QrwsW6h25s1M6kV/aSIRJIY+lh0IdtWKTbrK9YgaEUxK7d5f8ZOHXkqf+iQ5+0nSia+Se2igxaQe9eJommZu2/aXA/se1fWxFLc4woBRvWEq+0KeSgDoUQPpJlUoIaN8LyOMRG/XG0EII4jkhBcnmyUvarJ5PcJSPNbn1/cKDFN+hv07FsVsrAl+YyWBJm7tB+tdW/dCohKoe2XhISzaxXBqclve0ZRUUvVQtkMklucZnOclTrzwfNyCE9qGW2cClEoQzpzDS4cwDOs1To2BsvWUVVSLUTRfnllS7IYQpqqfWYXQ5ei7VL0xnr2X+1UQmwpex6ABYEPvJPr6xA== 00001000000505142236



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="263"
Fecha="2023-12-05T12:23:34"
Sello="IQRwsW6h25s1M6kW/aSIRJLY+Ih0IDtWKTbrK9YgaEUxK7d5f8ZOHXkqf+iQ5+0nSia+Se2igxaQ
e9eJommZuZ/aXA/se1fWXFLic4woBRvWEq+0KeSgDoUQPpjJUOIa8LyOMRG/XG0Eii4jkhBcnmyUvarJ5P
cJSPNbN1/okDFn+hv07FsVsrAI+YyWBJm7tB+tdW/dCohKoe2XhiSzaxXBqcLve0ZRUuVQtkMklucZnOcIT
rzwfNyCE9qGW2cClEoQzpzDS4cwD0s1To2BsvWUVvSLIJTRrfn1lS7iYQpQdfWYXQ5ei7VL0xnr2X+1UQmw
pxe6ABYEPvJjPr6xA==" FormaPago="03" NoCertificado="00001000000508610421"
Certificado="MIIF2jCCA8KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg2MTA0MjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggE
GEMSAwHgYDVQQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1DSU8gREUGQURNS
U5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B
CQEWG2NvbnRhy3RvLnRlY25yY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYUeHJREFMR08gNzcsIENPTC4
gR1VFU1JFUK8xDjAMBGNVBBEMBTAMZAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBcGA1UECAwQQ00LVREFEIERFIE1FWE
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhuRUU1PQzEVMBMGA1UELRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE
01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1Mg
QUwgQ09OVFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTA4MTQxOTQ0NTFhFw0yNTA4MTQxOTQ0NTFhMIGOMRowGAYDVQQDExF
BTFNFUKNPTiBTQSBERSBDVjEaMBGGA1UEKRMQUxTRVJDT04gU0EgREUGQ1YxGjAYBgNVBAoTEUFMU0VSQ0
90IFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxBTFmWDA4MjhUMzIgLyBTQVRBNjgwMzA5S0M1MR4wHAYDVQQFExUGL
yBTQVRBNjgwMzA5SE10TlJSMDcxZAJBgNVBAsTAkZDMiIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAjZaISY9nSh1N7KbyZQb41TVSGKnGuakI44m28TkC8avS4hV2dF4xDC2MrGhY+qnHnOB561BfQdMGwGL
iJBSKbLYU+pznb9YVhoBMWwjmft/1MVYnSwrXwv9/Xro81AOhyQWmwLhkbQ9KmisipGawaNCP1+VHhoJNe1
663FDEr7EVf0544UG9+YsSNGXKfuTE95VRVPNkskF0ckFPkYxkgm7uf1RJnNf4VNha5Mu0VIONqZNLs+B8e
cvnzbtUu8czaBzOwfAgpqhDl0tiXSxjiwvYUQAYX6LtZkb4i58kLrpxH2d719nMJyIYhEebFguygC+TJHSL
kv7ziqIufCHU3QIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAJAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAO
CAGEAH0SD9whQgv88qjU2Wpf7ogMSuPBr+fZXCz0l+EVdZAZ4nRx5XQOXcqzFWHe0WwJYUCWrtuv1kZFAq4
vBpGmxszW74x3uKoJhTe4+XibamD7Xn9Sm42Nkn7gSNvRnUvUvOzC95dhHJJNUYBVA6w5YdJyoZrtIfyoam
JtPxOU4mSUujkDS4yOca6PQB1e+9/JXHks9lcTUId/SQgAYESob7fJGdN7Kxn1Ggd4jcVW0WmoBe+cTrnu8
oERAKgsExct4stZ/AMS2+Ds3yqfEemqLBk7w5ulGZJoWxkkLR/gjP08TaGuzlXZTVGONWXEvj3o1K80Ux2
40HxWKRuzF3660KynfnzZ9NadnHvTpQOE5a+AwLHAFbiqC04ewKbFziJd3a88p2UVn/BK7jWVek8j3Uf3Ag
LAXQQ2MOIY141B96kscgm1V1TzxjXs0aFYZBmnNoyuwilG3qHXmG2wRtTT5A5ychZPdkbEuclC53WyeQ
JWkyI1SeTTXaiY5ZtFagv1ZWL16C7ChjssQeEpD1jJuNiMQ7cFqJ+1Jp4cJvR5g0xKFD8A3jjGCWtShNLB5
wQfgLzWt6u57ka2R7KqTnTS3SKbetPgKdx/TVv8b03jxcrMGMAyelsEmvi8HLkoWp+oOLklTHix9qUBJyY4
lm1ByEHZLULxSvzbhuD8l2w=" SubTotal="372861.69" Moneda="MXN" Total="432519.56"
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45655">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="ALS040828T32"
Nombre="ALSERCON"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO
DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141121" ClaveUnidad="ACT"
Cantidad="1" Unidad="ACT" NoIdentificacion="105" Descripcion="Lineas de Agua
Potable SERVICIO PAGO DE LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA
PUBLICA:
"TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION
DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)"; EN LAPEC, JALISCO
LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
No. DE CONTRATO
GMJ 015-OP/2023, PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO 2023.
FIANZA DE
CUMPLIMIENTO 069110-00000
FIANZA DE ANTICIPO 069107-00000
RETENCION 5 AL
MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$2,020.22
NETO A PAGAR: \$430,499.34"



ValorUnitario="372861.69" Importe="372861.69"
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="372861.69"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="59657.87"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concep
tos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="59657.87"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="59657.87"
Base="372861.69"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFi
scalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="645AA808-CC6C-489E-8F40-7F4C5FBBD19C" FechaTimbrado="2023-12-05T12:23:36"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="IQRwsW6h25s1M6kW/aSIRJLY+Ih0IDtWKTbrK9YgaEUxK7d5f8ZOHXkqf+iQ5+0nSia+Se2ig
xaQe9eJommZuZ/aXA/se1fWXfLIc4woBRvWEq+0KeSgDoUQPpjJUOIa8LyOMRG/XG0Eii4jkhBcnmyUvar
J5PcJSPNbN1/okDfN+hv07FsVsrAI+YyWBJm7tB+tdW/dCohKoe2XhiSzaxXBqcLve0ZRUuVQtkMklucZn0
cITrzwfNyCE9qGW2cClEoQzpzDS4cwDOs1To2BsvWUVvSLIJTRrfnllS7iYQpqdfWYXQ5ei7VL0xnr2X+1U
Qmwpxe6ABYEPvJjPr6xA==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="PPZ91o/vyVYJqeQ/+cMo6LepXTan8zr1SOsNcw/TUTBeyoHWc0+5R0pOYa3Hi4fuKLSQf5+0a
pwHug2mk/GsTqCTwMXVmi59Frd0e63E4BrvG8JROJiiGqnxawSPiyodXpVdi7Ber29xZ4A1p15qpAy+lZs0
AKFFXazP/WCpdE51hfqlRBouudmyTq+vSN+0MPJWx/AWQuH50i41DK5vsHSLfhPc6IkL7RGRur2ffLGVTWa
z0PEG+zUVmeY3GFQfX8HkPMmx1Z+CLQlWkSk4MimNx4yH8uve5aGwtcY52CeVMYy4/nS9N0X+LejN0svqg0
wWoZNs7iDI3gFML6E8iQ==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ALS040828T32	ALSERCON	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
645AA808-CC6C-489E-8F40-7F4C5FBBD19C	2023-12-05T12:23:34	2023-12-05T12:23:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$432,519.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





ALSERCON, S.A. DE C.V.

CARDENAL #59, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, C.P. 45655
ALS040828T32



	H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	No. DE CONTRATO: GMJ 015-OP/2023	HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1
		CONTRATISTA: ALSERCON, S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN No. 3 y FINIQUITO
		OBRA: "TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)"	PERÍODO DE TRABAJO:
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DEL: 15 AL 30 DE AGOSTO 2023 FECHA: 10 NOVIEMBRE DE 2023
		UBICACIÓN: LOCALIDAD DE POTRERILLOS	

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES	
	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)"					
					LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION	\$ 404,043.38
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 404,043.38
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ 31,181.69
					SUBTOTAL	\$ 372,861.69
					I. V. A. 16%	\$ 59,657.87
					SUMA	\$ 432,519.56
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 2,020.22
					NETO A PAGAR	\$ 430,499.34
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL		
ASIGNACIÓN		\$ 606,152.00	\$ 96,984.32	\$ 703,136.32		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN		\$ 404,043.38	\$ 64,646.94	\$ 468,690.32		
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 347,045.13	\$ 55,527.22	\$ 402,572.35		
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 751,088.51	\$ 120,174.16	\$ 871,262.67		
SALDO EXCEDENTE		-\$ 144,936.51	-\$ 23,189.84	-\$ 168,126.35		
						EL CONTRATISTA
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO						ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ANTICIPO %		\$ 181,845.60	\$ 29,095.30	\$ 210,940.90		EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
AMORTIZACIÓN		\$ 31,181.69	\$ 4,989.07	\$ 36,170.76		EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.		\$ 150,663.91	\$ 24,106.23	\$ 174,770.14		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$ 181,845.60	\$ 29,095.30	\$ 210,940.90		
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
						ING. JAIME CONDE GÓMEZ
						C. JIMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ



DIRECCION
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No. 3 Y FINIQUITO

PERÍODO: 15 AL 30 DE AGOSTO 2023

OBRA : "TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)"

UBICACIÓN : LOCALIDAD DE POTRERILLOS

CONTRATISTA : ALSERCON S.A. DE C.V.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2023



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
CONSTRUCCION DE LINEAS DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL													
LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION													
1	TRAZO Y NIVELACION PARA EXCAVACION DE LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE LINEA DE AGUA	ML	423.00	176.00	266.00	442.00	-19.00	\$ 13.50	\$5,710.50	\$ 2,376.00	3,591.00	5,967.00	-\$256.50
2	EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: TRASPALCO A UN LADO DE LA CEPA PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	194.06	154.88	39.18	194.06	0.00	\$ 140.29	\$27,224.68	\$ 21,728.12	5,496.56	27,224.68	\$0.00
3	EXCAVACION PARA EXTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE: ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	78.00	0.00	33.81	33.81	44.39	\$ 749.98	\$58,498.44	\$ -	25,209.38	25,209.38	\$33,289.06
4	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE: EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	253.80	140.8000	212.80	353.60	-99.80	\$ 32.92	\$8,355.10	\$ 4,635.14	7,005.36	11,640.51	-\$3,285.42
5	PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	M2	253.80	140.8000	212.80	353.60	-99.80	\$ 102.91	\$26,118.56	\$ 14,489.73	21,899.25	36,388.98	-\$10,270.42
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	ML	423.00	140.8000	301.20	442.00	-19.00	\$ 214.16	\$90,589.68	\$ 30,153.73	64,504.99	94,658.72	-\$4,069.04
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.	M3	226.40	112.6400	170.24	282.8800	-56.48	\$ 260.79	\$59,042.86	\$ 29,375.39	44,396.89	73,772.28	-\$14,729.42
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	423.00	175.5000	266.00	441.5000	-18.5000	\$ 249.97	\$105,737.31	\$ 43,869.74	66,492.02	110,361.76	-\$4,624.45
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA V.F. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	2.00	0.0000	1.00	1.0000	1.00	\$ 3,813.83	\$7,627.66	\$ -	3,813.83	3,813.83	\$3,813.83
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	4.00	0.0000	2.00	2.0000	2.00	\$ 1,710.09	\$6,840.36	\$ -	3,420.18	3,420.18	\$3,420.18
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAU DE Fo.Fo. COMPLETA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	6.00	0.0000	2.00	2.0000	4.00	\$ 391.49	\$2,348.94	\$ -	782.98	782.98	\$1,565.96
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.	M2	924.10	0.0000	883.00	883.0000	41.10	\$ 13.51	\$12,484.59	\$ -	11,929.33	11,929.33	\$559.26
1 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	174.7000	266.00	440.7000	-440.70	\$ 347.29	\$0.00	\$ 60,671.56	92,379.14	153,050.70	-\$153,050.70





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 3 Y FINIQUITO

PERÍODO: 15 AL 30 DE AGOSTO 2023


OBRA : "TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)"

UBICACIÓN : LOCALIDAD DE POTRERILLOS

CONTRATISTA : ALSERCON S.A. DE C.V.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
2 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA DE 3", INCLUYE: CODOS, CONEXIONES, TEFLON, PEGAMENTO, ETC.	ML	0.00	0.0000	5.77	5.7700	-5.77	\$ 328.21	\$0.00	\$ -	1,893.77	1,893.77	-\$1,893.77
3 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Fo.Fo. DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	0.00	0.0000	2.00	2.0000	-2.00	\$ 6,318.04	\$0.00	\$ -	12,636.08	12,636.08	-\$12,636.08
6 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC DE 4" A 3" CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	0.00	0.0000	1.00	1.0000	-1.00	\$ 484.51	\$0.00	\$ -	484.51	484.51	-\$484.51
7 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	0.00	0.0000	1.00	1.0000	-1.00	\$ 737.02	\$0.00	\$ -	737.02	737.02	-\$737.02
8 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "T" DE fofo de 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	0.00	0.0000	1.00	1.0000	-1.00	\$ 2,730.00	\$0.00	\$ -	2,730.00	2,730.00	-\$2,730.00
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, PARA ABASTECER ZONA DEL CRUCERO DE POTRERILLOS													
ALBANILERIA													
13	ELABORACION DE APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	107.36	107.78	0.00	107.78	-0.42	\$ 355.02	\$38,114.95	\$ 38,264.06	0.0000	38,264.06	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 3 Y FINIQUITO

PERÍODO: 15 AL 30 DE AGOSTO 2023

OBRA : "TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)"

UBICACIÓN : LOCALIDAD DE POTRERILLOS

CONTRATISTA : ALSERCON S.A. DE C.V.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
14	ELABORACION DE ZAFALETA O CHAPLAN EN INTERIOR DE CISTERNA DE 10 CMS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y ADITIVO PARA ADHERENCIA ENTRE FIRME ANTIGUO Y APLANADO	IML	45.00	48.46	0.00	48.46	-3.46	\$ 204.98	\$9,224.10	\$ 9,933.33	\$0.00	9,933.33	-\$709.23
15	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADO CON CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	IMZ	97.80	88.44	-5.77	82.67	14.93	\$ 605.02	\$59,049.95	\$ 53,507.97	-\$3,490.97	60,017.00	\$9,032.95
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON DE 10 CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	IMZ	97.80	88.44	-5.77	82.67	14.93	\$419.69	\$40,981.74	\$ 37,117.38	-\$2,421.61	34,895.77	\$6,285.97
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADA CON CEMENT-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	IMZ	97.80	0.00	82.67	82.67	14.93	\$426.79	\$41,654.70	\$ -	\$35,282.73	35,282.73	\$6,371.97
18	ENTRADA HOMBRE DE 0.70 X 0.70 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION CON HERRERIA SEGUN DISEÑO; INCLUYE: FORJADO DE PRETEL CON LADRILLO DE LAMA DE 30CMS. DE ALTO Y 18 CMS. DE ANCHO PARA SOPORTAR LA TAPA, SUMINISTROS, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$5,270.92	\$5,270.92	\$ -	\$5,270.92	5,270.92	\$0.00
19	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	IMZ	96.00	68.32	0.00	68.32	27.68	\$13.51	\$1,296.96	\$ 923.00	\$0.00	923.00	\$373.96
SUMA									\$ 806,152.00	\$ 347,045.13	\$ 404,043.38	\$ 751,088.51	-\$ 144,936.51
IVA									\$ 96,984.32	\$ 55,527.22	\$ 64,846.94	\$ 120,174.16	-\$ 23,189.84
TOTAL									\$ 703,136.32	\$ 402,572.35	\$ 468,890.32	\$ 871,262.67	-\$ 168,126.35

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

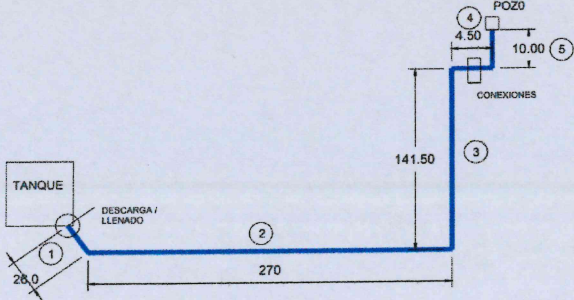
MELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

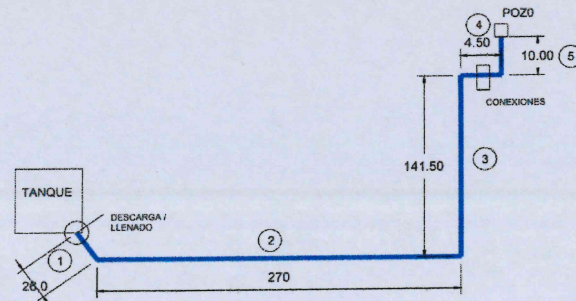


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	1	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION PARA EXCAVACION DE LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE LINEA DE AGUA	Tramo 1		26.00				26.00
		Tramo 2		270.00				270.00
		Tramo 3		141.50				141.50
		Tramo 4		4.50				4.50
		Tramo 1	Cobrado est 2	-26.00				-26.00
		parcial Tramo 2	Cobrado est 2	-150.00				-150.00
								
TOTAL								266.00



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


GENERADOR DE OBRA (FOTOGRAFIAS)

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:					
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)		TRABAJO:		GENERADOR:	1	EST.
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023				

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							
1	TRAZO Y NIVELACION PARA EXCAVACION DE LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE LINEA DE AGUA								


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

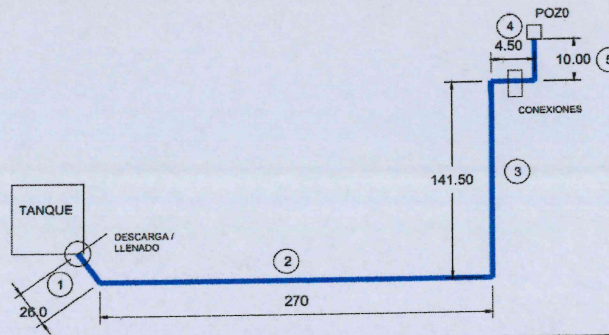

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	2	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	/	TOTAL
2	EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: TRASPALEO A UN LADO DE LA CEPA PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	Tramo 1		26.00	0.80	1.10		22.88
		Tramo 2		180.00	0.80	1.10		158.40
		Tramo 2 comb piedra		90.00	0.80	0.30		21.60
		Tramo 3 comb piedra		30.00	0.80	0.30		7.20
		Tramo 3		111.50	0.80	1.10		98.12
		Tramo 4		4.50	0.80	1.10		3.96
		Tramo 1	Cobrado est 2	-26.00	0.80	1.10		-22.88
		parcial Tramo 2	Cobrado est 2	-150.00	0.80	1.10		-132.00
								157.28



EN ESTA ESTIMACIÓN SOLO SE COBRAN 39.18 M3

TOTAL M3 39.18

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:			
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	2	EST. 3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							
2	EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: TRASPALO A UN LADO DE LA CEPA PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.								


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	3	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

[illegible]

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:		
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	3
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023	
			EST.	3 Y FINIQ

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	
3	EXCAVACION PARA EXSTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE: ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.		


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA									
CONTRATO:		GMJ 015-OP/2023				CONTRATISTA:			
OBRA:		TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)				TRABAJO:			
UBICACIÓN:		LOCALIDAD DE POTRERILLOS				PERIODO:		15 AL 30 DE AGOSTO 2023	
GENERADOR:		4		EST.		3 Y FINIQ			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							
4	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE: EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.								



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:					
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)		TRABAJO:	GENERADOR:	5	EST.	3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023				

[illegible]


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

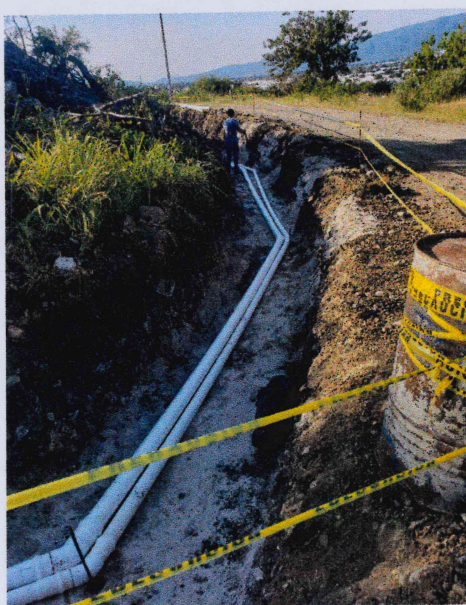
ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:		
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	5
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023	
			EST.	3 Y FINIQ.

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	
5	PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN		


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO: GMJ 015-OP/2023

OBRA: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS

CONTRATISTA:



TRABAJO:

GENERADOR:

6

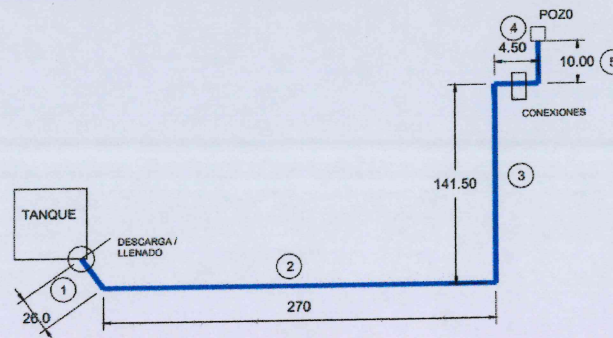
EST.

3 Y FINIQ

PERIODO:

15 AL 30 DE AGOSTO 2023

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN								
								26.00	
		Tramo 1			26.00				270.00
		Tramo 2			270.00				141.50
		Tramo 3			141.50				4.50
		Tramo 4			4.50				
		Tramo 1	Cobrado est 2	-26.00	0.80				-20.80
		parcial Tramo 2	Cobrado est 2	-150.00	0.80				-120.00
								</	



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:					
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)						TRABAJO:
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023				

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN								

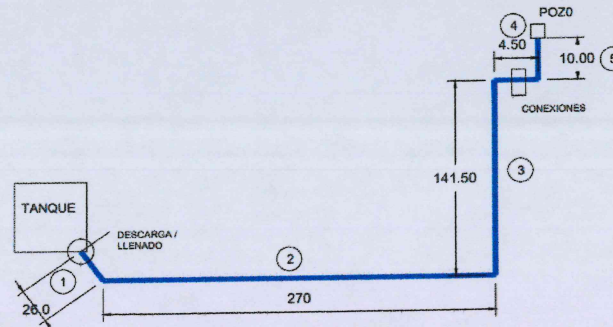


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA


CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	7	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.			26.00	0.80	0.80		16.64
		Tramo 1		180.00	0.80	0.80		115.20
		Tramo 2		90.00	0.80	0.80		57.60
		Tramo 2 comb piedra		30.00	0.80	0.80		19.20
		Tramo 3 comb piedra		111.50	0.80	0.80		71.36
		Tramo 3		4.50	0.80	0.80		2.88
		Tramo 4						
		COBRADO EN ESTIMACION 2		-26.00	0.80	0.80		-16.64
				-150.00	0.80	0.80		-96.00



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:			
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	7	EST. 3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION						
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.							


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

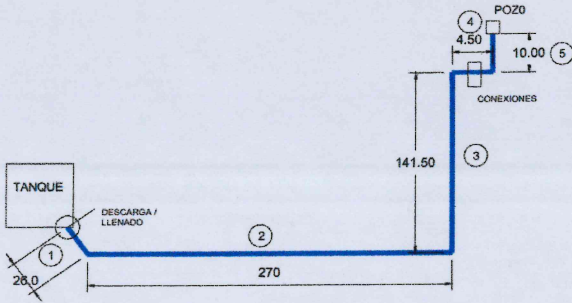

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	8	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
∞	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.							
		Tramo 1		25.50				25.50
		Tramo 2		270.00				270.00
		Tramo 3		141.50				141.50
		Tramo 4		4.50				4.50
		Tramo 1	Cobrado est 2	-25.50				-25.50
		parcial Tramo 2	Cobrado est 2	-150.00				-150.00
								
TOTAL								266.00

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	8	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							
00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	 							


 ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

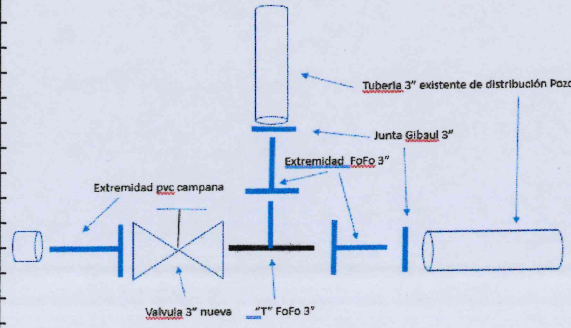

 ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:		GENERADOR:	9	EST. 3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA V.F. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	ENTRONQUE LINEA POZO					1.00	1.00	
		DISEÑO DE CONEXIÓN EN 3" CON LINEA DE POZO							
									
TOTAL							PIEZA	1.00	

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:			
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:		GENERADOR:	9
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023		
				EST.	3 Y FINIQ

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION								
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA V.F. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC									


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

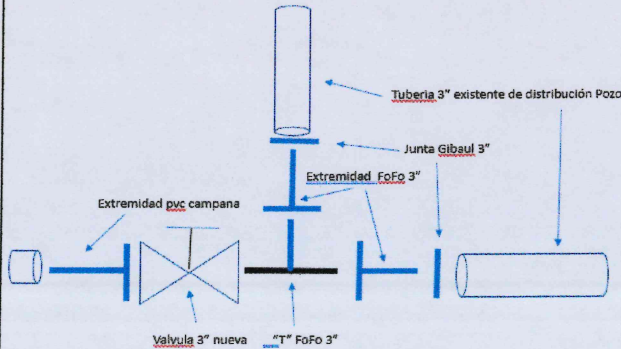

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	11	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC								
		ENTRONQUE LINEA POZO					2.00	2.00	
		DISEÑO DE CONEXIÓN EN 3" CON LINEA DE POZO							
									
TOTAL							PIEZA	2.00	


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:			
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	11	EST. 3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC		

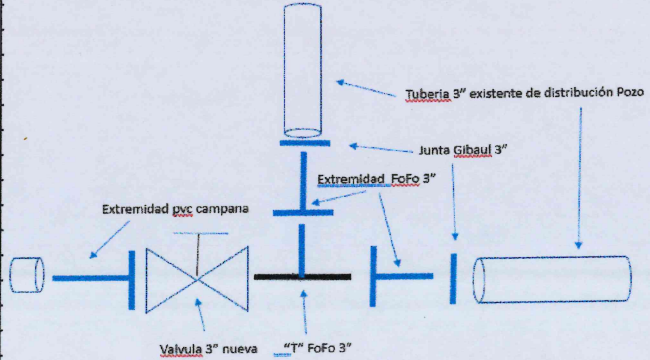

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:		GENERADOR:	12	EST. 3 Y FINIQ.
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAUT DE Fo.Fo. COMPLETA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC								
		ENTRONQUE LINEA POZO					2.00	2.00	
		DISEÑO DE CONEXIÓN EN 3" CON LINEA DE POZO							
									
		TOTAL						PIEZA	2.00

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:			
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	13	EST. 3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.								

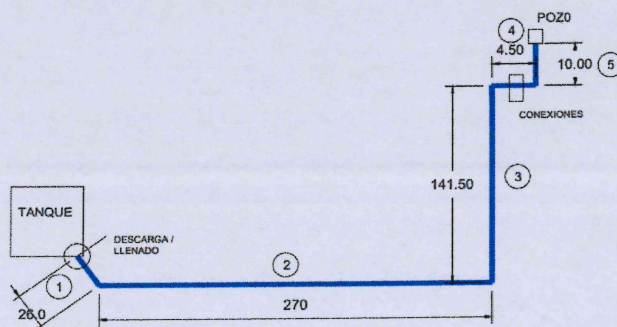

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	15	EST.	3 Y FINIQ.
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
1 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD 26 DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	Tramo 1		24.70				24.70
		Tramo 2		270.00				270.00
		Tramo 3		141.50				141.50
		Tramo 4		4.50				4.50
		Tramo 1	Cobrado est 2	-24.70				-24.70
		parcial Tramo 2	Cobrado est 2	-150.00				-150.00
								
TOTAL 266.00 ML								

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:			
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	15	EST. 3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION								
1 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD 26 DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.									


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	16	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION								
2 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA DE 3", INCLUYE: CODOS, CONEXIONES, TEFLON, PEGAMENTO, ETC.									


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	17	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							
3 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Fo.Fo. DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC								


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO: GMJ 015-OP/2023

OBRA: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)

CONTRATISTA:



TRABAJO:

GENERADOR:

20

EST.


3 Y FINIQ

PERIODO:

15 AL 30 DE AGOSTO 2023

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE POTRERILLOS

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
6 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC DE 4" A 3" CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	salida del tanque					1	1.00
		LLEGADA DE LINEA DE 4" A DISTRIBUCION DE 3" EXISTENTE CERCA DEL POZO						
		EXTREMIDAD fofe 4"						
							TOTAL	1.00



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME GONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:		
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	20
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	EST.	3 Y FINIQ
		15 AL 30 DE AGOSTO 2023		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION					
6 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC DE 4" A 3" CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC						



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



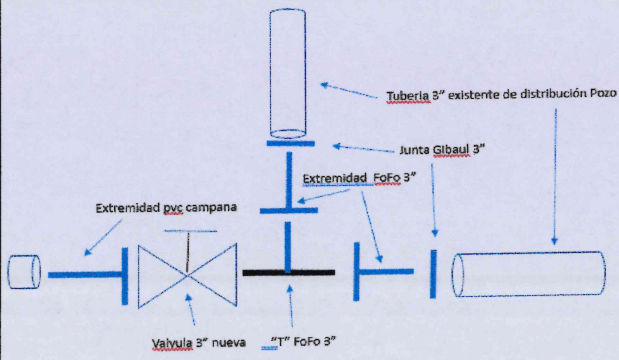
ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	14	EST.	2
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
7 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	ENTRONQUE LINEA POZO					1.00	1.00
		DISEÑO DE CONEXIÓN EN 3" CON LINEA DE POZO						
								
							PIEZA	1.00



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	14	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							
7 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC								

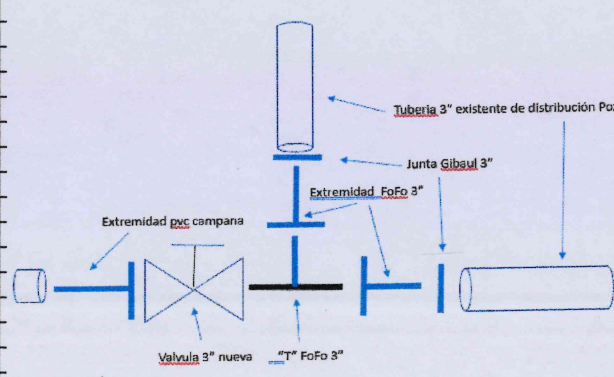

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	10	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	
8 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "T" DE Fo.Fo. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	ENTRONQUE LINEA POZO					1.00	1.00	
		DISEÑO DE CONEXIÓN EN 3" CON LINEA DE POZO							
									
TOTAL							PIEZA	1.00	


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**


GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:		
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	10
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	EST.	3 Y FINIQ
		15 AL 30 DE AGOSTO 2023		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	
8 EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "T" DE Fo.Fo. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC		


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	22	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
15	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM PEGADO CON MORTERC CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADO CON CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION							

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	22	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION									
15	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADO CON CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION										

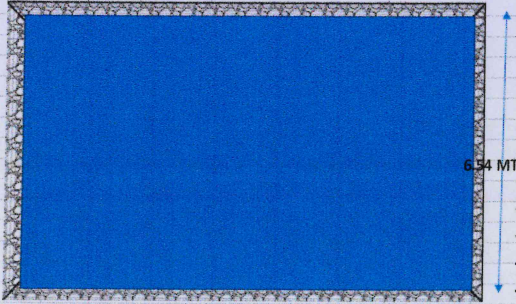

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	23	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON DE 10 CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.							
		TANQUE		12.64	6.54			82.67
		COBRADO EN ESTIMACION 1		13.40	6.60		-1	-88.44
								
							TOTAL	-5.77

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:			
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	23	EST. 3 Y FINIQ.
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION								
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON DE 10 CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.									


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. JAIME CONDE GÓMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**


GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:					
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)		TRABAJO:	GENERADOR:	24	EST.	3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023				

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILL BARRO DE 17X17 CM PEGADO CON MORT CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADA CON CEMENTO ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA NECESARIOS PARA COMPLETA EJECUCION	TANQUE		12.64	6.54			82.67
								
		12.64 MT		6.54 MT				
						TOTAL		82.67

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:					
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)		TRABAJO:	GENERADOR:	24	EST.	3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023				

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION								
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADA CON CEMENT-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	 								


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

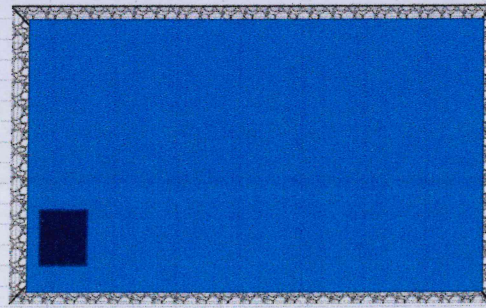

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRERILLOS	TRABAJO:	GENERADOR:	25	EST.	3 Y FINIQ
		PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
18	ENTRADA HOMBRE DE 0.70 X 0.70 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION CON HERRERIA SEGUN DISEÑO; INCLUYE: FORJADO DE PRETIL CON LADRILLO DE LAMA DE 30CMS. DE ALTO Y 18 CMS. DE ANCHO PARA SOPORTAR LA TAPA, SUMINISTROS, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	TANQUE					1	1.00
							TOTAL	1.00




ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 015-OP/2023	CONTRATISTA:				
OBRA:	TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)	TRABAJO:	GENERADOR:	25	EST.	3 Y FINIQ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE POTRÉRILLOS	PERIODO:	15 AL 30 DE AGOSTO 2023			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION								
18	ENTRADA HOMBRE DE 0.70 X 0.70 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION CON HERRERIA SEGUN DISEÑO; INCLUYE: FORJADO DE PRETIL CON LADRILLO DE LAMA DE 30CMS. DE ALTO Y 18 CMS. DE ANCHO PARA SOPORTAR LA TAPA, SUMINISTROS, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.									


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO 2021-2024
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. GMJ 015 C- OP/2023
PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS: LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CHACÓN SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ROGELIO RAMOS PÉREZ SECRETARIO GENERAL, LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA "ALSERCON, S.A. DE C.V." Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARMANDO SANTOS TORRES, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR N° SNTRA68030916H700, ACREDITÁNDOSE CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 31,696, LIBRO DOS FOLIOS 73335 Y 72344 DE FECHA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2004, FIRMADA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 29 DE GUADALAJARA, JALISCO EL LIC. JAVIER HERRERA ANAYA, CON REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE FECHA DEL 02 DE FEBRERO DE 2012 CON NÚMERO DE FOLIO: 24744*1, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S :

1. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA:

1.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 73, 79 FRACCIÓN X, 80 FRACCIÓN III Y VII, 83, 85 FRACCIÓN I Y IV, 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 10, 37 FRACCIÓN V, VI, XIV, 38 FRACCIÓN II Y VIII, 47 FRACCIÓN I, II, VI Y XIII, 48 FRACCIÓN VI, 52 FRACCIÓN II, III Y VI, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCIÓN III, 80 Y 100 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 8, 15, 28, 29, 43, 98, 127, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PERTENECIENTE AL PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023.

1.2. QUE MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA: 27 DE JUNIO DE 2023, SE RESOLVIÓ ASIGNAR LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)", EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO 2021-2024
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. GMJ 015 C- OP/2023
PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: HIDALGO SUR NO. 6 CENTRO EN JOCOTEPEC, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

1.4.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: **MJJ-850101-KP8.**

1.5.- QUE EXISTE LA APROBACIÓN DEL H. CABILDO DE JOCOTEPEC, JALISCO, PARA APLICAR DENTRO DEL PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CONSTA EN EL ACTA 15, CONCERNIENTE A LA SESIÓN DECIMA SEGUNDA CON CARÁCTER DE ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2023.

2.- " EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

2.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

2.3.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: **ALS040828T32.**

2.4.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, CON EL NÚMERO DE REGISTRO **OP CO 027-2021-2024.**

2.5.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

2.6.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASÍ COMO TAMBIÉN 100% DE ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

2.8.- QUE ES PERSONA MORAL QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CARDENAL #59 C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO; MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO 2021-2024
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. GMJ 015 C- OP/2023
PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023

ANTECEDENTES.

1.- QUE MEDIANTE "ADJUDICACIÓN DIRECTA" DE FECHA: 27 DE JUNIO DE 2023, SE RESOLVIÓ, ASIGNAR LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)", EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, AL CONTRATISTA DENOMINADO: **ALSERCON, S.A. DE C.V.**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

2.- CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, "**EL GOBIERNO MUNICIPAL**" Y "**EL CONTRATISTA**" QUE SE MENCIONA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, **GMJ 015 C- OP/2023**, EN EL CUAL, "**EL CONTRATISTA**" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y CONSISTENTES EN: "TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)", EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, ACORDANDO "**LAS PARTES**" COMO PERIODO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO DEL 06 DE JULIO Y TERMINARÁN EL 30 DE AGOSTO DE 2023, SIENDO 56 DÍAS NATURALES, CONSIGNANDO EN EL MISMO UN MONTO ESTABLECIDO DE: \$703,136.32 (SETECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN EL TEXTO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y APEGÁNDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS.

3.- QUE CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO PRESENTADOS POR "**EL CONTRATISTA**", EL COSTO DE LOS MISMOS REPRESENTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

4.- QUE CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO PRESENTADOS POR "**EL GOBIERNO MUNICIPAL**", (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC RD-26 DE 4", TUBERÍA GALVANIZADA DE 3", PIEZAS ESPECIALES DE PCV Y FIERRO FUNDIDO DE 3" Y 4") QUE SON ADICIONALES Y QUE LOS MISMOS REPRESENTAN LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **GMJ 015 C- OP/2023**. EL MONTO CONTRACTUAL SE INCREMENTARÍA POR UNA CANTIDAD DE \$168,126.35 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 35/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023; EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES PARA TERMINAR EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2023.

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO 2021-2024
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. GMJ 015 C- OP/2023
PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023

POR LO QUE DEBIDO A LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE HACE NECESARIO LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GMJ 015 C- OP/2023, REFERENTE AL PROYECTO: "TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)", EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, EN VIRTUD DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- MONTO CONTRACTUAL.- SE MODIFICA EL MONTO CONTRACTUAL PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GMJ 015 C- OP/2023, MISMO QUE SE AMPLÍA POR LA CANTIDAD DE \$168,126.35 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 35/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., Y CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023, POR LO QUE EL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SUMAN LA CANTIDAD DE \$871,262.67 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- NO HAY MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PÁRRAFO INICIAL DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GMJ 015 C- OP/2023.

CUARTA.- "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NUMERO No. GMJ 015 C- OP/2023.

QUINTA.- "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRAN FORMALIZANDO LA MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN PRECISADO EN LA CLÁUSULA TERCERA Y QUE EN CONSECUENCIA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ALUDIDO AUN NO SE ENCUENTRA FINIQUITADO, POR LO QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL PROPIO CONTRATO.

SEXTA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO QUE NO TENDRÁ DERECHO AL COBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE ORIGINE POR EL ATRASO EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO 2021-2024
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. GMJ 015 C- OP/2023
PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023

CONTRATO PRINCIPAL Y ORIGEN DE ESTE CONVENIO POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

SÉPTIMA.- GARANTÍAS "EL CONTRATISTA" MODIFICARÁ SEGÚN CORRESPONDA LAS FIANZAS OTORGADAS RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON EL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARÁ A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A MAS TARDAR 10 DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, UNA PÓLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE DEBERÁ ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO PRINCIPAL.

OCTAVA.- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL **NO. GMJ 015C- OP/2023**, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

NOVENA.- RELACIONES LABORALES "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONVENIO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A MÁS TARDAR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ÉSTA ÚLTIMA Y EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, "EL CONTRATISTA" LA REINTEGRARÁ A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EN IGUAL TÉRMINO.

DÉCIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- "EL CONTRATISTA" SEGÚN EL ARTÍCULO 4 NUMERAL 1 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS SE RETENDRÁ EL EQUIVALENTE EL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.

DÉCIMO PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, COMPETENTE UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO "EL CONTRATISTA", EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO 2021-2024
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. GMJ 015 C- OP/2023
PROGRAMA CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023


EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE JOCOTEPEC, JALISCO, EL
DÍA 22 DE AGOSTO DE 2023.




LIC. JUAN GOMEZ LÓPEZ
PRESENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL GOBIERNO MUNICIPAL"





SINDICATURA
LIC. CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CHACÓN
SÍNDICO MUNICIPAL




LIC. ROGELIO RAMOS PÉREZ
SECRETARIO GENERAL

**SECRETARIA
GENERAL**


LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
**HACIENDA
MUNICIPAL**

EL CONTRATISTA
ALSERCON, S.A. DE C.V.


ING. ARMANDO SANTOS TORRES



SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES

JOCOTEPEC, JALISCO A 21 DE AGOSTO DE 2023

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

PRESENTE

POR ESTE MEDIO, ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE LA AUTORIZACION DE **VOLUMENES EXCEDENTES** CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION 03 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **Terminación de depósito de agua, línea de llenado y distribución de agua potable en cuartel de la guardia nacional (obra civil) en la localidad de Potrerillos del municipio de Jocotepec, Jalisco**, CON NUMERO DE CONTRATO: **No. GMJ-015-OP/2023**, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION PARA EXCAVACION DE LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE LINEA DE AGUA	ML	19.00	\$13.50	\$256.50
4	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE: EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	99.80	\$32.92	\$3,285.42
5	PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	M2	99.80	\$102.91	\$10,270.42
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	ML	19.00	\$214.16	\$4,069.04
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.	M3	56.48	\$260.79	\$14,729.42
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	18.50	\$249.97	\$4,624.45
Total:				SUMA	\$ 37,235.24

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SIRVA BRINDARLE A LA PRESENTE APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

21 AGO. 2023

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.



RECIBI 22-08-2023

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 654/2023

Jocotepec, Jal., a 22 de agosto de 2023

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
ALSERCON, S.A DE C.V
PRESENTE

Asunto: autorización de VOLUMENES EXCEDENTES

De acuerdo a solicitud de autorización de **VOLUMENES EXCEDENTES**, de fecha 21 de agosto del presente año, solicitado en la obra denominada: **Terminación de depósito de agua, línea de llenado y distribución de agua potable en cuartel de la guardia nacional (obra civil) en la localidad de Potrerillos del municipio de Jocotepec, Jalisco**, con el contrato No. **GMJ-015-OP/2023** me permito informarle que se ha la ejecución y pago del mismo, como se presenta a continuación:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION PARA EXCAVACION DE LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE LINEA DE AGUA	ML	19.00	\$13.50	\$256.50
4	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA. INCLUYE: EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	99.80	\$32.92	\$3,285.42
5	PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	M2	99.80	\$102.91	\$10,270.42
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	ML	19.00	\$214.16	\$4,069.04
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.	M3	56.48	\$260.79	\$14,729.42
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	18.50	\$249.97	\$4,624.45
Total:					
				SUMA	\$ 37,235.24

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC LO HACE SU GERENTE"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. ARCHIVO



SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

JOCOTEPEC, JALISCO A 21 DE AGOSTO DE 2023

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

PRESENTE

POR ESTE MEDIO, ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE LA AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION 03 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **Terminación de depósito de agua, línea de llenado y distribución de agua potable en cuartel de la guardia nacional (obra civil) en la localidad de Potrerillos del municipio de Jocotepec, Jalisco**, CON NUMERO DE CONTRATO: **No. GMJ-015-OP/2023**, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	440.7	\$ 347.29	\$ 153,050.70
2-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA DE 3", INCLUYE: CODOS, CONEXIONES, TEFLON, PEGAMENTO, ETC.	ML	5.77	\$ 328.21	\$ 1,893.77
3-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Fo.Fo. DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	2	\$ 6,318.04	\$ 12,636.08
4-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA fofo 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 2,100.01	\$ 2,100.01
5-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	2	\$ 874.97	\$ 1,749.94
6-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC DE 4" A 3" CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 484.51	\$ 484.51
7-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 737.02	\$ 737.02
8-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "T" DE fofo de 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00
9-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE fofo de 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 2,945.36	\$ 2,945.36

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SIRVA BRINDARLE A LA PRESENTE APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

21 AGO 2023

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación:

CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página:

1/9

Análisis de precios unitarios

Clave: 1-EXT

Unidad: ML

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.


Cantidad: 440.70

Precio unitario: 347.29

Total 153,050.70

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
		MAT-TUBRD2 TUBO RD-26 DE 4" Ø	m	1.050000	165.20	173.46
Total de Materiales						173.46
Mano de Obra						
		+ MO-CUADRILL CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.064892	1,523.27	98.85
Total de Mano de Obra						98.85
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	98.85	2.97
Total de Herramienta						2.97
Costo directo						275.28
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	38.54
Subtotal						313.82
Financiamiento					0.1050%	0.33
Subtotal						314.15
Utilidad					10.0000%	31.42
Subtotal						345.57
Cargos adicionales					0.5000%	1.73
Subtotal						347.30
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						347.29

(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 29/100 MXN *)



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación: CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página: 2/9

Análisis de precios unitarios

Clave: 2-EXT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA DE 3", INCLUYE: CODOS, CONEXIONES, TEFLON, PEGAMENTO, ETC.

Unidad: ML
Cantidad: 5.77
Precio unitario: 328.21
Total: 1,893.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	AACE-0211	Tubo galvanizado cédula 40 de 3" (76 mm) tramo de 6.40 (11.85 kg/m)	pza	0.222222	700.00	155.56
Total de Materiales						155.56
Mano de Obra						
	+ MO-CUADRILL	CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.066667	1,523.27	101.55
Total de Mano de Obra						101.55
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	101.55	3.05
Total de Herramienta						3.05
Costo directo						260.16
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	36.42
Subtotal						296.58
Financiamiento					0.1050%	0.31
Subtotal						296.89
Utilidad					10.0000%	29.69
Subtotal						326.58
Cargos adicionales					0.5000%	1.63
Subtotal						328.21
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						328.21

(* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 MXN *)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación:

CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página:

3/9

Análisis de precios unitarios

Clave: 3-EXT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Fo.Fo. DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC

Unidad: PZA
Cantidad: 2.00
Precio unitario: 6,318.04
Total: 12,636.08

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	VALV-4	VALVULA DE COMPUERTA 4"	pza	1.000000	3,989.00	3,989.00
	TORN 5/8X3	TORNILLO DE 5/8" X 3"	pza	16.000000	31.00	496.00
Total de Materiales						4,485.00
Mano de Obra						
	+	MO-CUADRILL CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.333333	1,523.27	507.76
Total de Mano de Obra						507.76
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	507.76	15.23
Total de Herramienta						15.23
Costo directo						5,007.99
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	701.12
Subtotal						5,709.11
Financiamiento					0.1050%	5.99
Subtotal						5,715.10
Utilidad					10.0000%	571.51
Subtotal						6,286.61
Cargos adicionales					0.5000%	31.43
Subtotal						6,318.04
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						6,318.04

(* SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 MXN *)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación:

CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página:

4/9

Análisis de precios unitarios

Clave: 4-EXT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA fofo 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC

Unidad: PZA
Cantidad: 1.00
Precio unitario: 2,100.01
Total: 2,100.01

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	EXTESP4	EXTREMIDAD ESPIGA DE FOFO DE 4" Ø	pza	1.000000	1,645.00	1,645.00
Total de Materiales						1,645.00
Mano de Obra						
	+	MO-CUADRILL CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.012470	1,523.27	19.00
Total de Mano de Obra						19.00
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	19.00	0.57
Total de Herramienta						0.57
Costo directo						1,664.57
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	233.04
Subtotal						1,897.61
Financiamiento					0.1050%	1.99
Subtotal						1,899.60
Utilidad					10.0000%	189.96
Subtotal						2,089.56
Cargos adicionales					0.5000%	10.45
Subtotal						2,100.01
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						2,100.01

(* DOS MIL CIEN PESOS 01/100 MXN *)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación:

CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página:

5/9

Análisis de precios unitarios

Clave: 5-EXT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC

Unidad: PZA
Cantidad: 2.00
Precio unitario: 874.97
Total: 1,749.94

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	EXTCAM4PVC	EXTREMIDAD CAMPANA DE 4" DE PVC	pza	1.000000	556.00	556.00
Total de Materiales						556.00
Mano de Obra						
	+ MO-CUADRILL	CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.087661	1,523.27	133.53
Total de Mano de Obra						133.53
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	133.53	4.01
Total de Herramienta						4.01
Costo directo						693.54
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	97.10
Subtotal						790.64
Financiamiento					0.1050%	0.83
Subtotal						791.47
Utilidad					10.0000%	79.15
Subtotal						870.62
Cargos adicionales					0.5000%	4.35
Subtotal						874.97
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						874.97

(* OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 MXN *)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación:

CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página:

6/9

Análisis de precios unitarios

Clave: 6-EXT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC DE 4" A 3" CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC

Unidad: PZA
Cantidad: 1.00
Precio unitario: 484.51
Total: 484.51

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	REDC4A3PVC	REDUCCION CAMPANA DE PVC DE 4" A 3"	pza	1.000000	195.00	195.00
Total de Materiales						195.00
Mano de Obra						
	+ MO-CUADRILL	CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.120484	1,523.27	183.53
Total de Mano de Obra						183.53
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	183.53	5.51
Total de Herramienta						5.51
Costo directo						384.04
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	53.77
Subtotal						437.81
Financiamiento					0.1050%	0.46
Subtotal						438.27
Utilidad					10.0000%	43.83
Subtotal						482.10
Cargos adicionales					0.5000%	2.41
Subtotal						484.51
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						484.51

(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 51/100 MXN *)



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación:

CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página:

7/9

Análisis de precios unitarios


Clave: 7-EXT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC

Unidad: PZA
Cantidad: 1.00
Precio unitario: 737.02
Total: 737.02

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	EXTCPVC3	EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3"	pza	1.000000	495.00	495.00
Total de Materiales						495.00
Mano de Obra						
	+	MO-CUADRILL CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.056844	1,523.27	86.59
Total de Mano de Obra						86.59
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	86.59	2.60
Total de Herramienta						2.60
Costo directo						584.19
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	81.79
Subtotal						665.98
Financiamiento					0.1050%	0.70
Subtotal						666.68
Utilidad					10.0000%	66.67
Subtotal						733.35
Cargos adicionales					0.5000%	3.67
Subtotal						737.02
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						737.02

(* SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 02/100 MXN *)



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación:

CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página:

8/9

Análisis de precios unitarios


Clave: 8-EXT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE "T" DE fofo de 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC

Unidad: PZA
Cantidad: 1.00
Precio unitario: 2,730.00
Total: 2,730.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	TEEFOF03	TEE FOFO DE 3"	pza	1.000000	2,050.00	2,050.00
Total de Materiales						2,050.00
Mano de Obra						
	+ MO-CUADRILL	CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.072611	1,523.27	110.61
Total de Mano de Obra						110.61
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	110.61	3.32
Total de Herramienta						3.32
Costo directo						2,163.93
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	302.95
Subtotal						2,466.88
Financiamiento					0.1050%	2.59
Subtotal						2,469.47
Utilidad					10.0000%	246.95
Subtotal						2,716.42
Cargos adicionales					0.5000%	13.58
Subtotal						2,730.00
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						2,730.00

(* DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN *)



ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación:

CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, JOCOTEPEC, JALISCO,

Página:

9/9

Análisis de precios unitarios

Clave: 9-EXT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE fofo de 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC

Unidad: PZA
Cantidad: 1.00
Precio unitario: 2,945.36
Total: 2,945.36

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	EXTCFOF04	EXTREMIDAD CAMPANA DE FOFO DE 4"	pza	1.000000	2,100.00	2,100.00
Total de Materiales						2,100.00
Mano de Obra						
	+ MO-CUADRILL	CUADRILLA FONTANERO + AYUDANTE	jor	0.149556	1,523.27	227.81
Total de Mano de Obra						227.81
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	227.81	6.83
Total de Herramienta						6.83
Costo directo						2,334.64
Indirectos de oficina					0.0000%	0.00
Indirectos de campo					14.0000%	326.85
Subtotal						2,661.49
Financiamiento					0.1050%	2.79
Subtotal						2,664.28
Utilidad					10.0000%	266.43
Subtotal						2,930.71
Cargos adicionales					0.5000%	14.65
Subtotal						2,945.36
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						2,945.36

(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 MXN *)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 653/2023

Jocotepec, Jal., a 22 de agosto de 2023

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
ALSERCON, S.A DE C.V
PRESENTE

Asunto: autorización de conceptos extraordinarios

De acuerdo a solicitud de autorización de precio extraordinario, de fecha 21 de agosto del presente año, solicitado en la obra denominada: **Terminación de depósito de agua, línea de llenado y distribución de agua potable en cuartel de la guardia nacional (obra civil) en la localidad de Potrerillos del municipio de Jocotepec, Jalisco**, con el contrato No. **GMJ-015-OP/2023** me permito informarle que se ha la ejecución y pago del mismo, como se presenta a continuación:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	440.7	\$ 347.29	\$ 153,050.70
2-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA DE 3", INCLUYE: CODOS, CONEXIONES, TEFLON, PEGAMENTO, ETC.	ML	5.77	\$ 328.21	\$ 1,893.77
3-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Fo.Fo. DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	2	\$ 6,318.04	\$ 12,636.08
4-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA fofo 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 2,100.01	\$ 2,100.01
5-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	2	\$ 874.97	\$ 1,749.94
6-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC DE 4" A 3" CON CAMPANA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 484.51	\$ 484.51
7-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD PVC CON CAMPANA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 737.02	\$ 737.02
8-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "T" DE fofo de 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00
9-EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE fofo de 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	1	\$ 2,945.36	\$ 2,945.36

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC LO HACE SU GENTE"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]
Recibido: 22/08/2023

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

23ND6672212

Clave R.F.C.

ALS040828T32

Nombre, Denominación o Razón social

ALSERCON SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 09 de noviembre de 2023, a las 12:10 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

IIALS040828T32I23ND6672212I09-11-2023IPII00001088888800000031I

Sello Digital

JjhmeFpCU43mT5TxTV38Q6K/DWmFQ/0875w9RH0XSaUNS84GMrjST5gK6znFgYeGCfD6cDmjL+jy/hfcQNKKG5ZNF
TQQf9SWhd3QfW2KZ52FS96qF5uircqzY9m97gHRS0c5/o+7Zl1r8ejZJlcKGs3tnsmkZj/Yof3k6+uwRgTZin6
nbrGRfINK8G/ZuzpLg+FuWa698A3OWxGDDWB4BTRzodzaql84BuFZ3NxNLq1ZZ5YvPaDyJYct8jCYIOhMiGZwm/Qh
1VWTSN+3jIffmpkqrpuSKddpirzGeAKpteAzR/WsYXpZUIr+sZYdOkdNkcXtHEVnwxldHNA==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA



Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

IIALS040828T32I23ND6672212I09-11-2023IPII00001088888800000031I

Sello Digital

JjhmeFpCU43mT5TxTV38Q6K/DWmFQ/0875w9RH0XSaUNS84GMrjST5gK6znFfgYeGCfD6cDmjL+jy/hfcQNKg5ZNF
TQQf9SWhd3QfW2KZ52FS96qF5uircqzY9m97gHRS0c5/o+7Zllr1r8ejZJlcKGS3tnsmkZj/Yof3k6+uwRgTZin6
nbrGRfINK8G/ZuzpLg+FuWa698A3OWxGDDWB4BTRzodzaql84BuFZ3NxNLq1ZZ5YvPaDyJYct8jCYIOhMiGZwm/Qh
1VWTSN+3jIFmpkqrpuSKddpirzGeAKpteAzR/WsYXpZUIr+sZYZdOkdNkcXtHEVnwxldHNA==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá

