



Factura VERSION 1.0

393

No. de serie del CSD del emisor
00001000000503963539

Fecha y Hora de emisión
2023-08-04T12:57:14

Folio Fiscal
BA4D4B95-32F8-11EE-A2B3-00155D014009

Emisor

RFC: EPO191223QN7

Razón Social: ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44680

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-08-04T12:57:15	00001000000504587508	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MJJ850101KP8

Razón Social: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 45800

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACIÓN No. 1 UNICA. "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN EN JOCOTEPEC, JALISCO. CON NÚMERO DE CONTRATO GMJ 010-OP/2023, MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 1,095.51 MONTO EFECTIVO A PAGAR \$ 253,062.52 ClaveProdServ - 72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	219,101.75	219,101.75

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 MXN

Subtotal	219,101.75 MXN
IVAT 0.160000	35,056.28 MXN
Total	254,158.03 MXN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BA4D4B95-32F8-11EE-A2B3-00155D014009|2023-08-04T12:57:15|TBN040609RKA|oF80jjeWY6gKsnvgzrGZBhd9boA8mBdpV2h8x2UXjzAZLdGGfWUUrjW+CMIGzGqh50Q/Ccilh5GVJK1gugSynIA9P2vSRjV6NQGad2mOaXuDekobsnBxBXAf8pGxzgiqVUqui0OtwJD84fyTaf+Q4vJaS+b64LmoE+o+09li0Xwt0RNBBywznoaAHugwyP8HmVIDxtFpw7zdaviLqceFODRA1oInkTo3AKYi01ak/r2KNLCvwNST4oC1dAZ2RUZMqKPrqA9XYdT1OeWQ2crrfXoWG1DtOwlr5UJl/kAMUxvmNovctS3e7dipb9Tiejq0qUI9tkrCaDyV8s1bZlcKYw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

oF80jjeWY6gKsnvgzrGZBhd9boA8mBdpV2h8x2UXjzAZLdGGfWUUrjW+CMIGzGqh50Q/Ccilh5GVJK1gugSynIA9P2vSRjV6NQGad2mOaXuDekobsnBxBXAf8pGxzgiqVUqui0OtwJD84fyTaf+Q4vJaS+b64LmoE+o+09li0Xwt0RNBBywznoaAHugwyP8HmVIDxtFpw7zdaviLqceFODRA1oInkTo3AKYi01ak/r2KNLCvwNST4oC1dAZ2RUZMqKPrqA9XYdT1OeWQ2crrfXoWG1DtOwlr5UJl/kAMUxvmNovctS3e7dipb9Tiejq0qUI9tkrCaDyV8s1bZlcKYw==

Sello digital del SAT

Zlkj0B41bI8lcEoBqKUEP5mRneeGo9wkdGPekoBJ8hGwvSRyZce+8xD/ERsFyKoT66FPqnsV1RIFLBHwTMSYi7oUOuA6EP09F3i2AC9rbeTDMbCwa/TyQ4GvIH2F5AKkGBwvOnj0k3G/ZMS/QWqPHopsh0NLsloKL/8zohGE4QKWgXKxruNx3jHEbvrIB3+Va/1T7nFE7O/chJ/Wlo4BTDgBBCOxSesDsU1TV0VLIpNq2K9Lwfo4qxLAWnk a1BOeqb4XTC5kXoduX0SPbdgMY40ZNLg8pJ2lpczLCTmWq45Yf88QzcFW+QJiA0P3pWu7lgRnFYulc42V7JUw==



</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="35056.28">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="219101.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="35056.28"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos> <cfdi:Complemento>
 <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital
v11.xsd" Version="1.1" UUID="BA4D4B95-32F8-11EE-A2B3-00155D014009"
FechaTimbrado="2023-08-04T12:57:15" RfcProvCertif="TBN040609RKA"
SelloCFD="oF80ijewY6gKsnvgzrGZBhd9boA8mBdpV2h8x2UXjzAZLdGGfwUUrjw+CMIGzGqh50Q/Cc
iIh5GVJK1gugSynIA9P2vSRjV6NQGad2DmOaX/uDeKobsnBxBXAf8pGxzgiqvUqui00twJD84fyTaf+Q
4vJaS+b64LmoE+o+09Ii0Xwt0RNBywznaoAHugwyP8HmVIDxtFpw7zdaviLqceF0DRA1oINKto3AkYi0
1ak/r2KNLCvwNST4oC1dAZ2RUZMqKPrqA9XYdT10eWQ2crrFxowG1DtOwlr5UJI/kAMUxvmNovctS3e7
dlpb9Tejq0qU19tkRCaDyV8s1bZiCKYw==" NoCertificadoSAT="00001000000504587508"
SelloSAT="ZIkj0B41b18IcEoBqKUEP5mRNeeGo9wkIGPekoBJ8hGvwSRyzce+8xD/ERsFyKoT66FPqn
jsV1RlFLBhwTMSYi7oUOuA6EP09F3i2AC9rbeTDmbCwa/TyQ4GviH2F5AKkGBwvOnjb0k3G/ZMS/QWqP
Hopsh0NLsloKL/8zohGE4QKwgXKxruNx3jHEbvr1B3+Va/1T7nFE70/chJ/wllo4BTDgBBC0xSesDsU1
TV0VLIfnq2k9LwVo4qxLAWnka1B0eqb4XTC5khXoduX0SwPbdgMY40ZNLg8pJ2IpctzLCTmWq45Yf88Q
zcFW+QJiAOP3pWu7IgrnFYuIc42V7JUw==" />
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>






Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPO191223QN7	ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA4D4B95-32F8-11EE-A2B3-00155D014009	2023-08-04T12:57:14	2023-08-04T12:57:15	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$254,158.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: 1 ÚNICA No. DE CONTRATO: GMJ 010-OP/2023
REHABILITACION TANQUE SAN CRISTOBAL
PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023
OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


UBIC. UBICACIÓN: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN
CONT. CONTRATISTA: ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE SA DE CV
FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"													
PRELIMINARES													
1	TRAZO Y LIMPIEZA INICIAL DE SUPERFICIE A REPARAR (MURO) PARA DETERMINAR GRAVEDAD DE GRIETA Y SISTEMA A IMPLEMENTAR INCLUYE: DETERMINACION DE AREA A REPARAR, RETIRO DE POLVO Y SUCIEDAD LOCAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	108.00	0.0000	108.00	108.00	0.00	\$ 12.00	\$ 1,296.00	\$ 1,296.00	\$ -	\$ -	
2	AMPLIADO DE GRIETA EXISTENTE PARA GENERAR ANCLAJE DE MORTERO DE REPARACION INCLUYE: APERTURA CON MARTELINA, LIMPIEZA DE POLVO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	108.00	0.0000	108.00	108.00	0.00	\$ 26.45	\$ 2,856.60	\$ 2,856.60	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES								\$ 4,152.60	\$ 4,152.60				
OBRA CIVIL REPARACION TANQUE													
3	SELLADO DE GRIETA, FISURAS Y HUECO DE MOÑO GENERADO POR CIMBRA CON MORTERO DE REPARACION SIKALATEX MONOTOP 412 Y SIKAFLEX 1A SEGUN REQUIERA, INCLUYE: SELLADO Y REMATADO CON ESPATULA DE MANO Y PISTOLA CALAFATEADORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	108.00	0.0000	216.00	216.00	-108.00	\$ 314.82	\$ 34,000.56	\$ 68,001.12	\$ -	\$ 34,000.56	
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR PRIMARIO SIKALATEX N COMO ADHERENTE INICIAL Y SELLADO DE GRIETA MENOR APLICADO A DOS MANOS CON RODILLO Y BROCHA, INCLUYE: SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	108.00	0.0000	108.00	108.00	0.00	\$ 148.00	\$ 15,768.00	\$ 15,768.00	\$ -	\$ -	
5	SELLADO DE GRIETA, FISURAS Y HUECOS EN ESQUINA DE TANQUE Y PUNTO DE MAXIMA PRESION POR MEDIO MORTERO EPOXICO SIKADUR 31, INCLUYE: SELLADO Y LIJADO PARA DAR ACABADO Y REMATADO CON ESPATULA DE MANO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	0.0000	12.00	12.00	0.00	\$ 869.45	\$ 10,433.40	\$ 10,433.40	\$ -	\$ -	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: 1 UNICA

No. DE CONTRATO: GMJ 010-OP/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

REHABILITACION TANQUE SAN CRISTOBAL

OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"

UBIC. UBICACIÓN: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN


CONT. CONTRATISTA: ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE SA DE CV

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO SIKALASTIC 1C, APLICADO UNA MANO CON RODILLO Y BROCHA, INCLUYE: SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	108.00	0.0000	108.00	108.00	0.00	\$ 287.20	\$ 31,017.60	\$ 31,017.60	\$ -	\$ -	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO EN IMPERMEABILIZACIONES PARA DAR ESTRUCTURA A CAPA MEMBRANA, COLOCADO Y ADHERIDO SOBRE PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	108.00	0.0000	108.00	108.00	0.00	\$ 104.23	\$ 11,256.84	\$ 11,256.84	\$ -	\$ -	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO SIKALASTIC 1C, APLICADO SOBRE MALLA DE REFUERZO A UNA MANO CON RODILLO Y BROCHA, REFORZANDO EL SELLO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	108.00	0.0000	108.00	108.00	0.00	\$ 296.80	\$ 32,054.40	\$ 32,054.40	\$ -	\$ -	
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS INCLUYE: RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS GENERADOS PRODUCTO DE DESARROLLO DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	108.00	0.0000	108.00	108.00	0.00	\$ 8.62	\$ 930.96	\$ 930.96	\$ -	\$ -	
10	REPARACION DE OQUEDADES MAYORES EN MURO DE CONCRETO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE: DEMOLICION PARCIAL DE AREA POROSA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO, COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, COMPLEMENTADO CON ADHESIVO EXPANSIVO TIPO GROUT E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ -	\$ -	

Yuda Pineda





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: 1 UNICA

No. DE CONTRATO: GMJ 010-OP/2023

REHABILITACION TANQUE SAN CRISTOBAL
PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023
OBRA : OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"



UBIC. UBICACIÓN: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN
CONT. CONTRATISTA: ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE SA DE CV
FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA																
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES								
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO				
COMPLEMENTARIOS																
AD-1	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE MURO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICION DE SECCION DE MURO POROSA E INCORRECTA CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO, COLADO CON CONCRETO-GROUT (MORTERO EXPANSIVO) EN PROP. 6:4 HECHO EN OBRA, COMPLEMENTADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLOCACION DE ADHESIVO SIKADUR -32 GEL (RESINA EPOXICA) PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, REFUERZO PERIMETRAL CON ZAVALETA CON MATERIAL MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL SIKATOP 122, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	0.0000	0.0000	1.00	1.00	-1.00	\$39,586.83	\$	-	\$	39,586.83	\$	-	-\$	39,586.83
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS									\$	-	\$	39,586.83				
TOTAL								\$	145,514.36	\$	219,101.75	\$	-	-\$	73,587.39	


C. YOLANBA MARTINEZ LOMELI
CONTRATISTA


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA: OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: TRAZO Y LIMPIEZA INICIAL DE SUPERFICIE A REPARAR (MURO) PARA DETERMINAR GRAVEDAD DE GRIETA Y SISTEMA A IMPLEMENTAR INCLUYE: DETERMINACION DE AREA A REPARAR, RETIRO DE POLVO Y SUCIEDAD LOCAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	TOTAL
MURO NORTE	6.0000		3.0000	1.00	18.00
MURO SUR	6.0000		3.0000	1.00	18.00
MURO PONIENTE	12.0000		3.0000	1.00	36.00
MURO ORIENTE	12.0000		3.0000	1.00	36.00



TOTAL M2: 108.00

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR
	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

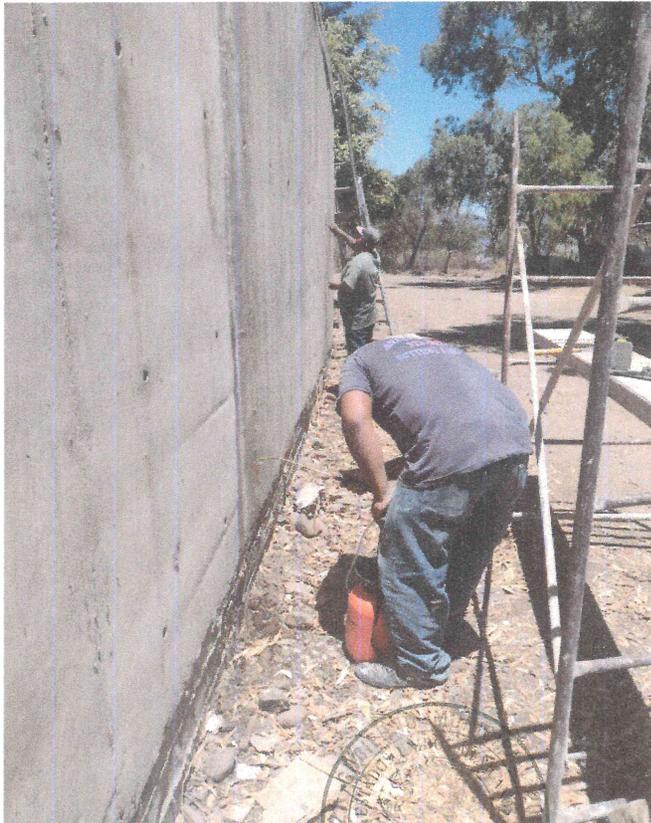

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ



SUPERVISOR DE OBRA


C. JUAN MORA AGUILAR

Juan Mora
RESIDENTE DE OBRA

	FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023	0
OBRA:	OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"	

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL		ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023	

CROQUIS

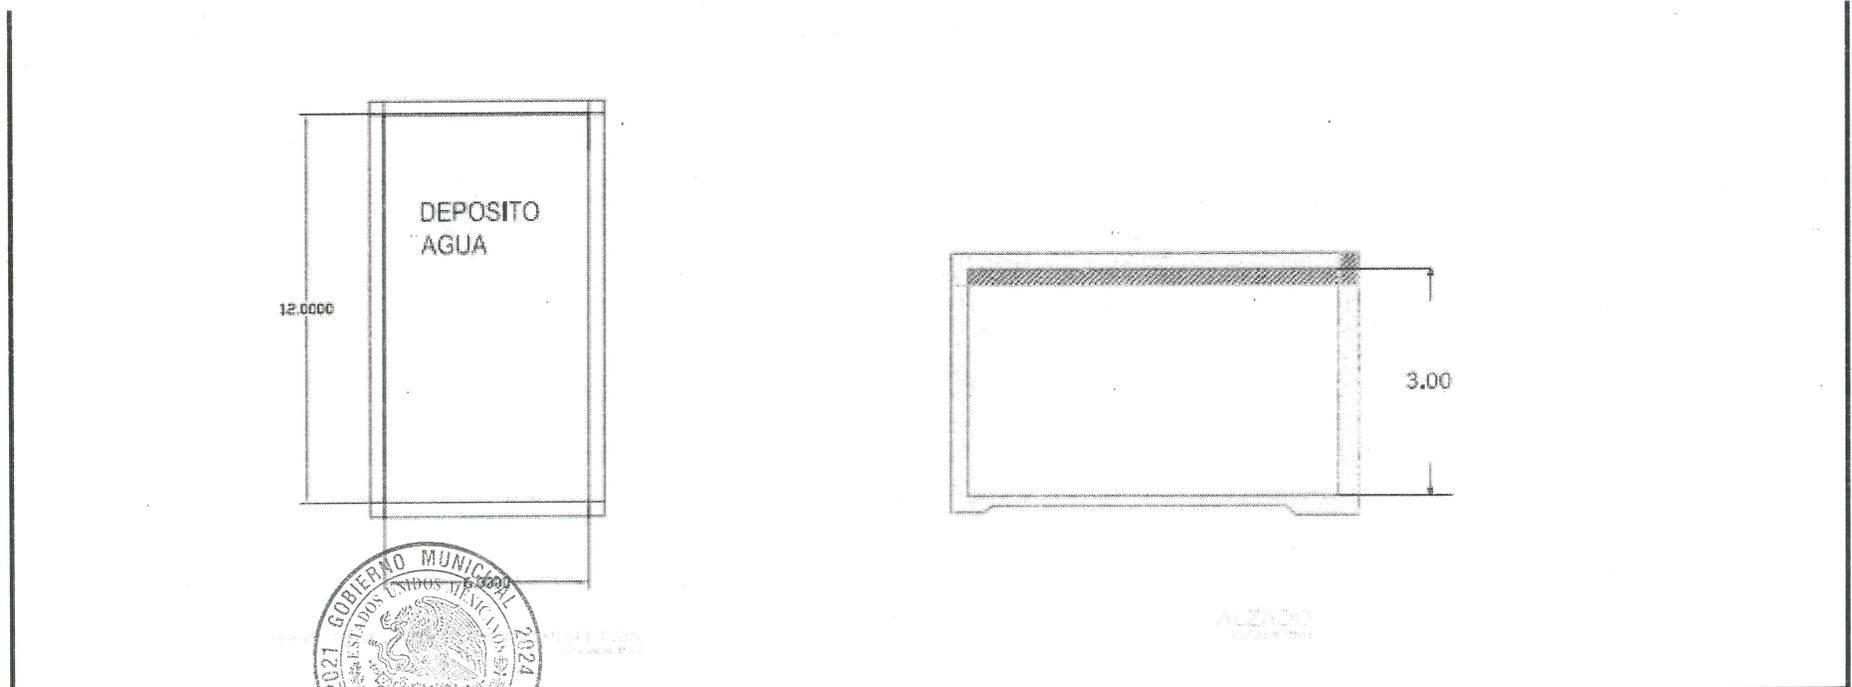

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR	
 	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA	

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA: OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: AMPLIADO DE GRIETA EXISTENTE PARA GENERAR ANCLAJE DE MORTERO DE REPARACION INCLUYE: APERTURA CON MARTELINA, LIMPIEZA DE POLVO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	ABUND.	TOTAL
MURO NORTE	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO SUR	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO PONIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00
MURO ORIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00

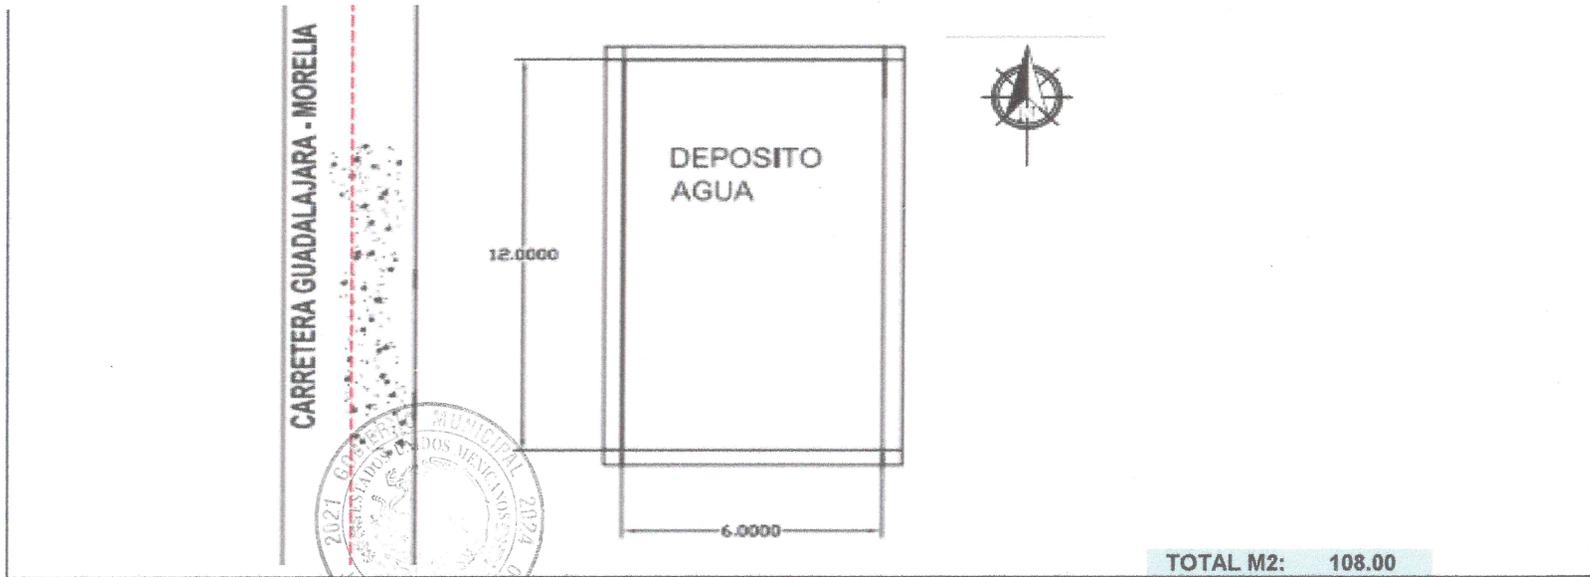

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR
		
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"



LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023


ARCHIVO FOTOGRAFICO

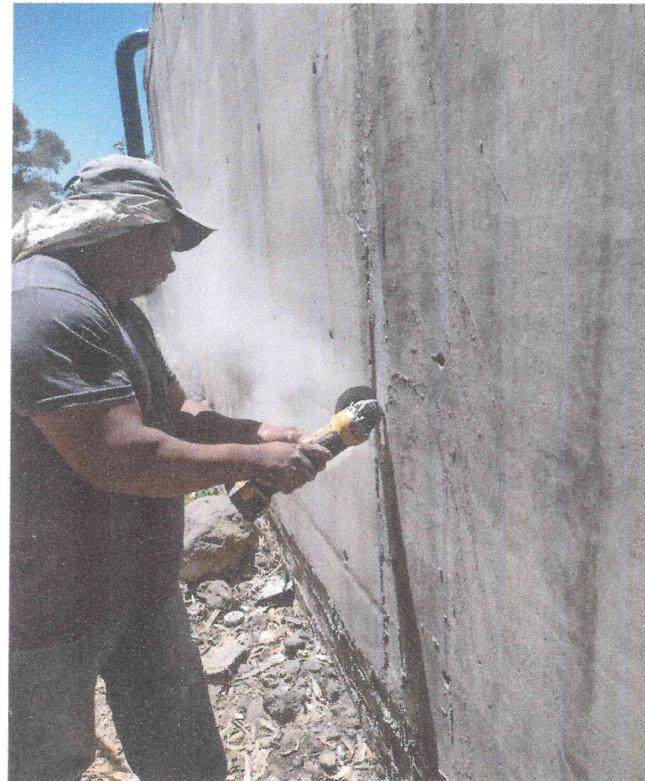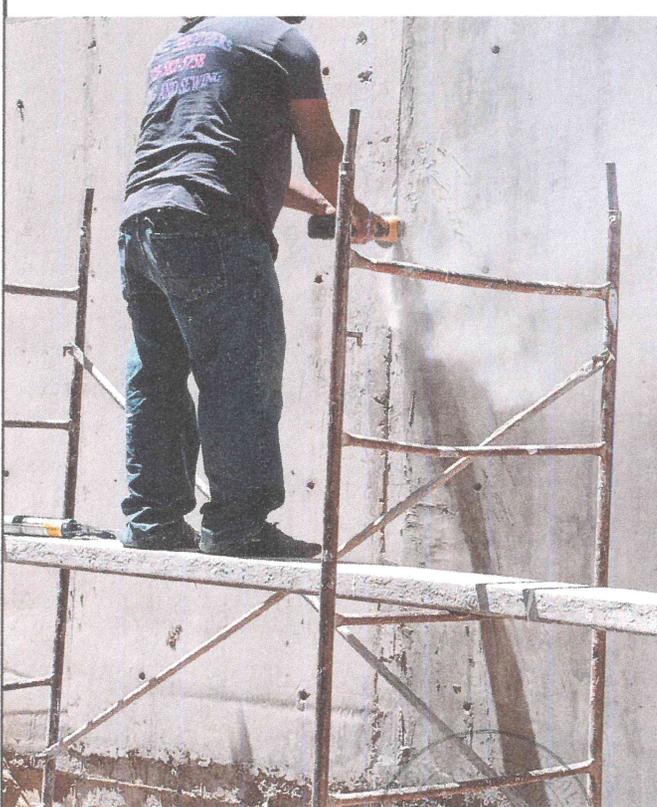

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ


SUPERVISOR DE OBRA

C. JUAN MORA AGUILAR



RESIDENTE DE OBRA


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2023	0
OBRA:	OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"	

LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN:	No. 1 UNICA
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

CROQUIS

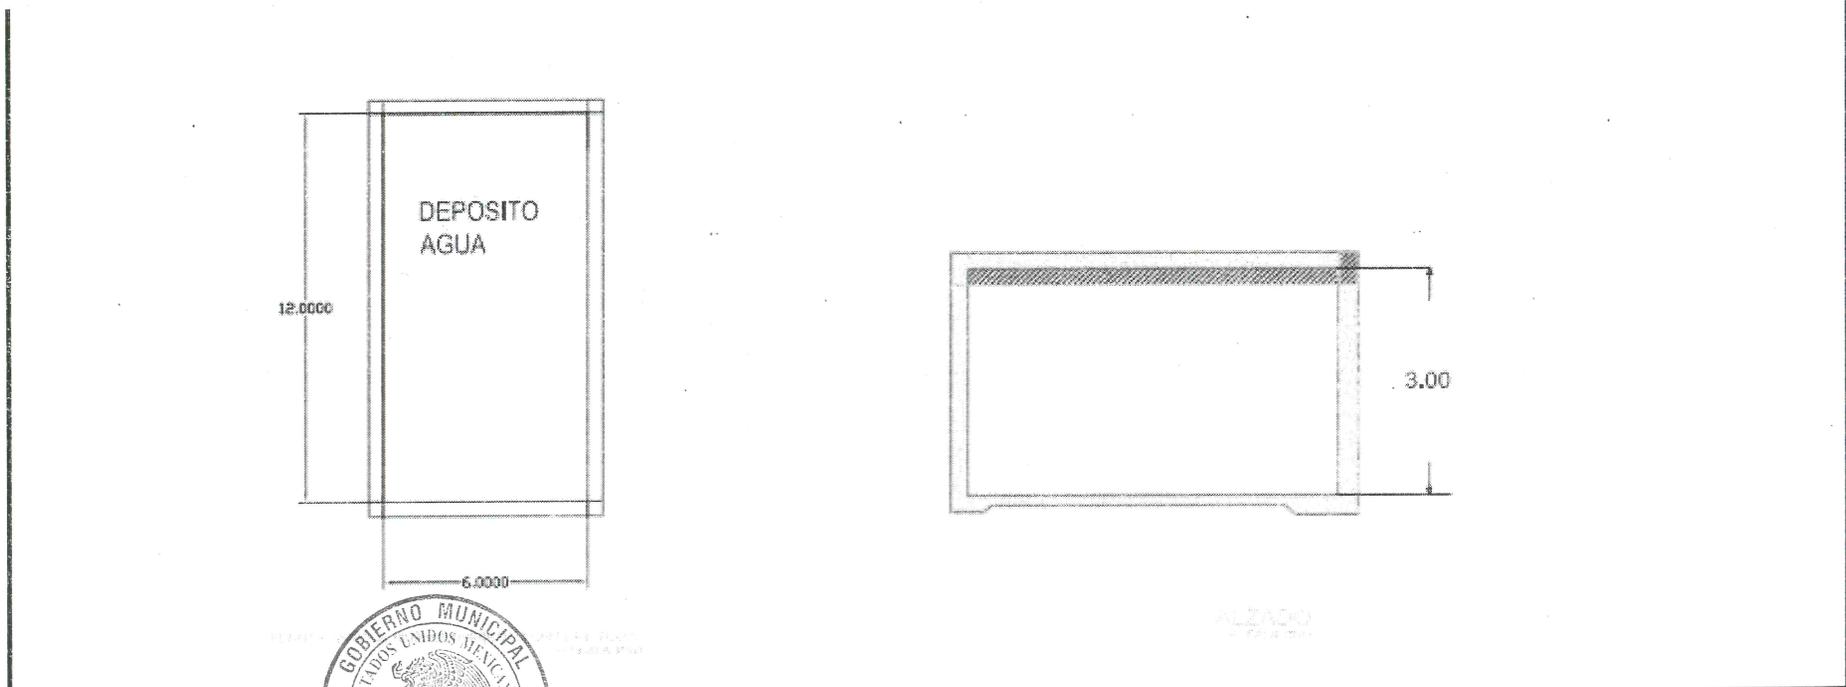

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR	
	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE SA DE CV



FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA: OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SELLADO DE GRIETA, FISURAS Y HUECO DE MOÑO GENERADO POR CIMBRA CON MORTERO DE REPARACION SIKA MONOTOP 412 Y SIKAFLEX 1A SEGUN REQUIERA, INCLUYE: SELLADO Y REMATADO CON ESPATULA DE MANO Y PISTOLA CALAFATEADORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	ABUND.	TOTAL
MURO NORTE (INTERIOR Y EXTERIOR)	6.0000		3.0000	2.00		36.00
MURO SUR (INTERIOR Y EXTERIOR)}	6.0000		3.0000	2.00		36.00
MURO PONIENTE (INTERIOR Y EXTERIOR)	12.0000		3.0000	2.00		72.00
MURO ORIENTE (INTERIOR Y EXTERIOR)	12.0000		3.0000	2.00		72.00

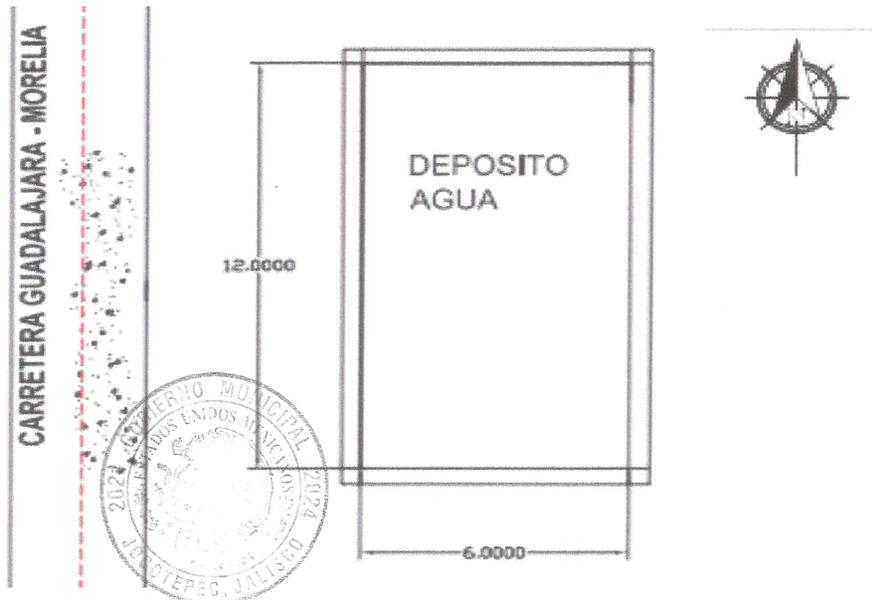

TOTAL M2: 216.00

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR
	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA:






OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

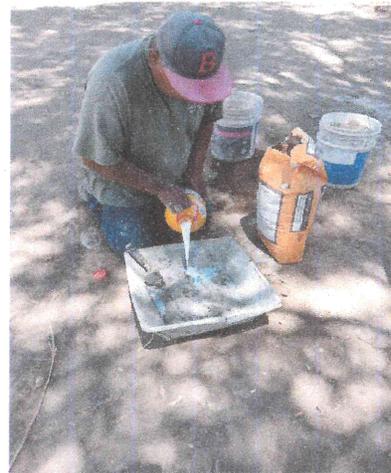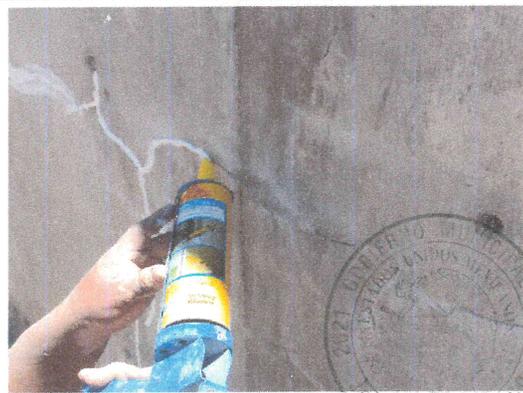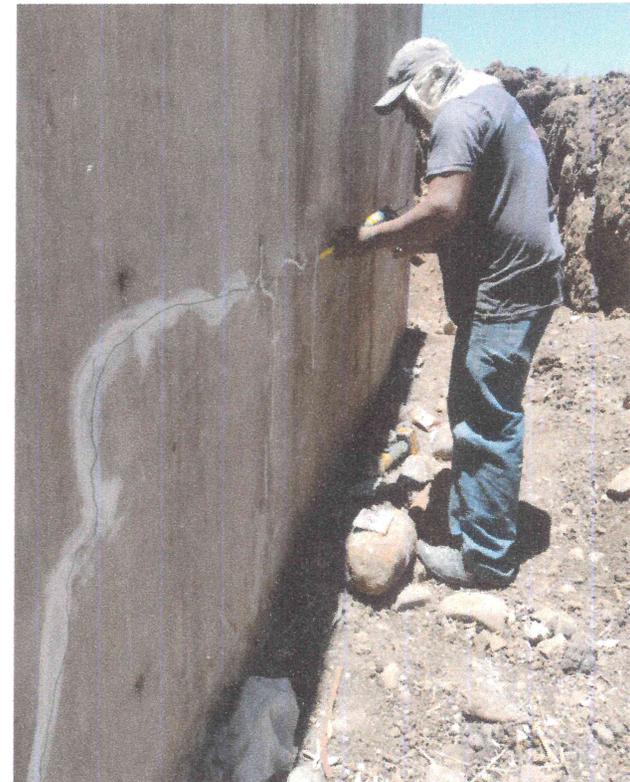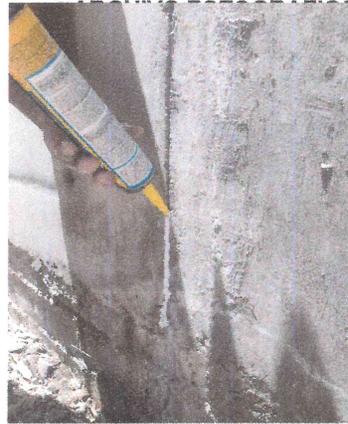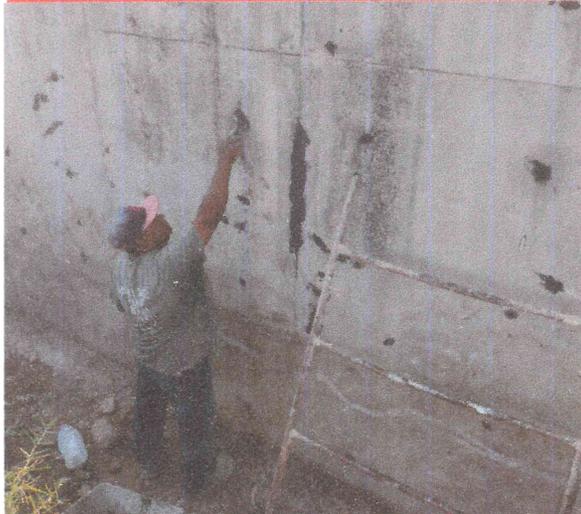

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

C. JUAN MORA AGUILAR



SUPERVISOR DE OBRA

Juan Mora
RESIDENTE DE OBRA


FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023 0

OBRA: OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

CROQUIS

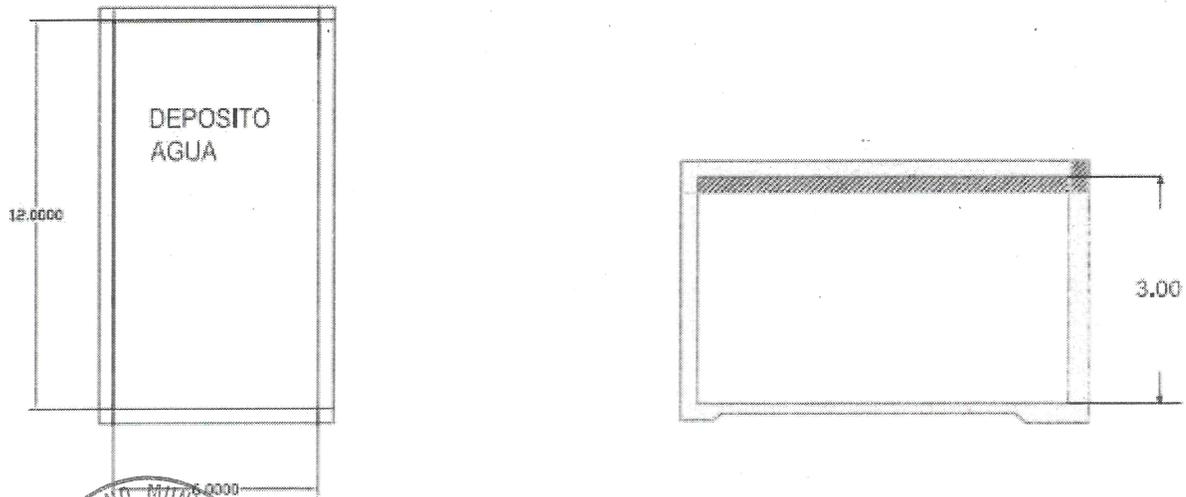

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

C. JUAN MORA AGUILAR



Juan Mora

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023
 OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023


NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR PRIMARIO SIKALATEX N COMO ADHERENTE INICIAL Y SELLADO DE GRIETA MENOR APLICADO A DOS MANOS CON RODILLO Y BROCHA, INCLUYE: SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	ABUND.	TOTAL
MURO NORTE	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO SUR	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO PONIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00
MURO ORIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00


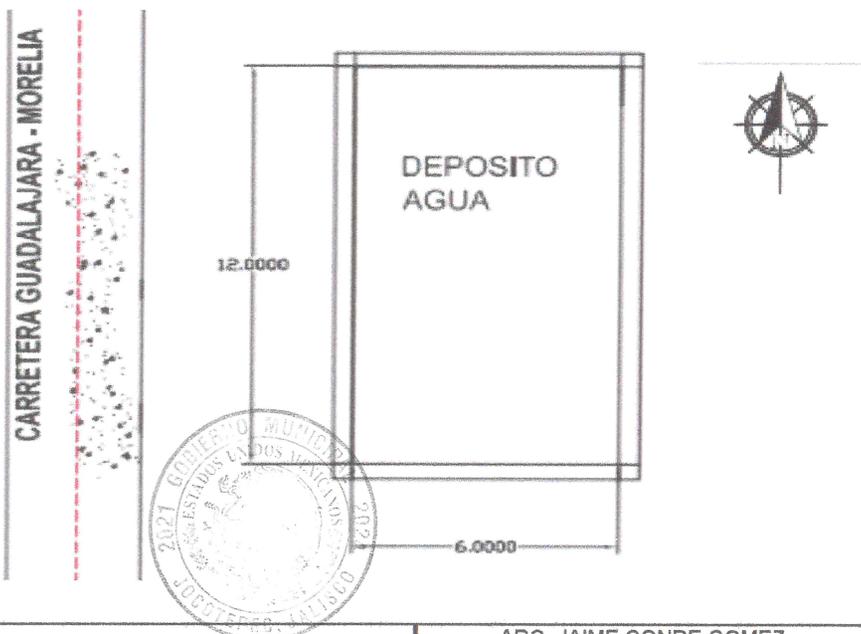




TOTAL M2: 108.00

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR
	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023	
OBRA:	OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

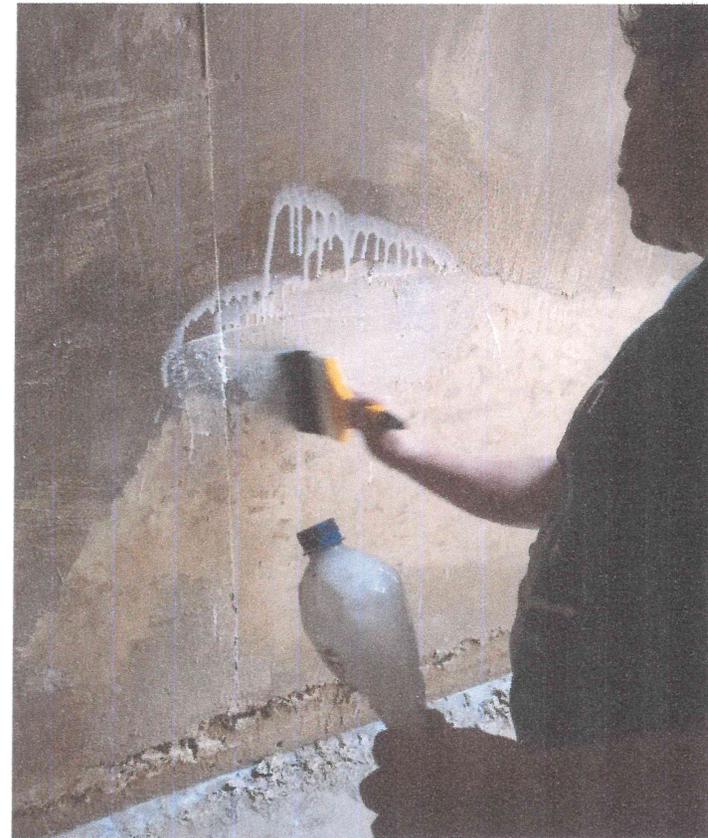
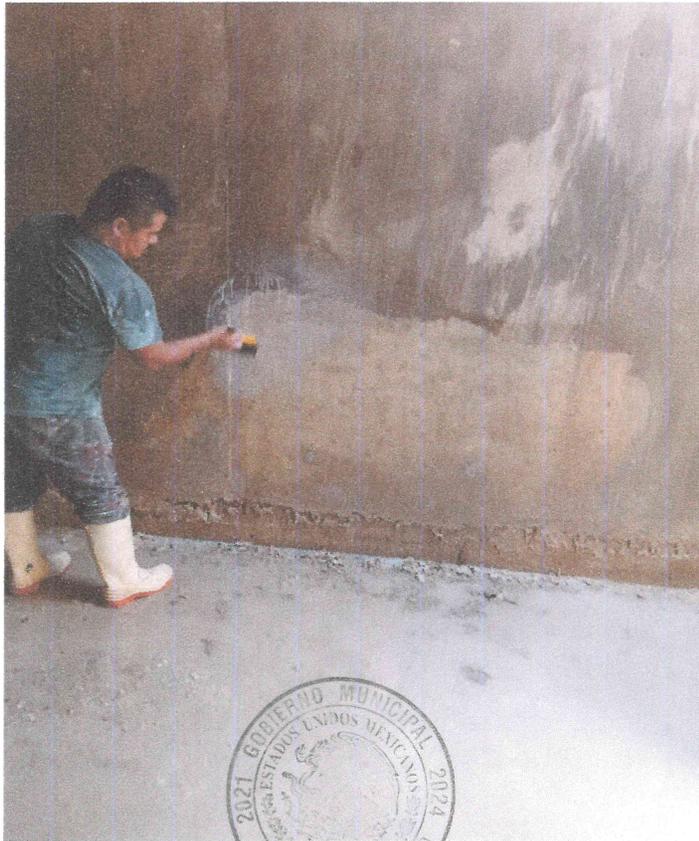


	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR
	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA

FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2023	0
OBRA:	OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"	

LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN:	No. 1 UNICA
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN:	- DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

CROQUIS

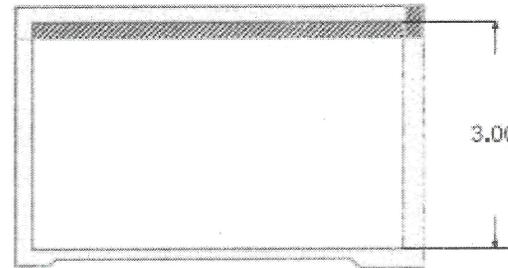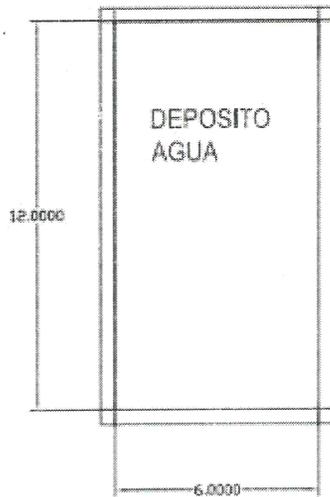

ALZADO
JOCOTEPEC

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR	
	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA: OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SELLADO DE GRIETA, FISURAS Y HUECOS EN ESQUINA DE TANQUE Y PUNTO DE MAXIMA PRESION POR MEDIO MORTERO EPOXICO SIKADUR 31, INCLUYE: SELLADO Y LIJADO PARA DAR ACABADO Y REMATADO CON ESPATULA DE MANO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	ABUND.	TOTAL
ESQUINA NORTE CON PONIENTE			3.0000	1.00		3.00
ESQUINA NORTE CON ORIENTE			3.0000	1.00		3.00
ESQUINA SUR CON PONIENTE			3.0000	1.00		3.00
ESQUINA SUR CON ORIENTE			3.0000	1.00		3.00



TOTAL ML: 12.00

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

C. JUAN MORA AGUILAR



[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

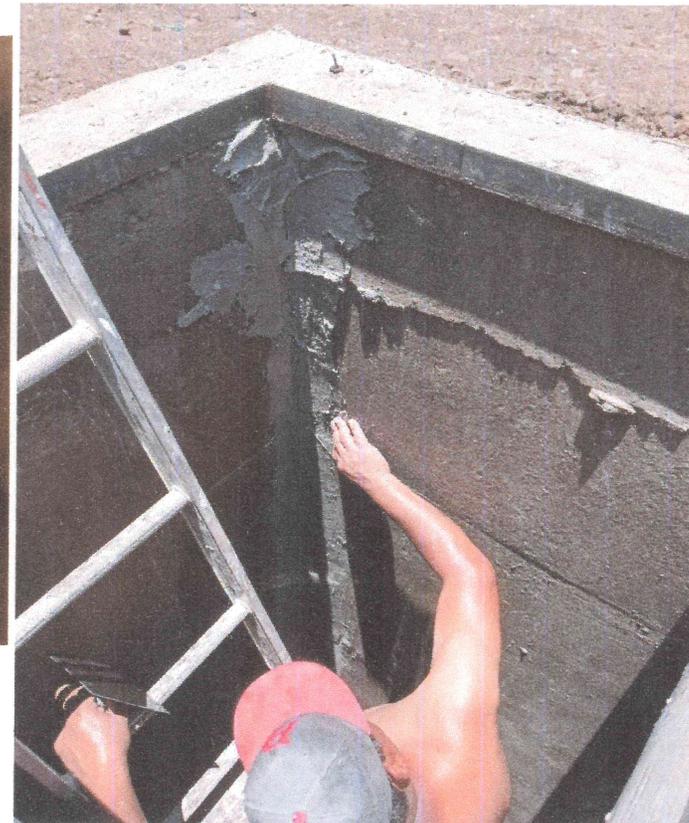


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

C. JUAN MORA AGUILAR

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



SUPERVISOR DE OBRA




RESIDENTE DE OBRA

FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2023	0
OBRA:	OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"	

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

CROQUIS

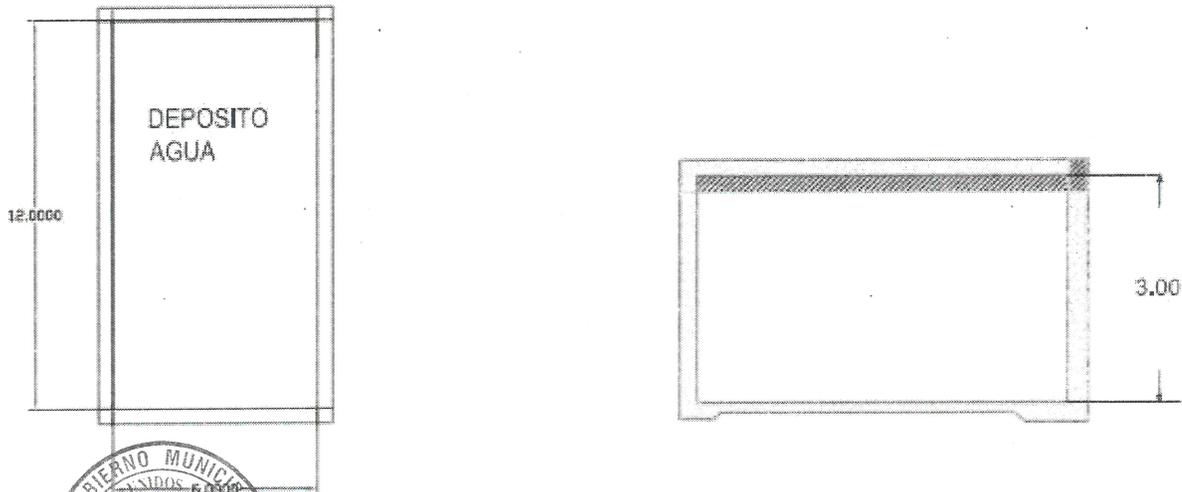

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA

C. JUAN MORA AGUILAR

Juan Mora
RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA: OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO SIKALASTIC 1C, APLICADO UNA MANO CON RODILLO Y BROCHA, INCLUYE: SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	ABUND.	TOTAL
MURO NORTE	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO SUR	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO PONIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00
MURO ORIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00


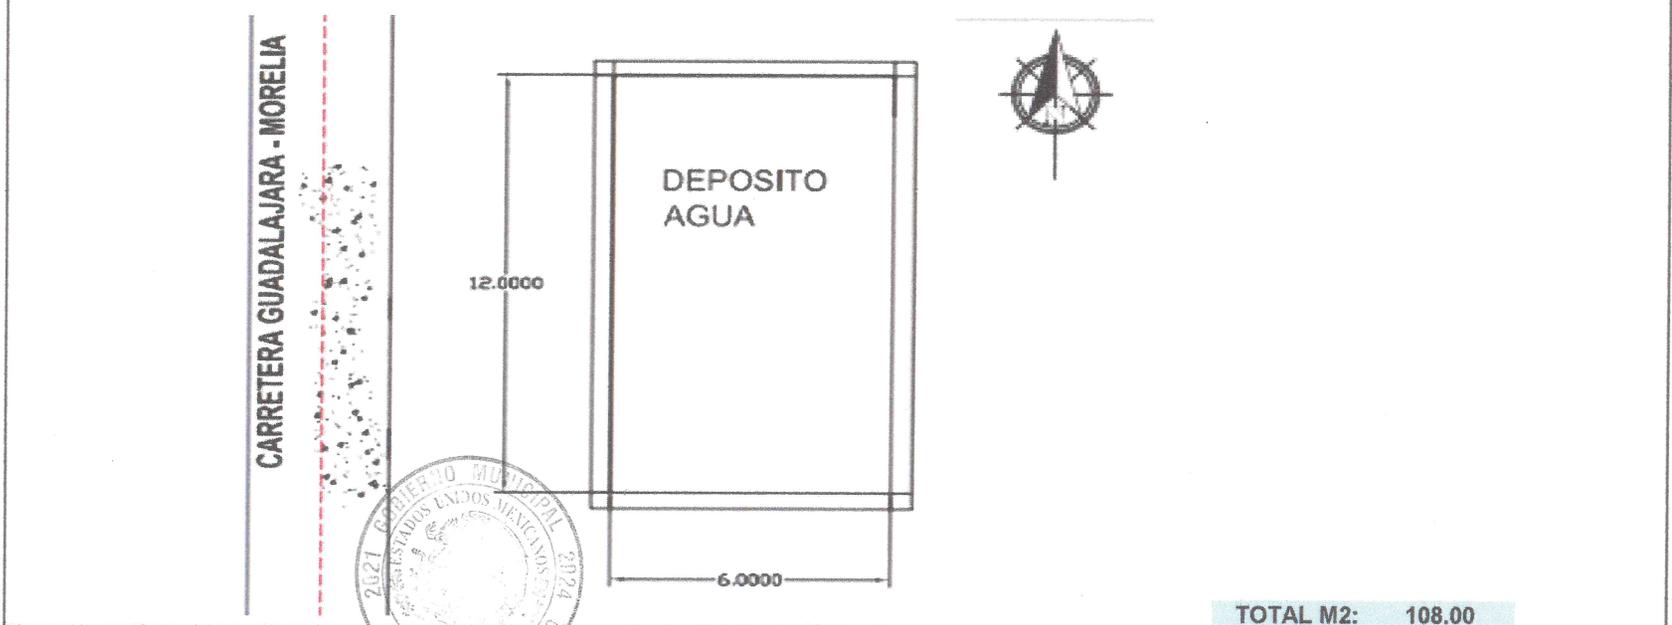


TOTAL M2: 108.00

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023	
OBRA:	OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

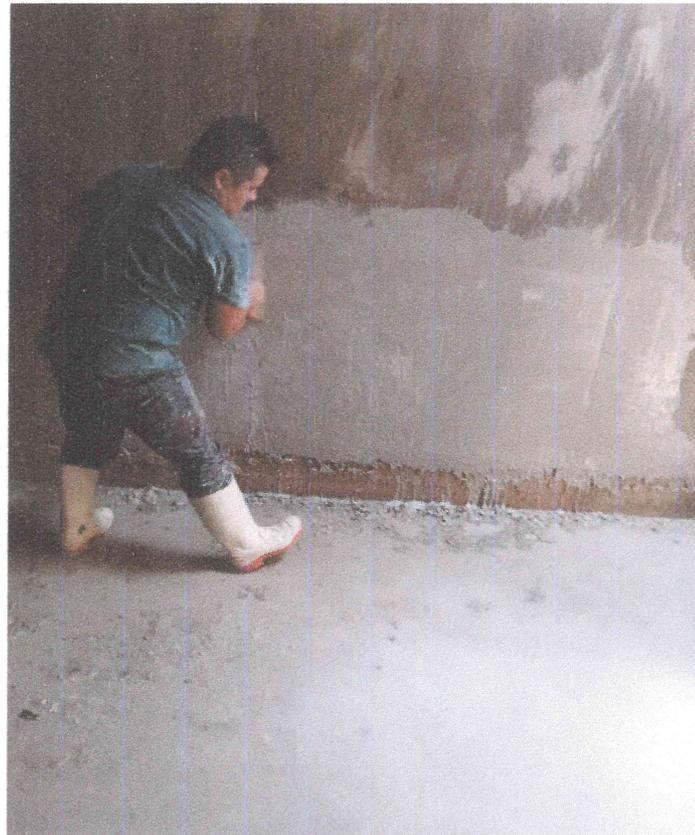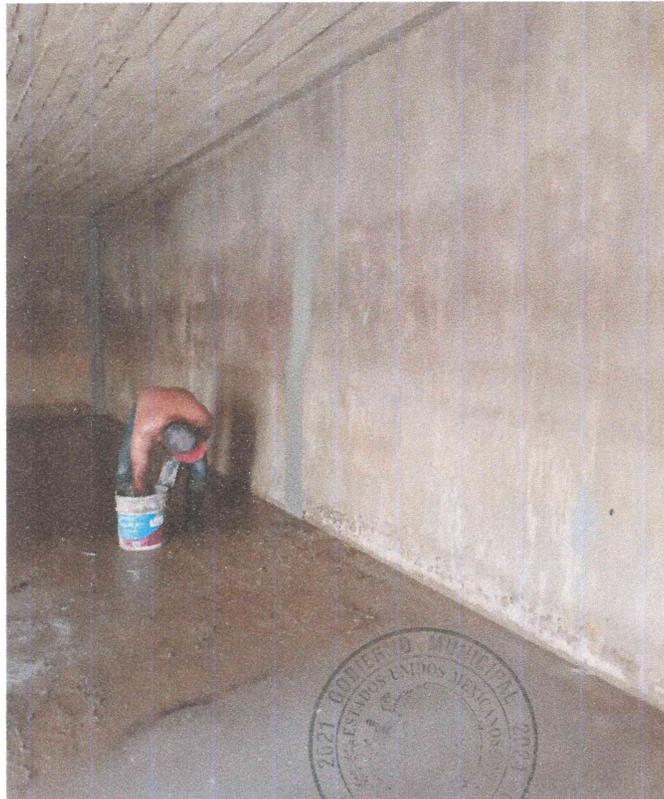

 <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR	
	 <p>SUPERVISOR DE OBRA</p>	 <p>RESIDENTE DE OBRA</p>	

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"



LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

CROQUIS

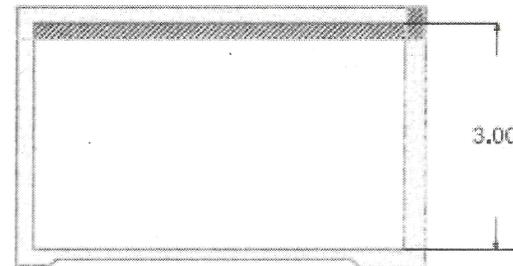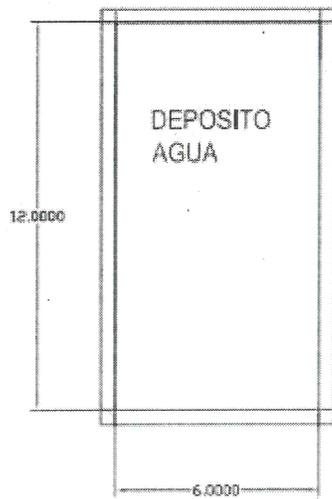

ALZADO



ARQ. JAIME CONDE GOMEZ



SUPERVISOR DE OBRA

C. JUAN MORA AGUILAR

Juan Mora
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA: OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023



NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO EN IMPERMEABILIZACIONES PARA DAR ESTRUCTURA A CAPA MEMBRANA, COLOCADO Y ADHERIDO SOBRE PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	ABUND.	TOTAL
MURO NORTE	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO SUR	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO PONIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00
MURO ORIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00


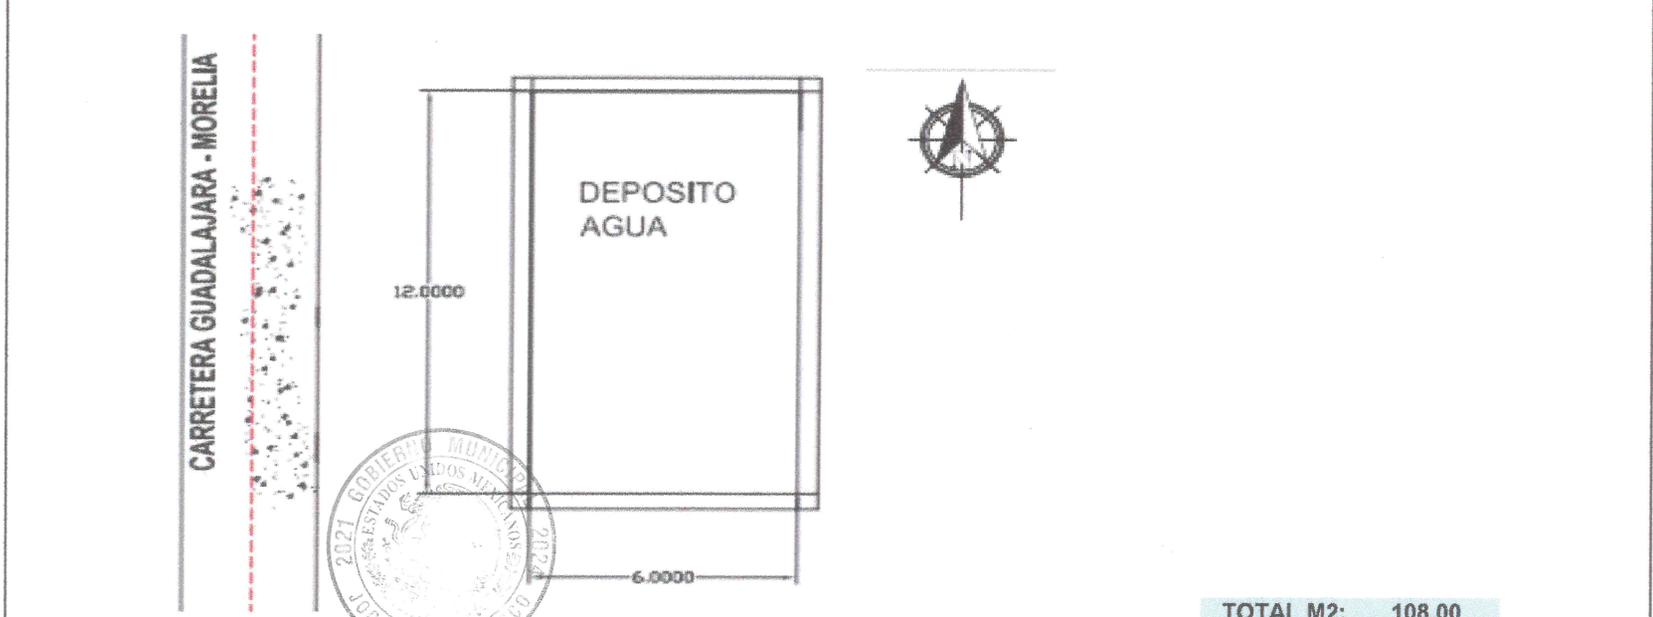


TOTAL M2: 108.00

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR
	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA

	FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023	0
OBRA:	OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"	
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL		ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023	

ARCHIVO FOTOGRAFICO

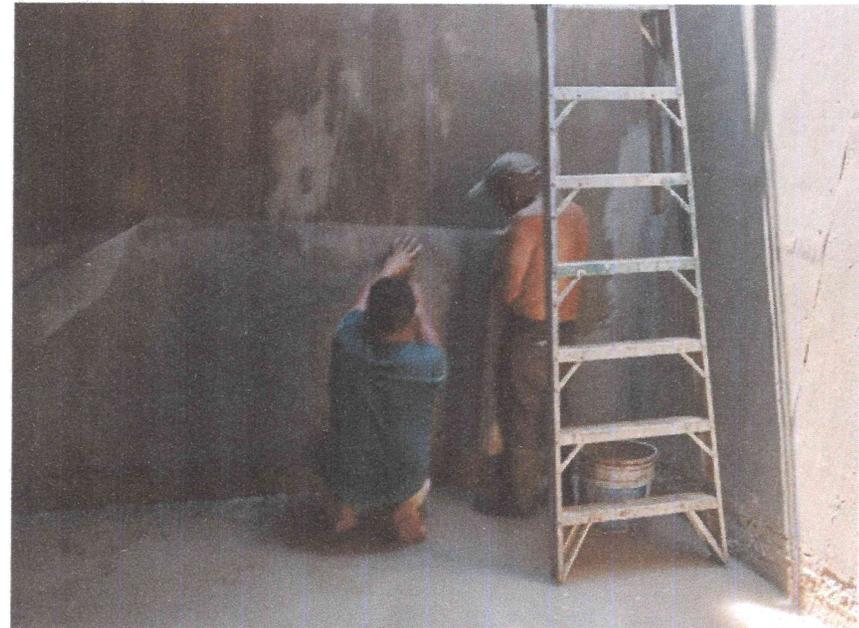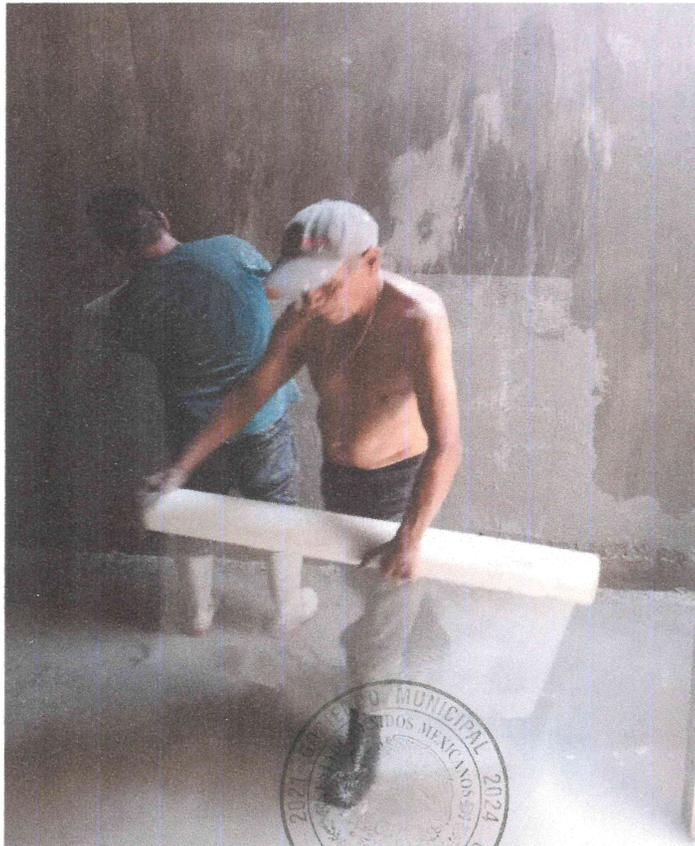


	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA	

FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2023	0
OBRA:	OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"	

LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN:	No. 1 UNICA
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

CROQUIS

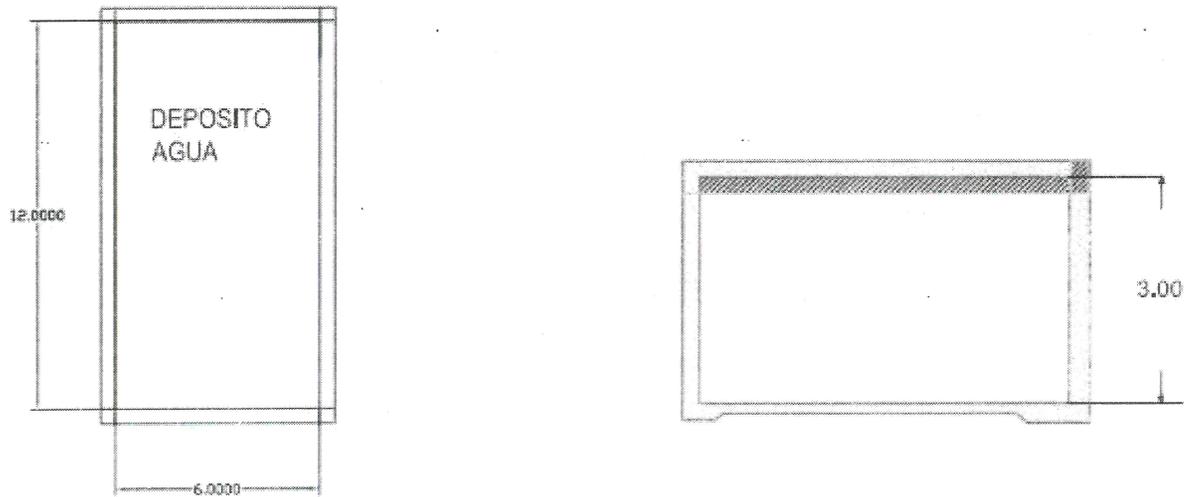

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA

C. JUAN MORA AGUILAR

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA:

OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO SIKALASTIC 1C, APLICADO SOBRE MALLA DE REFUERZO A UNA MANO CON RODILLO Y BROCHA, REFORZANDO EL SELLO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	ABUND.	TOTAL
MURO NORTE	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO SUR	6.0000		3.0000	1.00		18.00
MURO PONIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00
MURO ORIENTE	12.0000		3.0000	1.00		36.00

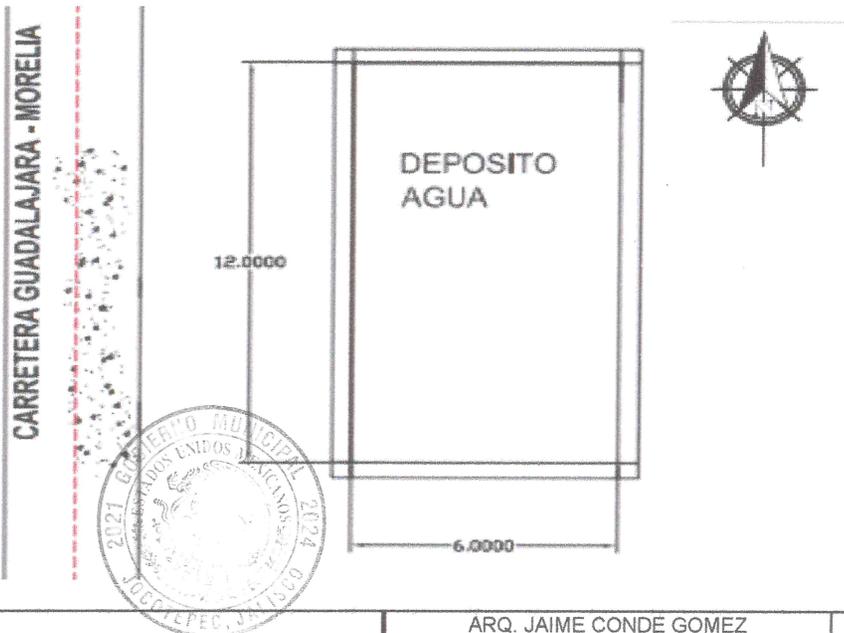

TOTAL M2: 108.00

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR
	 SUPERVISOR DE OBRA	 RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

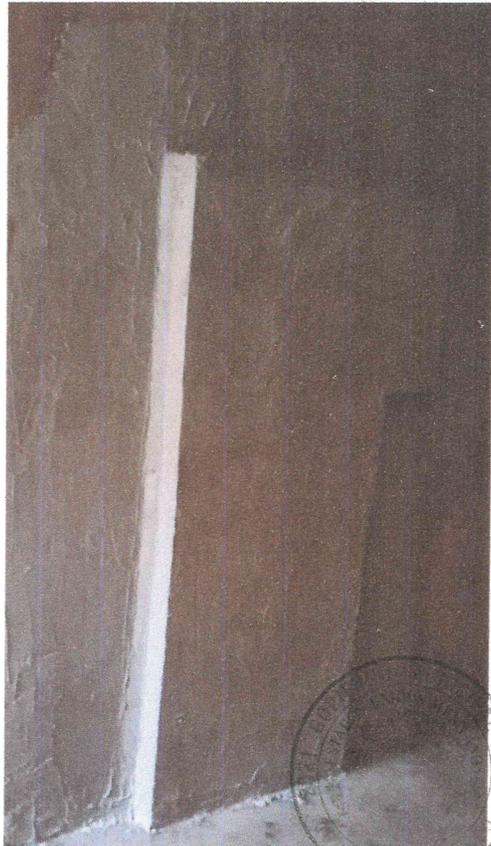


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ



SUPERVISOR DE OBRA

C. JUAN MORA AGUILAR



RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"



LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023


CROQUIS

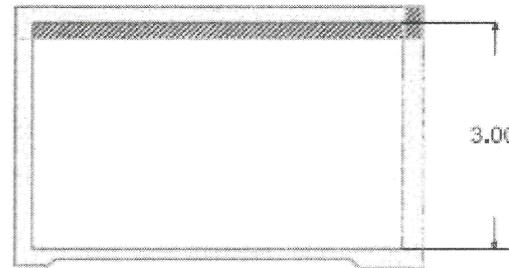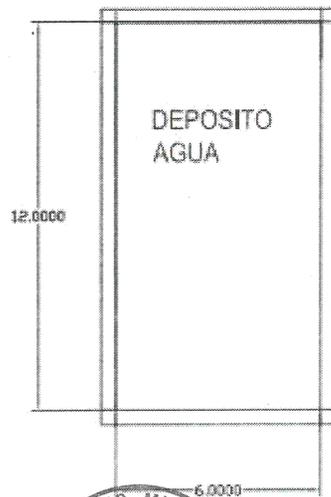

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

C. JUAN MORA AGUILAR


SUPERVISOR DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

OBRA:

OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS INCLUYE: RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS GENERADOS PRODUCTO DE DESARROLLO DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	PZA.	ABUND.	TOTAL
AREA INTERIOR TANQUE	12.0000	6.00000		1.00	1.00	72.00
PERIMETRO TANQUE	36.0000	1.0000		1.00	1.00	36.00

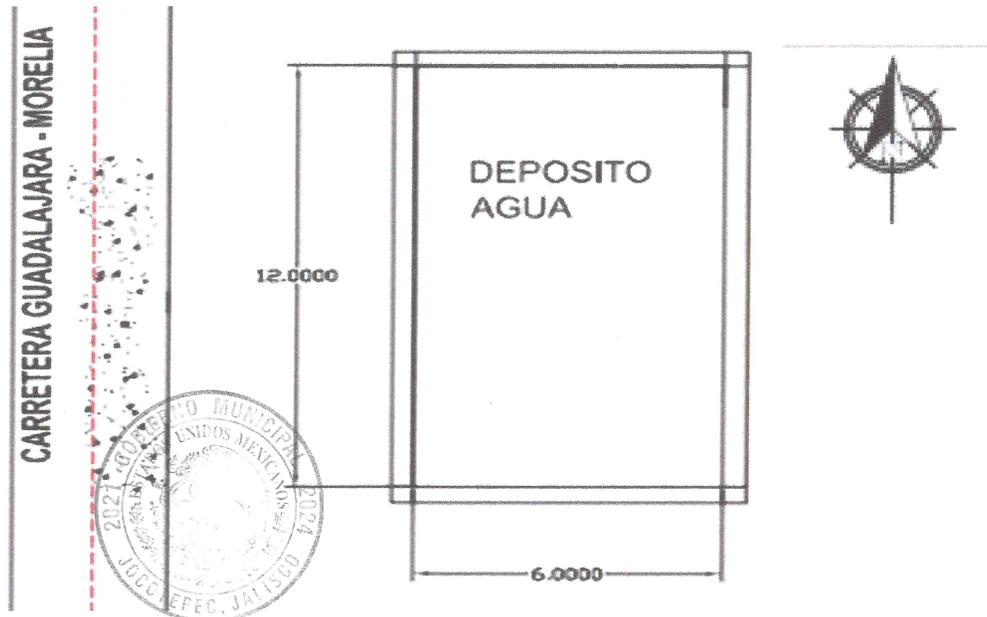

TOTAL M2: 108.00

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

C. JUAN MORA AGUILAR

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

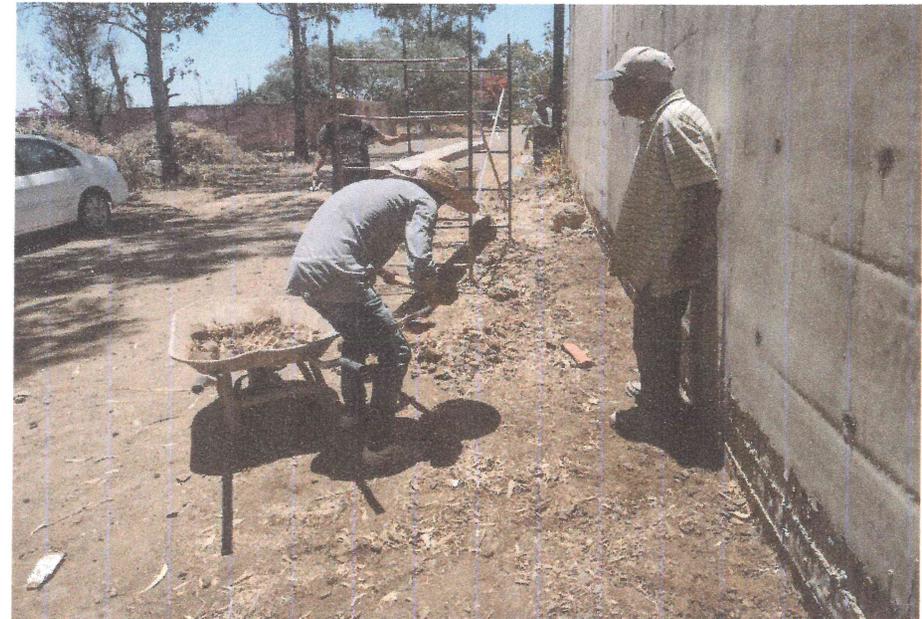



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA

C. JUAN MORA AGUILAR

Juan Mora
RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023			
OBRA:	OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"		
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA		
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023			
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.			
NUMEROS GENERADORES			
CONCEPTO:	REPARACION DE OQUEDADES MAYORES EN MURO DE CONCRETO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE: DEMOLICION PARCIAL DE AREA POROSA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO, COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, COMPLEMENTADO CON ADHESIVO EXPANSIVO TIPO GROUT E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
PROCESOS DE CONCEPTO (deglose)	LARGO ANCHO PROM. ALTURA PZA. SUBTOTAL TOTAL		
ESCARIFICADO Y REBABEO MURO (lado superior)	12 6 0.3 2 7.2		
(lado inferior)	12 6 0.4 2 9.6		
	6 0.3 1 1.8 22.2 M2		
colocacion de primario sikalatex para adhesion	12 6 0.3 2 7.2		
(lado inferior)	12 6 0.4 2 9.6		
	6 0.3 1 1.8 22.2 M2		
colocacion de mortero epoxico de reparacion	12 6 0.3 2 7.2		
(lado inferior)	12 6 0.4 2 9.6		
	6 0.3 1 1.8 22.2 M2		
TOTAL LOTE: 1.00			
	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR	
			
	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	



FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

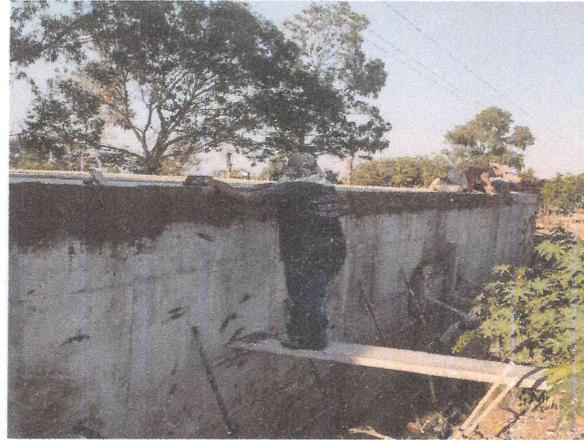

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ



SUPERVISOR DE OBRA

C. JUAN MORA AGUILAR



RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS





OBRA: OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE" FECHA: 0 0


LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

CROQUIS

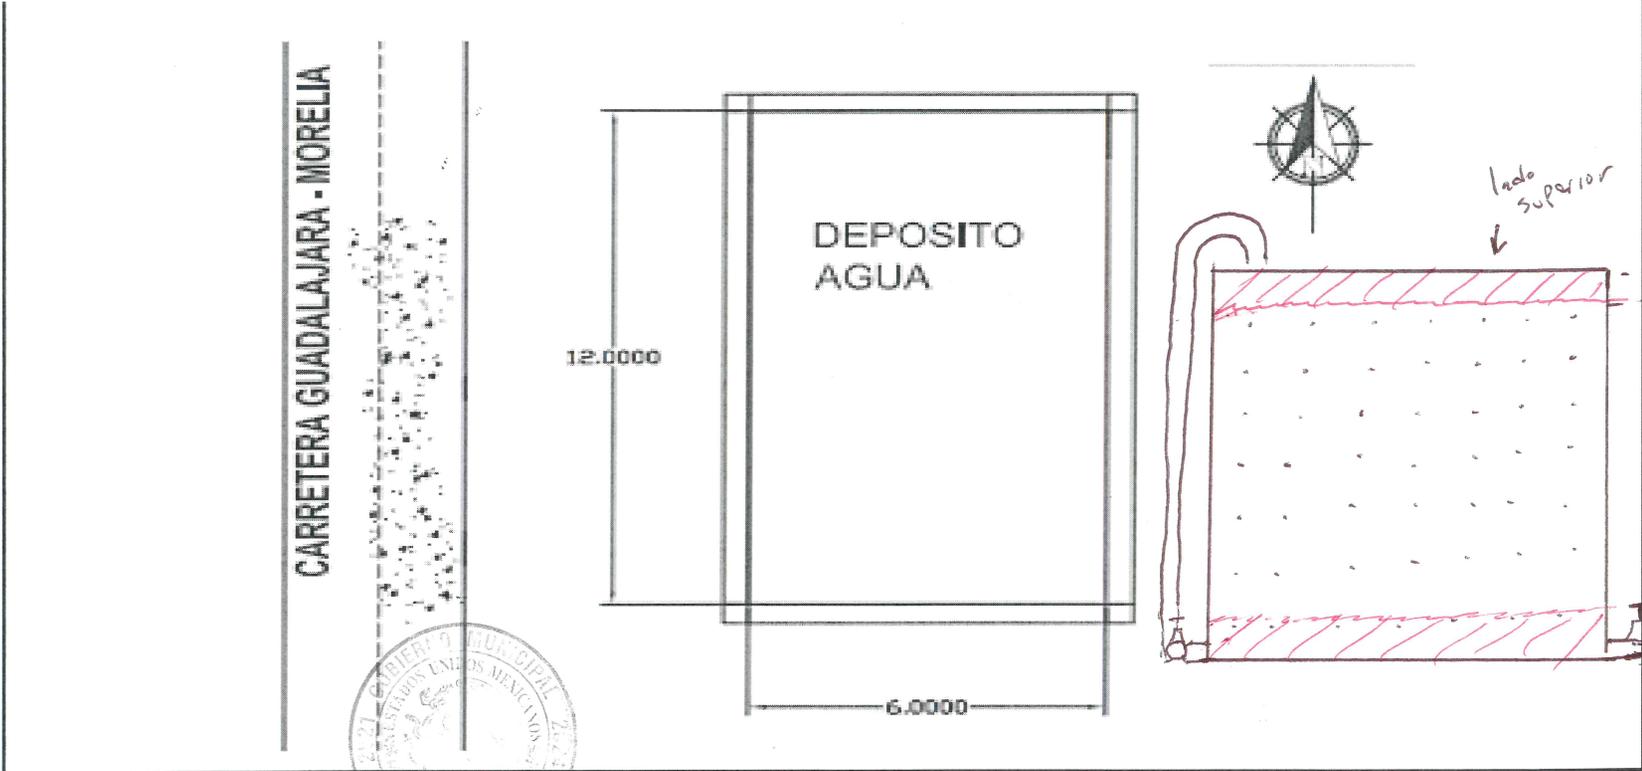

	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. JUAN MORA AGUILAR	
			
	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	



FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023	
OBRA:	OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023
NUMEROS GENERADORES	
CONCEPTO:	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE MURO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO, , INCLUYE: DEMOLICION DE SECCION DE MURO POROSA E INCORRECTA CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO, COLADO CON CONCRETO-GROUT (MORTERO EXPANSIVO) EN PROP. 6:4 HECHO EN OBRA, COMPLEMENTADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLOCACION DE ADHESIVO SIKADUR -32 GEL (RESINA EPOXICA) PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, REFUERZO PERIMETRAL CON ZAVALETA CON MATERIAL MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL SIKATOP 122, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PROCESOS DE CONCEPTO (deglose)	LARGO ANCHO PROM. ALTURA PZA. SUBTOTAL TOTAL
DEMOLICION MURO	0.9 1.9 1 1.71
	0.4 0.4 1 0.16 1.87 M2
escarificado de muro de concreto (perimetro)	5.6 0.1 2 1.12 1.12 M2
cimbra y descimbra de elemento	1.1 2.1 2 4.62
(perimetro alzado)	0.4 0.5 2 0.4
(perimetro alzado)	5.6 0.1 2 1.12 6.14 M2
aplicación sikadur 32 gel para union (muro)	6.3 0.3 1 1.89
(perimetro alzado)	5.6 0.1 2 1.12 3.01 M2
concreto-grout, c/imperm. integral (reposicion muro)	0.9 0.3 1 0.513
(complemento alzado)	1.1 0.1 2 0.462
	0.5 0.1 2 0.04 1.015 M3
zavaleta perimet. epoxico de reparacion sikatop 122	5.6 2 11.2 11.2 ML
sello de poro y recubrimiento con sicalastic 1c	1.1 2.1 1 2.31
	0.4 0.5 1 0.2
	5.6 0.1 2 1.12 3.63 M2
TOTAL LOTE: 1.00	
	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ  SUPERVISOR DE OBRA
	C. JUAN MORA AGUILAR  RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

0

OBRA:

OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"





LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

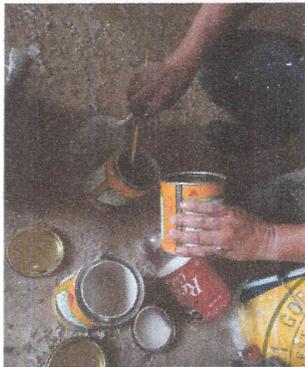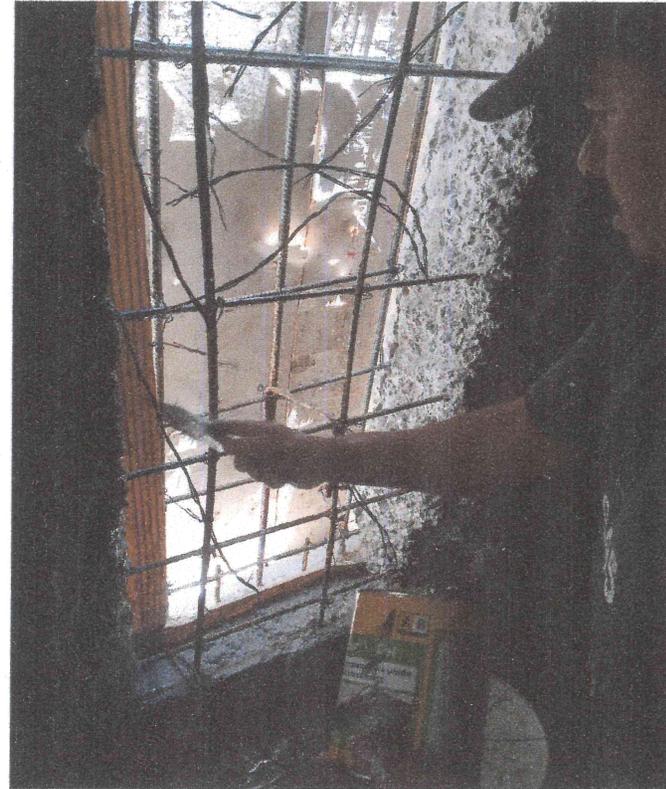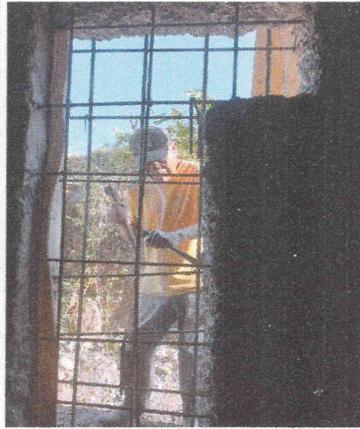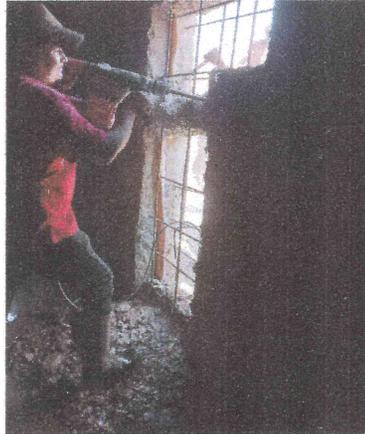

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

C. JUAN MORA AGUILAR



Juan Mora



SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

OBRA:	FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023	0
OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"		
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023	

ARCHIVO FOTOGRAFICO

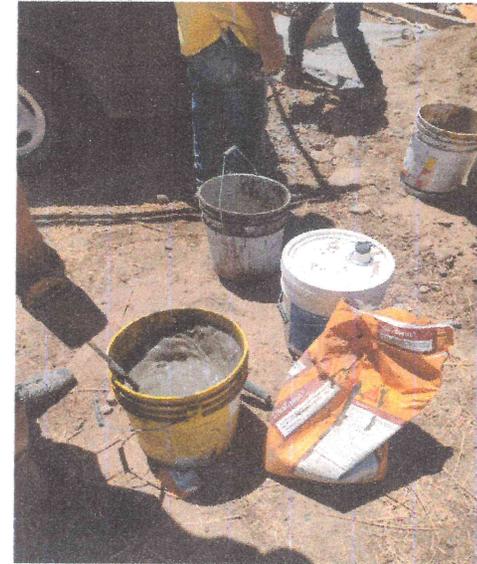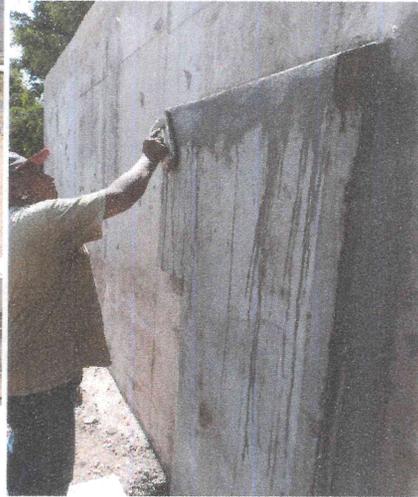

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA


C. JUAN MORA AGUILAR

RESIDENTE DE OBRA



OBRA:		FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2023	0
		OBRA: "REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"		
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023	ESTIMACIÓN:
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.			0

ARCHIVO FOTOGRAFICO

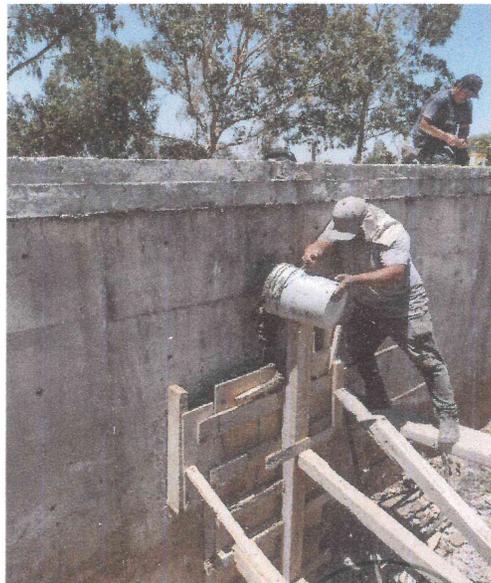

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA


C. JUAN MORA AGUILAR

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

OBRA:	FECHA:	0	0
OBRA:"REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE"			
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	ESTIMACIÓN: No. 1 UNICA		
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023		

CROQUIS

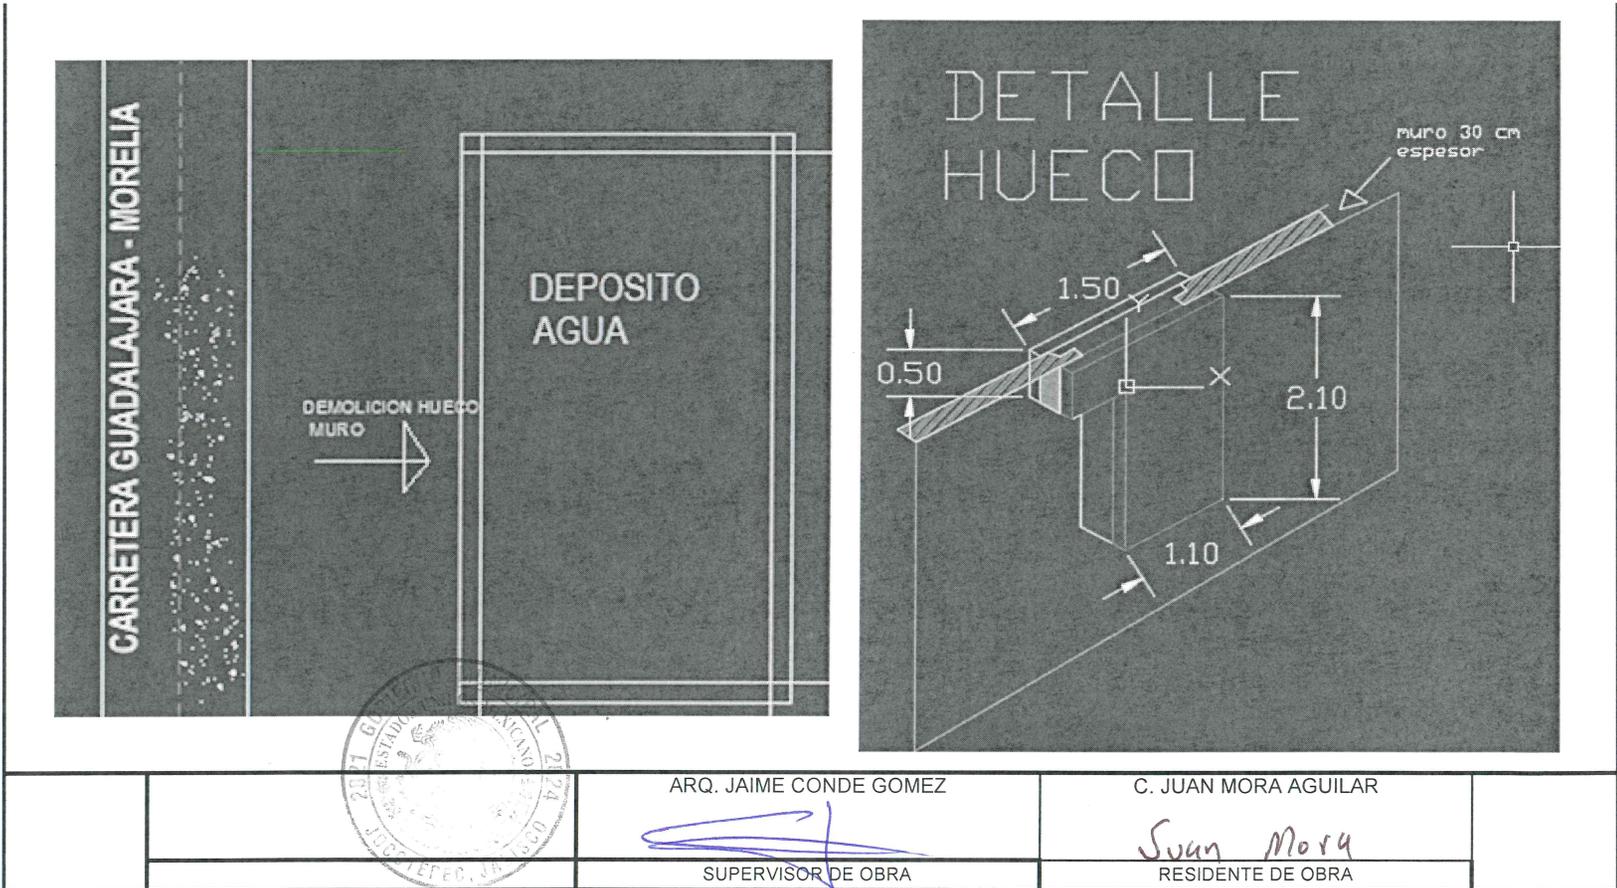

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ



SUPERVISOR DE OBRA


C. JUAN MORA AGUILAR



RESIDENTE DE OBRA



DETALLE HUECO

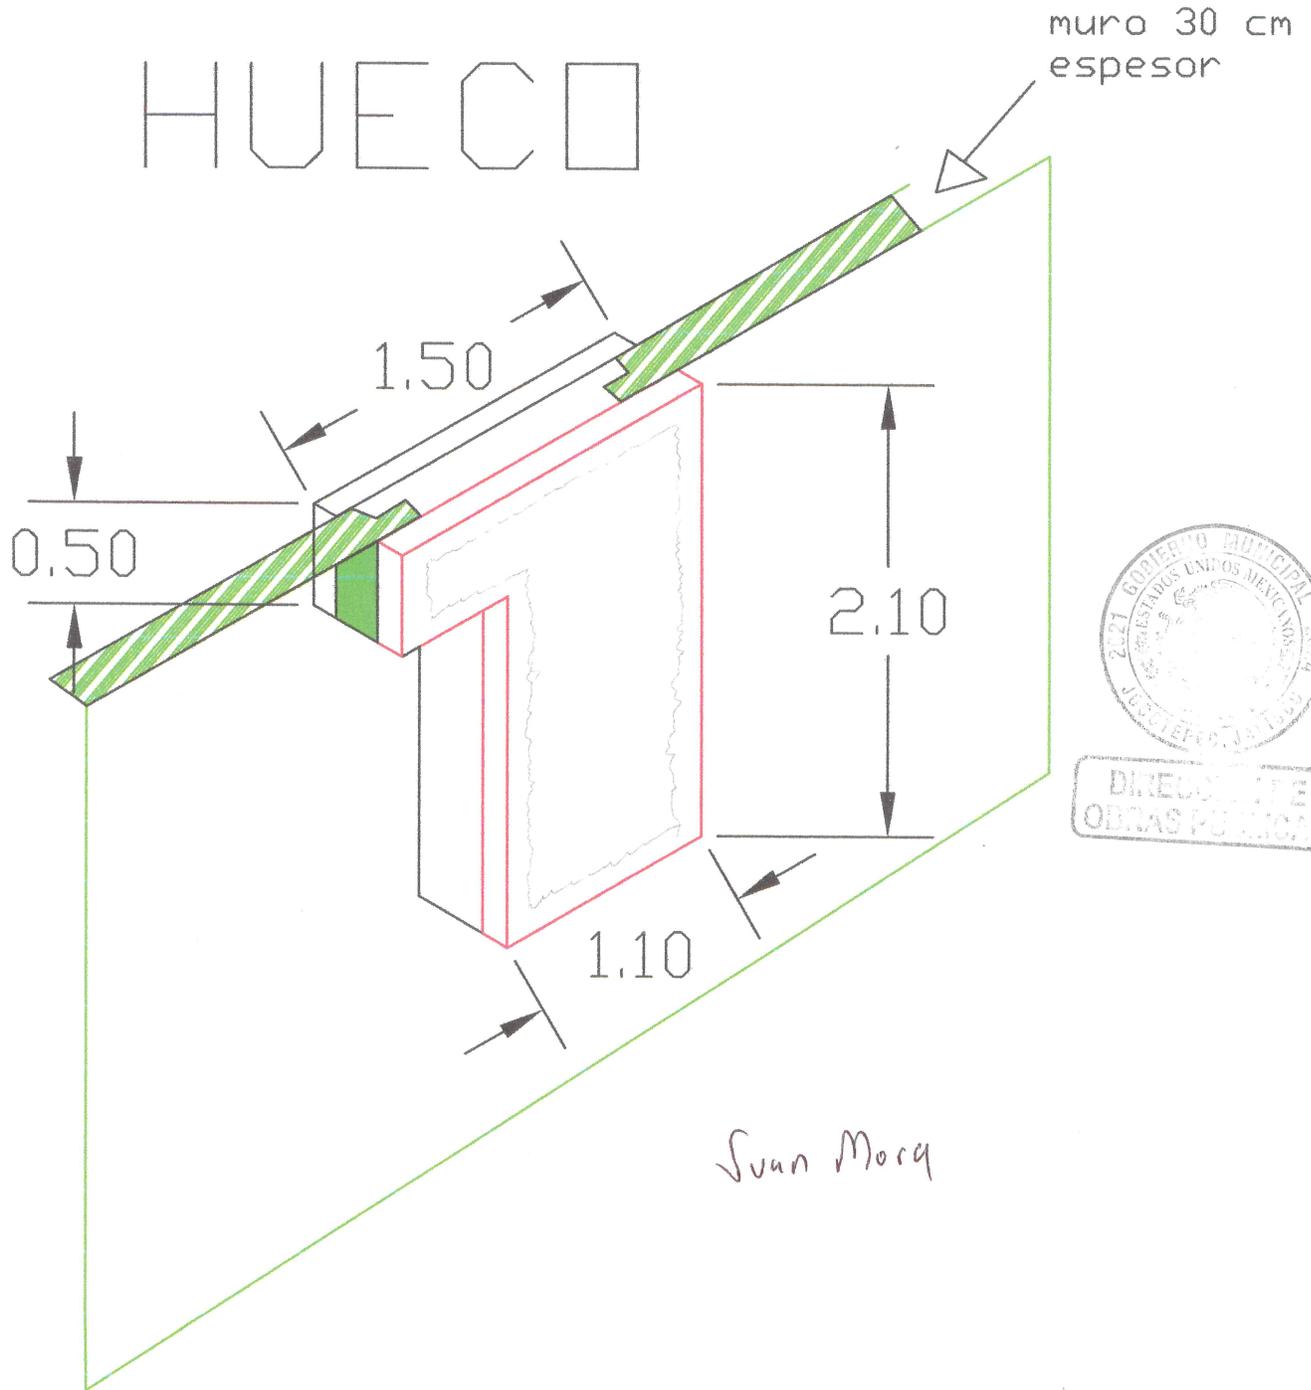

Juan Mora
