



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 0365/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **EDUARDO VENTURA PADILLA.**, por la cantidad de; **\$92,541.66 (Noventa y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 66/100 M.N.)** por concepto del **ESTIMACIÓN 02 y Finiquito**, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LO LACALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6231-2-11.1-050-402

Contrato: GMJ 001C- OP/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
1688	08/04/2024	\$80,250.80	\$93,090.93	\$549.27	\$92,541.66

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 02 y Finiquito
4. Fianza Vicios Ocultos
5. Minuta Término de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., A 16 DE ABRIL DEL 2024

"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"



HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024

26 ABR. 2024

RECIBIDO

GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Tú decides mejorar

Hidalgo Sur No.6, Colonia Centro Jocotepec, Jalisco.

C.c.p. Archivo

D.O.P./cvch

**EDUARDO VENTURA PADILLA****RFC: VEPE781012JM7**Francisco I. Madero No. 22 Col: S/C C.P:47940 La Ribera
Municipio: Ayollán Estado: Jalisco País: México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47940
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso del Cfdi: G03 - Gastos en general.

CLIENTE		FACTURA:	- 1688
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		Folio Fiscal:	46E99790-1E64-451C-AB03-3AA5AB22AC75
RFC: MJJ850101KP8		Fecha:	8/4/2024 17:32:18
Dirección: Palacio Municipal No. S/N, Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México		Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48	72141003	Estimación 2 (FINIQUITO) de la obra: Estimación dos de la obra "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. No. DE CONTRATO: GMJ001C-OP/2024 MENOS 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO \$549.27 NETO A PAGAR \$92,541.66	80,250.8000	002 - IVA - 12,840.13	80,250.80

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506482489	Subtotal:	80,250.80
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236	I.V.A.:	12,840.13
Fecha y hora de certificación: Abril 8 2024 - 17:32:21	TOTAL:	93,090.93
Este documento es una representación impresa de un CFDI	Importe con letra:	NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS 93/100 M.N.
CFDI Relacionado:		
Tipo Relación: -		
CFDI Relacionado:		

**Sello Digital del CFDI:**

EQWGBoh+Hy8cdwX5SHKq4p7vWjg5s+kyNCC/L5rgvVTRikmFCq2xAmWGMW6qUTxm4R3DPAosRY1tyLXAIBYN
AakK0A66lxZNMhonorwguORritik4nmWvUo3HXz81/uuizBatgiup244xSr0DsR6ooEZ/Cq0vcWifAw4+UGZZ13a
Is4Jwew1BM1M9Dncspmb93kulQhGyGUQ8e29FIBuGipNUyHM1G33foLE/UyhVqrqUnpf21NF3o8LFWhfVJNK
PKs9SsIZ/r0yoIQeYodTAgDkCawpdnplbsPv12C+kSgESltcYWNgrKTGigB5x4mnZIEjIMQKI9fYKdsTw==

Sello del SAT

DswlCp/G2b6b4mGVv7TyFhKskNZ5X1rsHRFJ+Oq048m6+Alub0jVgyOjNvSWCnKUrpcRaxjTW5c2Gta
zqkmpDc2SzG28Eyxv3XCP778mrwg7+mTY8+5zKXQseOdPZmRCsbd1uMuG5aT9D6meuylda/coMpzF
onzZjh7foNUWPPYIPg7Ycx5BwGvENBYBy78SYTQeDK7FKPor6onBdi+MGXCTYzbpFxiMjG1dZ61WIFM
QFSMI9L9DSEZM1VtCbvx+HdesF5eJ8Yct22LbwyslyUEdbRN/Wlue80eHlYouYQypEkrPIshvROPnhqa
ryZiFCBQBw9KQqmK4JO2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|46E99790-1E64-451C-AB03-3AA5AB22AC75|2024-04-08T17:32:21|MAS0810247C0|EQWGB
Boh+Hy8cdwX5SHKq4p7vWjg5s+kyNCC/L5rgvVTRikmFCq2xAmWGMW6qUTxm4R3DPAosRY1tyLXAIB
YNAakK0A66lxZNMhonorwguORritik4nmWvUo3HXz81/uuizBatgiup244xSr0DsR6ooEZ/Cq0vcWifAw4
+UGZZ13aIs4Jwew1BM1M9Dncspmb93kulQhGyGUQ8e29FIBuGipNUyHM1G33foLE/UyhVqrqUnpf21N
fF3o8LFWhfVJNKPKs9SsIZ/r0yoIQeYodTAgDkCawpdnplbsPv12C+kSgESltcYWNgrKTGigB5x4m
nZIEjIMQKI9fYKdsTw=|00001000000505142236|]

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1688"
Fecha="2024-04-08T17:32:18"
Sello="EQWGBoh+Hy8cdwXS5HKq4p7vWjg5s+kyNCC/L5rgvVTRikkmeFCq2xAmWGMW6qUTxm4R3DPAosRY
1tyLXA18YNAakK0A661xZNmhonwguORritik4nmWvUo3HXz81/uuiZ8atgiup244xSr0DsR6ooEZjCq0vcw
lfAw4+UGZZ13aIx4Jwew1BM1M9DncspmIb93kuIQhGyGUQ8e29FIBuGipNUyHM1G33foLE/UyhVqrqUnpf2
1NFF3o8LFWhfVJNkPKs9SsiZ/r0yoiq0eY0dTagDkCawpdnpIbsPYv1ZC+kSgE51tcYWNgrKTGigBSx4mn
ZlEjimQKi9fYKdsTw==" FormaPago="03" NoCertificado="00001000000506482489"
Certificado="MIIF2jCCA8KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY0ODI0ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GEMSAwHgYDVQQDDBdVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUGURNS
U5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUYBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B
CQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4
gR1VFU1JFUK8x4JAMBgNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBcGA1UECAwQ01VREFEIERFIE1FWE
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQKCE
01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1Mg
QUwgQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTAyMTgyMjU4NThaFw0yNTAyMTgyMjU4NThaMIGoMSAwHgYDVQQDExd
FRFVBURKRP1FZFTlRVUKEgUEFESUXMQTEgMB4GA1UEKRMXRURVQVJETyBWRU5UVVJBIFBBRE1MTEExIDAeBg
NVBAoTF0VEVUFVSRE8gVkvOVFVSQSBQURJTEBMRyYwFAYDVQQQTew1WRVBFNzgxMDEySk03MRswGQYDVQQFE
xJWRVBFNzgxMDEySERGTkREMduXczAJBgNVBAsTAk5BMiIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAgslVZetWo5zg41sr2+MUXZfGJ4W8YutM9CsLqkFkiFBvY0Ik4iyD6fXTobjSmiKxrdEhjPnmnA2yvdf
gRghHegyxotXhbUb+XJKsKj1zJfKHfiE2uC8mqVHe0jgCqc+kP/atHvEaJm5q4XStKn68R5lotyuxRXL1en
kKrIurvWmsGhnddCKtnZWFGg+18HK88sxPyvOpFFwuPuCV8TAyXPPfgI0oWfyj5vtwV51Sa7BD7m9o8AKpG
P0tePf58tm7vrXnt32Wmbz4Vv8avpaHwW7eghRbsYvhQM3WHoYqCCPJTTq3NH9n4eCCJUyuEYJuvo8hbpr2
+/I7n79Lp8dGQWIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAJAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAO
CAGEAubHAYsVG+j8y6j0SfIFCmDAGcY+UUsFoGxwQ3RNMofCXzuQmXsOVkAqNa5ESw4521rOf3YjFAMFP1
8WJ9lwoj9MzA7eYRK1SVoeaD9C55FI6e0FCY77s3J4m1Yn3RIjwcoPVUiiwIo46ESolYlkfiQw/0J6ktViGF
WRckESiWMR2+zDROUZ3RscUknspLB4h9UwOz/YVX/ke6dB3fdj6iTBly2rt7d+eeg2tt1IbF5h2cBGN8ESY
Kvyw5+wDgG17atprze9AgJ2fVCL3AnX3UZxYKfTR7Tkr5eGs9z801LKjq5LHGrqgnxGeMIB4ost4tGhDEtn
zsPXM6qC111Tx64OSkzFPaaLh3VC72xXnz6wYYeJ/+Yz+TRMLuosWaMEUPToGR9hirTnhn4Ndo9aFvQZzF4
cb/yMDDmZ94Q+qPVAJhkaRNz1/06CeOKt+w0ZhsXiP10vnSoBg10L1Bd1j2LF1hZ4ymCkZJMW1GzZaRsFmP
5f8Ob510Fbi0v0YZFhx+w+ySaRj0s+j8mCvRgw/xHkE9eanjhmX9Deh3NGW0kwcGHjrFwcGsjXW95Mb2ppZ
MaOT1MI0zKX2hc3vjAHxljjSUX479fpF08SOMQUuS0onJHh7kUwjUmdco1WgWXVHX0n83CpLMUQ6vW3V0Y
xU4bWgAPnwNyu3S5uVbiAARU=" SubTotal="80250.80" Moneda="MXN" Total="93090.93"
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="47940"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="VEPE781012JM7" Nombre="EDUARDO
VENTURA PADILLA"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO
DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141003" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.0000" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="314" Descripcion="Estimación
2 (FINIQUITO) de la obra: Estimación dos de la obra
"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA";, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



DIRECCION DE
ESTIMACIONES
PUBLICAS

No. DE CONTRATO: GMJ001C-OP/2024 MENOS 5 AL MILLAR PARA
CONTRALORIA DEL ESTADO \$549.27 NETO A PAGAR \$92,541.66" ValorUnitario="80250.80"
Importe="80250.80" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado

Base="80250.80" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="12840.13"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concep
tos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="12840.13"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="12840.13"
Base="80250.80"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFis
calDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="46E99790-1E64-451C-AB03-3AA5AB22AC75" FechaTimbrado="2024-04-08T17:32:21"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="EQWGBoh+Hy8cdwXS5HKq4p7vWjg5s+kyNCC/L5rgvVTRIkkmeFCq2xAmWGMW6qUTxm4R3DPAo
sRY1tyLXA18YNAakK0A66lxZNmhonwguORritik4nmWvUo3HXz81/uuiz8atgiup244xSr0DsR6ooEZjCq0
vcWlfAw4+UGZZ13aIx4Jwew1BM1M9DncspmIb93kuIQhGyGUQ8e29FIBuGipNUyHm1G33foLE/UyhVqrqUn
pf21NfF3o8LFWfhVJNkPKs9SsiZ/r0yoiq0eY0dTAGDkCawpdnpIbsPYv1ZC+kSgE5ltcYWNgrKTGigBSx
4mnZlEjiMQKi9fYKdsTw==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="DswiCp/G2b6b4mGVv7TyFhKskNZ5X1rsHRFj+0q048m6+Alub0ijVgyOjNv5WCnKURpcRaxjT
W5cZGtAzqkmpDcZSzG28Eyxyv3XCP77Bmrwg7+mTY8+5zKXQXseOdPZzmRCsbd1uMuG5aT9D6meuylda/co
MpzFonzZjh7foNUWPYlPg7Ycx5BwGvENBYBy78SyTQeDk7FKPor6onBdi+MGXCTYZbzpfFxIMjG1dZ61WIF
MQFSMI9L9DSEZM1VtCbvX+lDesF5eJ8Yct22LbwysIyUEdbRN/Wlue80eHlYouYQypEkrPlShvROPnhqary
ZiFCBQBw9K0qmK4j02A==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

[Handwritten signature]



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEPE781012JM7	EDUARDO VENTURA PADILLA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46E99790-1E64-451C-AB03-3AA5AB22AC75	2024-04-08T17:32:18	2024-04-08T17:32:21	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$93,090.93	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

 H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: GMJ 001C-OP/2024	ESTIMACIÓN No. 2 FINIQUITO  FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2024
	CONTRATISTA: EDUARDO VENTURA PADILLA	
	OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA"	
	UBICACIÓN: SAN JUAN COSALA MPIO. DE JOCOTEPEC	

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.		PARTIDAS				IMPORTES	
A1	EQUIPAMIENTO DE POZO					\$	98,674.00
AD	ADICIONALES					\$	11,179.00
						MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 109,853.00
						MENOS AMORTIZACIÓN RESTO ANTICIPO	\$ 29,602.20
						S U B T O T A L .	\$ 80,250.80
						I . V . A . 16%	\$ 12,840.13
						SUMA	\$ 93,090.93
						MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
						MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 549.27
						NETO A PAGAR	\$ 92,541.66
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I . V . A .	TOTAL:			
ASIGNACIÓN		\$ 563,458.10	\$ 90,153.30	\$ 653,611.40		RESIDENTE DE OBRA	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN		\$ 109,853.00	\$ 17,576.48	\$ 127,429.48		CONTRATISTA	
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 464,784.10	\$ 74,365.46	\$ 539,149.56			
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 574,637.10	\$ 91,941.94	\$ 666,579.04			
SALDO EXCEDENTE		-\$ 11,179.00	-\$ 1,788.64	-\$ 12,967.64			
		AMORTIZACION DE ANTICIPO				GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GUERRERO	
ANTICIPO 30 %		\$ 169,037.43	\$ 27,045.99	\$ 196,083.42		EDUARDO VENTURA PADILLA	
AMORTIZACIÓN		\$ 29,602.20	\$ 4,736.35	\$ 34,338.55		SUPERVISOR DE OBRA	
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.		\$ 139,435.23	\$ 22,309.64	\$ 161,744.87		DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$ 169,037.43	\$ 27,045.99	\$ 196,083.42			
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ -	\$ -	\$ -		C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA	
						C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: No. 2 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 001C-OP/2024

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2024

OBRA :

"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA"

UBICACIÓN : SAN JUAN COSALA MPIO. DE JOCOTEPEC

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2024



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
9	Suministro e instalacion de MANGUERA DE Sonda DE 3/4" DE DIAMETRO, , incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	ML	230.00	230.0000	0.00	230.00	0.00	\$ 20.17	\$ 4,639.10	\$ -	\$ 4,639.10	\$ -
10	RENTA DE GRUA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA Y COLUMNA A 230M. DE PROFUNDIDAD.	PDA	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 22,472.00	\$ 22,472.00	\$ -	\$ 22,472.00	\$ -
11	ESTUDIO BACTEREOLÓGICO DEL AGUA NOM-127-SSA1-1994 COMPLETO, INCLUYE RECOLECCION DE MUESTRAS, INFORME DETALLADO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO.	ESTUDIO	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 27,832.00	\$ 27,832.00	\$ 27,832.00	\$ -	\$ -
12	Suministro e instalacion de TREN DE DESCARGA EN 3" CONFORME A DIBUJO DE PROYECTO Y ESPECIFICACION CON VALVULAS CHECK, COMPUERTA, MANOMETROS, NIPLES, BRIDAS, CARRETES, EMPAQUES, TORNILLOS, MEDIDOR DE FLUJO, ETC. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, pruebas y todo lo necesario para su correcta operacion.	PDA	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ -	\$ 49,000.00	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION EQUIPAMIENTO DE POZO									\$ 563,458.10	\$ 98,674.00		
AD ADICIONALES												
	VALVULA CHECK DE 3" FO. PARA COLUMNA CON ROSCA CONICA.	PZA	0.00	0.0000	1.00	1.00	-1.00	\$ 11,179.00	\$ -	\$ 11,179.00	\$ -	-\$ 11,179.
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION EQUIPAMIENTO DE POZO									\$ 908,663.20	\$ 11,179.00		
TOTAL									\$ 563,458.10	\$ 109,853.00	\$ -	-\$ 11,179.
EDUARDO VENTURA PADILLA CONTRATISTA			C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA SUPERVISOR DEL MUNICIPIO			C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS						



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: No. 2 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 001C-OP/2024

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2024

OBRA :

"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA"

UBICACIÓN : SAN JUAN COSALA MPIO. DE JOCOTEPEC

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2024




ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A1 EQUIPAMIENTO DE POZO													
1	COLOCACION DE SELLO SANITARIO, CIMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME, incluye: excavacion, concreto hecho en obra, materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PDA	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 8,390.00	\$ 8,390.00	\$ 8,390.00	\$ -	\$	
2	PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL TIPO PLANTILLA con 2 tubos engravadores, incluye: concreto hecho en obra, materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PDA	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 4,607.00	\$ 4,607.00	\$ 4,607.00	\$ -	\$	
3	Suministro e instalacion de TUBERIA DE 3" PARA COLUMNA EN ACERO C-40 CON COPLE Y ROSCA CONICA, incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	ML	230.40	230.4000	0.00	230.40	0.00	\$ 890.00	\$ 205,056.00	\$ -	\$ 205,056.00	\$	
4	Suministro e instalacion de KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 4, , incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	KIT	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ 1,900.00	\$	
5	Suministro e instalacion de CABEZAL DE DESCARGA Y PLACA DE 1", CON CODO BRIDADO SOLDABLE EN ACERO A 90 GRADOS, , incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 15,080.00	\$ 15,080.00	\$ -	\$ 15,080.00	\$	
6	Suministro e instalacion de BOMBA SUMERGIBLE DE 4 LPS. / 25 HP. MARCA ALTAMIRA EN ACERO INOXIDABLE 440V. , incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	LOTE	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 89,837.00	\$ 89,837.00	\$ -	\$ 89,837.00	\$	
7	Suministro e instalacion de ARRANCADOR MARCA SIEMENS DE 25H.P. PARA 4L.P.S. , , incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 57,845.00	\$ 57,845.00	\$ 57,845.00	\$ -	\$	
8	Suministro e instalacion de CABLE PLANO SUMERGIBLE CAL 3 x 4 ALTAMIRA O SIMILAR 600V. , incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	ML	240.00	240.0000	0.00	240.00	0.00	\$ 320.00	\$ 76,800.00	\$ -	\$ 76,800.00	\$	

EDUARDO VENTURA PADILLA

Donner



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA
Carpetas Asfálticas y Riegos de Sello
R.F.C. VEP071012IM7 CURP VEP071012HNNHNS C.I.F.E. 30306
FRANCISCO I. MADRERO No.22 S.C.P. 47940 LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN JALISCO
TEL: 01 (56) 563245 CEL: 5521983412 MAIL: s2bucave@hotmail.com


GENERADOR DE OBRA

PERIODO DE EJECUCION: 15 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:	EQUIPAMIENTO DEL POZO CALLE GUADALUPE VICTORIA EN SAN JUAN COSALA.	CONTRATISTA: EDUARDO VENTURA PADILLA				NÚMERO DE ESTIMACIÓN:	2 FINIQ.
CONTRATO:		FECHA:	22 DE FEBRERO DEL 2024.				

CLAVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	PROF.	PIEZA	VOLUMEN	UNIDAD	UBICACIÓN
1	COLOCACION DE SELLO SANITARIO, CIMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME					1.00	PDA	
Total este concepto						1.00		

CROQUIS Y ESPECIFICACIONES

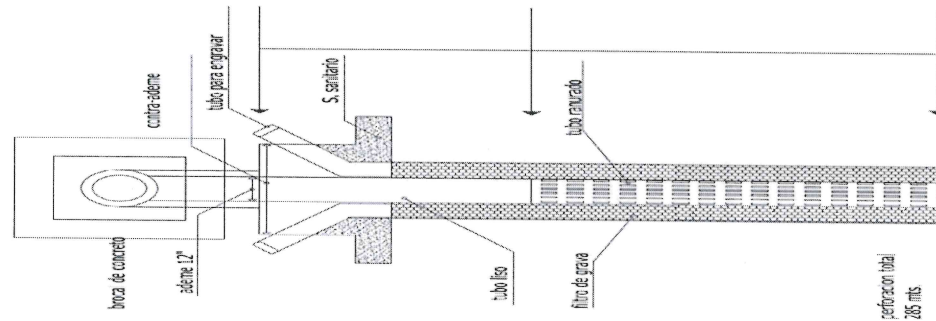


EDUARDO VENTURA PADILLA

SUPERVISOR	
 C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA SUPERVISOR DE OBRA	 C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA
Carpetas Asfálticas y Riegos de Sello
R.F.C. VEPUN012001 CURP VEPUN012001EDUOS C.F.E.E. 30306
FRANCISCO I. MADRERO 3632 S.C. CP. 6740 LA RIBERA NPO DE AYOTLAS JALISCO
TEL. 01 056 343011 CEL. 3331003401 MAIL: e2bentura@hotmail.com

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2024.

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA."

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA


ESTIMACION: No.2 FINIQ.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2024.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PARTIDA: 1

ARCHIVO FOTOGRAFICO

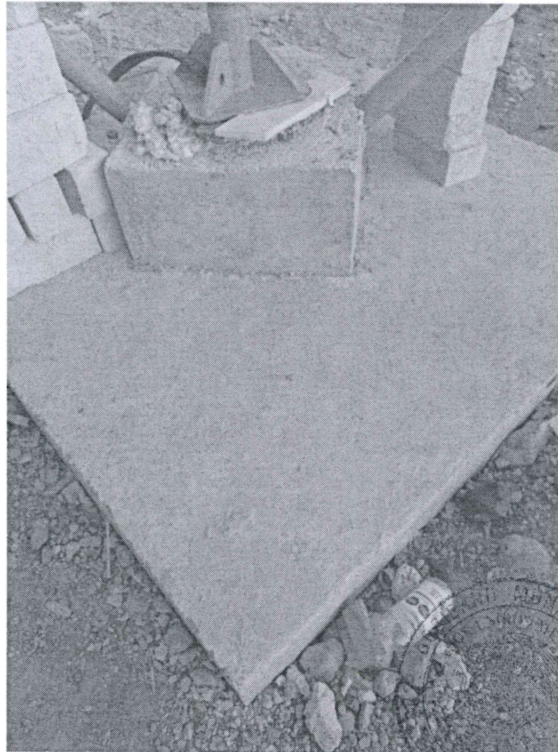

Daniel Rodriguez Valenzuela

C. DÁNIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EDUARDO VENTURA PADILLA




C. GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GUERRERO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA
Carpetas Asfálticas y Riegos de Sello
R.F.C. VEPE781012B47 CURP VEPE781012B47N0005 CLFE 30006
FRANCISCO I. MADERO No. 27 S.C. P. 47940 LA RIBERA MPO DE AYOTLAN JALISCO
TEL: 91 (540) 5432615 CEL: 3321068442 MAIL: eduardoventurapadilla@gmail.com


GENERADOR DE OBRA

PERIODO DE EJECUCION: 15 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:	EQUIPAMIENTO DEL POZO CALLE GUADALUPE VICTORIA EN SAN JUAN COSALA.	CONTRATISTA:	EDUARDO VENTURA PADILLA	NÚMERO DE ESTIMACIÓN:	2 FINIQ.
CONTRATO:		FECHA:	22 DE FEBRERO DEL 2024.		

CLAVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	PROF.	PIEZA	VOLUMEN	UNIDAD	UBICACIÓN
2	PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL TIPO PLANTILLA					1.00	PDA	
Total este concepto						1.00		

CROQUIS Y ESPECIFICACIONES

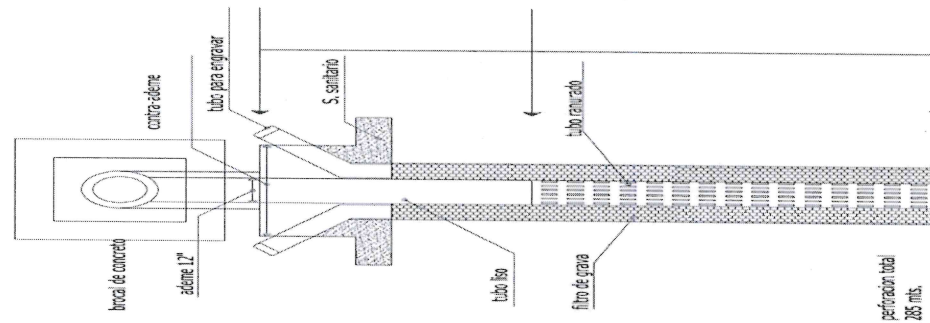

SUPERVISOR	
 C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA SUPERVISOR DE OBRA	 C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2024.

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA."

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA


ESTIMACION: No.2 FINIQ.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2024.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PARTIDA: 2

ARCHIVO FOTOGRAFICO

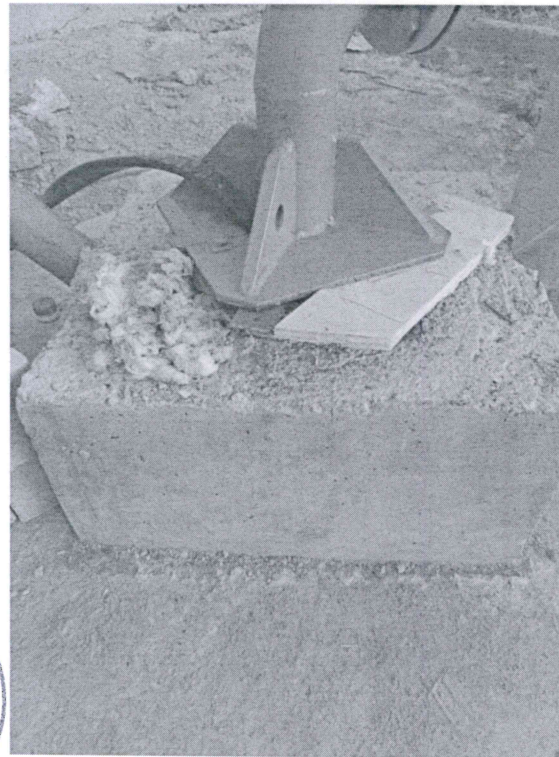

Donal Rodman V.

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA



DIRECCION DE
BIBLIOTECAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

GUARDIA
SENTURA
PALLA

C. GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA



PERIODO DE EJECUCION: 15 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:	EQUIPAMIENTO DEL POZO CALLE GUADALUPE VICTORIA EN SAN JUAN COSALA.	CONTRATISTA:		NÚMERO DE ESTIMACIÓN:	2 FINIQ.
		EDUARDO VENTURA PADILLA			
CONTRATO:		FECHA:	22 DE FEBRERO DEL 2024.		

CLAVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	PROF.	PIEZA	VOLUMEN	UNIDAD	UBICACIÓN
7	ARRANCADOR MARCA SIEMENS DE 25 H.P. PARA 4 L.P.S.					1.00	PZA	
		Total este concepto				1.00		

Diagrama de control y Diagrama de fuerza de un motor de inducción.

GUARDO
VENTURA
PADILLA


SUPERVISOR


C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE OBRA

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**



EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA
Carpetas Asfálticas y Riegos de Sello
R.F.C. VEPUNHIZME C.U.F.P. VEPUNHIZME C.F.E. 3006
FRANCISCO I. MADRERO S.A. DE C.V. 4700 LA RIBERA SUR DE AYOTLAN JALISCO
TEL. 01 52 33 36 80 81 CEL. 33 33 08 84 81 MAIL: e.ventura@eduardoventura.com

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2024.

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA."

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA


ESTIMACION: No.2 FINIQ.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2024.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PARTIDA: 7

ARCHIVO FOTOGRAFICO

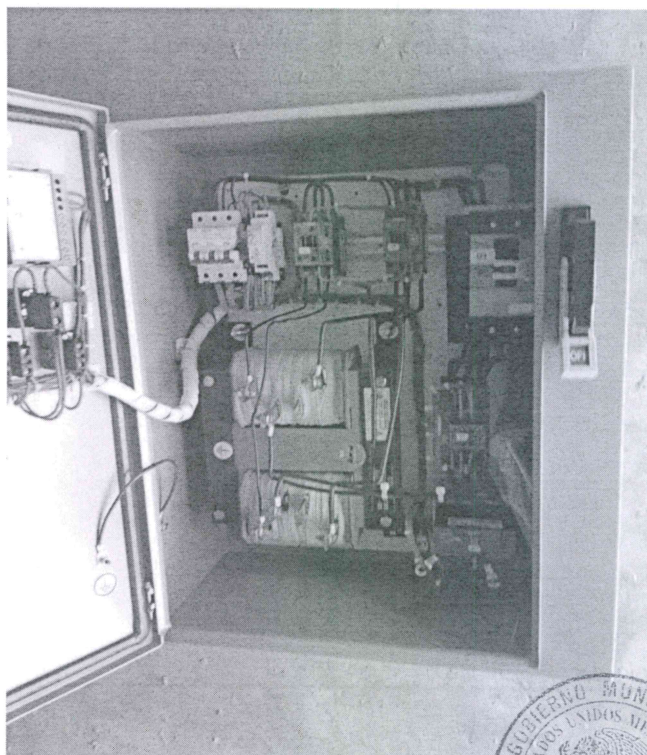

Daniel Rodriguez V.

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

SUPERVISOR DE OBRA




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EDUARDO VENTURA PADILLA



C. GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA



EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA
Carpetas Asfálticas y Riegos de Sello
R.F.C. VEP0781012PM7 CURP VEP0781012HUNH001 CLAVE 303006
FRANCISCO I. MADRERO No.27 SSC C.Z. 4790 LA BARRERA 30700 DE AYOTLÁN JALISCO
TEL: 01 (356) 56 42013 CEL: 3221966442 MAIL: eduardoventura@gmail.com


GENERADOR DE OBRA

PERIODO DE EJECUCION: 15 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:	EQUIPAMIENTO DEL POZO CALLE GUADALUPE VICTORIA EN SAN JUAN COSALA.	CONTRATISTA:		NÚMERO DE ESTIMACIÓN:	2 FINIQ.
		EDUARDO VENTURA PADILLA			
CONTRATO:		FECHA:	22 DE FEBRERO DEL 2024.		

CLAVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	PROF.	PIEZA	VOLUMEN	UNIDAD	UBICACIÓN
11	ESTUDIO BACTEREOLÓGICO DEL AGUA NOM-127-SSA1-1994 COMPLETO, INCLUYE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, INFORME DETALLADO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO					1.00	ESTUDIO	
Total este concepto						1.00		

CROQUIS Y ESPECIFICACIONES

SUPERVISOR	
 C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA SUPERVISOR DE OBRA	 C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



ANASA

RESULTADOS OPORTUNOS Y CONFIABLES
WWW.ANASA.MX

No. DE LAB: 105982-1
12 DE FEBRERO DEL 2024

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE JOCOTEPOEC
DIRECCION:
MUNICIPIO: JOCOTEPEC
ESTADO: JALISCO
AT'N: DIR. OBRAS PUBLICAS

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 25/01/2024 01:30
MUESTREADO POR: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
FECHA RECEPCION: 26/01/2024
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: POZO PRIVADA GUADALUPE VICTORIA
DESCRIPCION DE LA MUESTRA: LIQUIDO CRISTALINO
PROCEDENCIA: POZO PRIVADA GUADALUPE VICTORIA

LMP de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-2021

AA	PARAMETRO	METODO ANALITICO	UNIDADES	RESULTADO	U(*-)	LDM	LCP	LMP	ANALIZADO
FISICOQUIMICOS									
1,2	CIANUROS TOTALES	NMX-AA-058-SCFI-2001	mg/L	< 0.0204	NA	0.001000	0.0204	0.0700	29/01/24 DVM
1,2	COLOR PLATINO COBALTO	NMX-AA-045-SCFI-2001	Pl-Co	< 2.5	NA	NA	2.5	15.0	27/01/24 MCC
1,2	CLORO LIBRE	NMX-AA-108-SCFI-2001	mg/L	< 0.20	NA	NA	0.20	0.20 - 1.50	26/01/24 CRF
1,2	CLORUROS	NMX-AA-073-SCFI-2001	mg/L	120.60	1.38	NA	5.00	-----	30/01/24 KEC
1,2	DUREZA TOTAL	NMX-AA-072-SCFI-2001	mg/L	480.00	10.96	NA	20.00	500.00	01/02/24 MCC
1,2	FLUORUROS	NMX-AA-077-SCFI-2001	mg/L	0.498	0.045	0.015000	0.200	1.500	30/01/24 DVM
1,2	FENOLES TOTALES	NMX-AA-050-SCFI-2001	mg/L	< 0.0099	NA	0.000500	0.0099	-----	30/01/24 OBG
1,2	YODO RESIDUAL	SM-4500-I-B-1998	mg/L	< 0.1187	NA	0.006700	0.1187	0.2000 - 1.5000	26/01/24 MCC
1,2	NITROGENO AMONIAICAL	NMX-AA-026-SCFI-2010	mg/L	< 0.40	NA	NA	0.40	0.50	30/01/24 LJL
1,2	NITRITOS (Como N)	NMX-AA-099-SCFI-2021	mg/L	0.0191	0.0012	0.000300	0.0101	0.9000	27/01/24 LJL
1,2	NITRATOS (Como N)	NMX-AA-079-SCFI-2001	mg/L	2.520	0.291	0.006000	0.100	11.000	27/01/24 LJL
1,2	SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILENO	NMX-AA-039-SCFI-2001	mg/L	0.547	0.058	0.008000	0.100	0.500	30/01/24 CRF
1,2	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	NMX-AA-034-SCFI-2015	mg/L	1074.00	30.02	NA	10.00	1000.00	30/01/24 KEC
1,2	SULFATOS	NMX-AA-074-SCFI-2014	mg/L	191.8180	16.4920	0.383200	10.7587	400.0000	29/01/24 DVM
1,2	TURBIEDAD	NMX-AA-038-SCFI-2001	UNT	< 2.00	NA	0.040000	2.000	4.000	27/01/24 MCC
1,2	Ph	NMX-AA-008-SCFI-2016	UNIDADES	7.4	0.1	NA	NA	6.5 - 8.5	26/01/24 CRF
ABSORCION ATOMICA									
1,2	ALUMINIO	EPA-6020B-2014	mg/L	0.0535	0.0054	0.001000	0.0050	0.2000	07/02/24 ACB
1,2	ARSENICO	EPA-6020B-2014	mg/L	0.0080	0.0008	0.000400	0.0020	0.0250	07/02/24 ACB



ANASA

RESULTADOS OPORTUNOS Y CONFIABLES
WWW.ANASA.MX

No. DE LAB: 105982-1
12 DE FEBRERO DEL 2024

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE JOCOTEPOEC
DIRECCION:
MUNICIPIO: JOCOTEPEC
ESTADO: JALISCO
AT'N: DIR. OBRAS PUBLICAS

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 25/01/2024 01:30
MUESTREADO POR: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
FECHA RECEPCION: 26/01/2024
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: POZO PRIVADA GUADALUPE VICTORIA
DESCRIPCION DE LA MUESTRA: LIQUIDO CRISTALINO
PROCEDENCIA: POZO PRIVADA GUADALUPE VICTORIA

LMP de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-2021

AA	PARAMETRO	METODO ANALITICO	UNIDADES	RESULTADO	U(*-)	LDM	LCP	LMP	ANALIZADO
1,2	BARIO	EPA-6020B-2014	mg/L	0.5070	0.0051	0.002000	0.0100	1.3000	07/02/24 ACB
1,2	CADMIO	EPA-6020B-2014	mg/L	< 0.00050	NA	0.000100	0.00050	0.00500	07/02/24 ACB
1,2	CROMO	EPA-6020B-2014	mg/L	< 0.0100	NA	0.002000	0.0100	0.0500	07/02/24 ACB
1,2	COBRE	EPA-6020B-2014	mg/L	< 0.0100	NA	0.002000	0.0100	2.0000	07/02/24 ACB
1,2	HIERRO	EPA-6020B-2014	mg/L	0.0402	0.0040	0.002000	0.0100	0.3000	07/02/24 ACB
1,2	MERCURIO	EPA-6020B-2014	mg/L	0.00040	0.00004	0.002000	0.00010	0.00600	07/02/24 ACB
1,2	MANGANESIO	EPA-6020B-2014	mg/L	0.2970	0.0297	0.002000	0.0100	0.1500	07/02/24 ACB
1,2	SODIO	EPA-6020B-2014	mg/L	184.1860	18.4190	2.000000	-----	-----	07/02/24 ACB
1,2	PLOMO	EPA-6020B-2014	mg/L	< 0.0020	NA	0.000400	0.0100	0.0100	07/02/24 ACB
1,2	ZINC	EPA-6020B-2014	mg/L	< 0.0100	NA	0.002000	-----	-----	07/02/24 ACB

MICROBIOLOGIA

1,2	COLIFORMES FECALES	NMX-AA-042-SCFI-2015	NMP/100 mL	2	NA	NA	2	NO DETECTABLE	26/01/24 PRS
1,2	COLIFOPRMES TOTALES	NMX-AA-042-SCFI-2015	NMP/100 mL	46	NA	NA	2	-----	26/01/24 PRS



ANASA

RESULTADOS OPORTUNOS Y CONFIABLES
WWW.ANASA.MX

No. DE LAB: 105982-1

12 DE FEBRERO DEL 2024

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE JOCOTEPOEC
DIRECCION:
MUNICIPIO: JOCOTEPEC
ESTADO: JALISCO
AT'N: DIR. OBRAS PUBLICAS

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 25/01/2024 01:30
MUESTREADO POR: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
FECHA RECEPCION: 26/01/2024
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: POZO PRIVADA GUADALUPE VICTORIA
DESCRIPCION DE LA MUESTRA: LIQUIDO CRISTALINO
PROCEDENCIA: POZO PRIVADA GUADALUPE VICTORIA

LMP de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-2021

AA	PARAMETRO	METODO ANALITICO	UNIDADES	RESULTADO	U(*/-)	LDM	LCP	LMP	ANALIZADO
----	-----------	------------------	----------	-----------	--------	-----	-----	-----	-----------

----- FIN DE PARAMETROS -----

OBSERVACIONES ANALITICAS:

COLOR APARENTE



ANASA

RESULTADOS OPORTUNOS Y CONFIABLES

WWW.ANASA.MX

No. DE LAB: 105982-1

12 DE FEBRERO DEL 2024

NOTAS

AA	Prueba Acreditada o Aprobada	AN	Clave del Analista que realizo la prueba
LDM	Limite de Deteccion del Metodo	U	Incertidumbre expandida K=2
LPC	Limite Practico de Cuantificacion	S	Prueba realizada en el Laboratorio pero no esta acreditada ni aprobada
N.E.	Analisis No Efectuado	V	El resultado proviene de un calculo que involucra otros parametros analizados.
LMP	Limite Maximo Permisible	X	Prueba subcontratada y acreditada
NA	No Aplica	Y	Prueba subcontratada y no acreditada

ACREDITACIONES Y APROVACIONES

AA	DEPENDENCIA / INSTITUCION	ACREDITACION/ APROBACION	VIGENCIA	PRUEBAS ACREDITADAS PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD EN
1	Entidad Mexicana de acreditacion A.C. (ema a.c.)	AG-111-017/12	A partir del: 9 Oct. 2012	Agua
2	Comision Nacional del Agua	CNA-GCA-2598	Con vigencia del 16 de febrero de 2023 al 20 de junio de 2024	Agua
3	Entidad Mexicana de acreditacion A.C. (ema a.c.)	R-0465-026/13	A partir del: 19 Jun 2013	Residuos

OBSERVACIONES DE MUESTREO:

NA

- Este informe de pruebas no podra ser reproducido parcialmente sin la autorizacion escrita y firmada por la direccion de este laboratorio.
- Cuando el laboratorio realiza el muestreo: Los resultados mostrados en este informe de resultados solo aplican a la muestra analizada
- Cuando el cliente realiza el muestreo: Los resultados mostrados en este informe de resultados solo aplican a la muestra analizada tal como se recibo por parte del cliente.
- Manifiesto que los resultados de pruebas reportadas, fueron con los metodos y procedimientos asentados en este informe de resultados
- Para cualquier aclaracion en este informe usted cuenta con 10 dias para solicitarla y debe ser presentado por escrito al siguiente correo electronico: quejas@anasa.mx
- Cuando el laboratorio realice el muestreo: La informacion otorgada por el cliente son datos personales (nombre de cliente, direccion, telefono, atencion y correo electronico) asi como la identificacion y procedencia de la muestra.
- Cuando el cliente realice el muestreo: La informacion solicitada al cliente, cuando este realice el muestreo es: Nombre de cvliente, direccion, telefono, atencion, fecha de muestreo, muestreado por, procedencia e identificacion de la muestra.
- Cuando el muestreo, pretratamiento, preservacion y transporte fue realizado por el cliente, si en la recepcion de muestras se detecta un incumplimiento, debe ser especificado en el area de observaciones de muestreo, el cliente debe autorizar la realizacion de las prueba solicitadas mediante el formato de muestras fuera de especificacion.

Q. KARLA JIMENEZ LOPEZ
DIRECTOR TECNICO

12/02/2024 11:10



PERIODO DE EJECUCION: 09 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024



EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA
Carpetas Asfálticas y Riegos de Sello
R.F.C. VENTURAPADILLA C.U.C.P. 4740 LA RIBERA NPO DE AYOTLAS JALISCO
TEL: 01 52 33 3500 0000 CEL: 33 3500 0000 FAX: 33 3500 0000

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2024.

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA."

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2024.

ESTIMACION: No.2 FINIQ.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PARTIDA: AD -1

ARCHIVO FOTOGRAFICO



Daniel Rodriguez V

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

Eduardo Ventura Padilla

C. GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA



EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA
Carpetas Asfálticas y Riegos de Sello
R.F.C. VEPE781012JM7 CURP VEPE781012HDFNDD05 C.I.F.E. 383096
FRANCISCO I. MADERO No. 22 S.C.C.P. 47940 LA RIBERA MUPIO DE AYOTLAN JALISCO
TEL: 01 (56) 56 82615 CEL: 3521068442 MAIL: a2dmachavez@hotmail.com

JOCOTEPEC, JALISCO A 09 DE FEBRERO DEL 2024

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMADA C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ POR ESTE MEDIO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA SOLICITAR LA APROVACION DEL CONCEPTO ADICIONAL QUE CONSTA DE (VALVULA CHECK DE 3" PARA COLUMNA) PARA EL PROYECTO DE OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN SAN JUAN COSALA" PARA MEJORA DEL SISTEMA Y PROTEGER BOMBA Y MOTOR DE POZO.

AL AMPARO DEL CONTRATO GMJ-001C-PO/2024

INFORMANDO DE MANERA OPORTUNA LA NECESIDAD DEL MISMO A EL SUPERVISOR DE OBRA C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA Y RECIBIENDO SU APROVACION, SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA SOPORTE DEL MISMO.

SE ANEXA TARJETA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO..

Codigo	Concepto	Uni.	Cantidad	P. Unitario	Total
	MATERIALES Y MANO DE OBRA				
1	Suministro e instalacion de VALVULA CHECK DE 3" FO. PARA COLUMNA CON ROSCA CONICA	ML	1.00	11,179.00	11,179.00

IMPORTE DEL CONCEPTO MAS IVA

AGRADEZCO DE ANTEMANO LAS FINAS ATENCIONES

QUEDO A LA ORDEN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION

C. EDUARDO VENTURA PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

09 FEB. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.



Localidad: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.

DESGLOCE DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Total
VALVULA CHECK DE 3" FO. PARA COLUMNA CON ROSCA CONICA	PZA	1.0000	18,078.84	10,001.67
OF. OPERADOR + 2 AYUDANTES	JOR	0.5000	\$ 2,354.65	1,177.33

Total Auxiliares	\$	11,179.00
Costo Directo	\$	8,993.56
Indirectos (10%)	\$	899.36
Utilidad (13%)	\$	1,286.08
Precio Unitario	\$	11,179.00

EDUARDO
VENTURA
RADICA



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: 125-A/ 2024
ADM. 2021-2024
Jocotepec Jalisco, a 10 de febrero del 2024

C. Eduardo Ventura Padilla.
PRESENTE:

Asunto: volúmenes excedentes

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su solicitud recibida el día 10 de febrero del 2024, el cual se autoriza el volumen excedente de la obra: "Equipamiento de pozo profundo en privada Guadalupe Victoria en San Juan Cósala" del municipio de Jocotepec, Jalisco. No. DE CONTRATO: GMJ-001C OP/2024.


No.	Concepto	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
AD	Valvula Check 3" para columna con rosca conica	Pza	1	\$ 11,179.00	\$11,179.00
				Sub Total	\$11,179.00
				I.V.A.	\$ 1,788.64
				Total	\$12,967.64

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

Atentamente:



C. Imelda Karina Pérez González
Directora de Obras Públicas.



*Recibido
10/02/2024
TRESER
S*
