



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 1119/2024

Jocotepec, Jal., a 17 de septiembre del 2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$663,497.36 (Seiscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y siete Pesos 36/100 M.N.)** por concepto de ESTIMACIÓN 05 y FINIQUITO, del programa **FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR DE 18"," EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6241-2-25.1-050-412

Contrato: CSS-OP-FAIS/RAMO33-011/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
207	10/09/2024	\$574,456.59	\$666,369.64	\$2,872.28	\$663,497.36

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 05 y Finiquito
4. Fianza Vicios Ocultos
5. Minuta Terminó de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.



HACIENDA
MUNICIPAL
2021 - 2024

26 SEP. 2024

RECIBIDO

GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA

RFC: TPR1806058C0

Domicilio: MORELOS No. 67 No. Int E, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio - 207
Fecha 10/9/2024 09:16:18

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: I01 - Construcciones.

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141205 - Servicio de construcción de sistemas de drenaje	PAGO DE ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQUITO OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE COLECTOR DE 18" " EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO CON CONTRATO NO.: CSS-OP-FAIS/RAMO33-011/2024 PROGRAMA FAIS RAMO 33 FIANZA DE ANTICIPO: 3678-05893-1 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:3678-05892-6 AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. BANCO: BANCOMER CLABE INTERBANCARIA: 012324001193899118 DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$2,872.28 MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$663,497.36	574,456.59	0.00	002 - IVA - 91,913.05	574,456.59

Importe con letra:
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.

Subtotal 574,456.59
Impuestos Traslados 91,913.05
Total 666,369.64

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000516193795
Folio fiscal AB0C1786-E2CE-4367-9B3A-B35101908749
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Septiembre 10 2024 - 09:16:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VCZfpR+mRfxaQ8MiEmc/NmIQ4wyMu1rm3GGphe5JLGx/ouZ4ATfpxHuFgzdb6fQ7u3hhx9fHYlrZ+vQKmhRZk
Ja1wP6xnP1xbAAv1Sys5O/R8BMT4YW35UeY2UffF2Ocwsm5VmJVAHXke09xmB70aOANyDnFFPaN2gd8c80dZYT
pVTSrxvBCqNURxXq6yVs9IPIRzaKyE6kN9aWqZEWH0P30EKoiZht0TAa3QEYRWb+DDWMkEgCxBzrALD7PnVEt
XylN/jGPGmtBRnG1BcTbsiCpX4UTzR7y6bev3OB5eS1vJsL8ezxWqS21AtnSAwrlu8Rha0GkktTCq/GC+WiQ==


Sello del SAT

FYVHSROF0jprvknj3PgDkHCdXrF7ifekp1BlvhHuLDi7JA4HYEv1r/TBqXFKvo6Hmo2bx8GRTSeGoJp
S1iVOCk9Wk8kv9ZtavuHez4IzJkyZ8taqZux/puD6thsDMc3mAzPiVZiWLPDo3kPqm27QPvnOYeBEHkx

WfOv8mz4Nn2QbjHCh9ZckAK8kX6HZwmlo5JHAofgWmLYDjVO1ydKllrOy9OIUEGCEAJVRUvDC9fmlgr/
CAFlsYmWDM3YW4A6eFYjULh/SoUCrmoFAsh62GyCn3M/mo8MpF6xZv8SaK0Vorzd20LXdALWwHSh74oC
UcLubwSkrwtandik5FAT8w==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB0C1786-E2CE-4367-9B3A-B35101908749|2024-09-10T09:16:19|MAS0810247C0|VCZf
pR+mRfxaqA8MiEmc/NmlQ4wyMu1rm3GGphe5jLGx/ouz4ATfpxHuFgzdb6fQ7u3hhx9fHYlrZ+vQKmhR
ZkJa1wP6xnP1XbAAv1Sys5O/R8BMT4YW35UeY2UffF2Ocwsm5VmJVAHXke09xmB70aOANYDnFFPaN2gd
8c80dZYTpVTSrxvBCqNURXxQ6yVs9IPiRzaKyE6kN9aWqZEWHOP30EKoiZzht0TAa3QEYRWb+DDWMKEg
CxBzrALD7PnVetXylN/jGPGmtBRnG1BcTbsiCpX4UTzR7y6bev3OB5eS1vJsl8ezxWqS21AtnSAwrlu8
Rha0GkkTCq/GC+WiQ==|00001000000709182898||



<cfdi:Comprobante xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="207" Fecha="2024-09-10T09:16:18" Sello="VCZfpR+mRfxaqA8MiEmc/NmlQ4wyMulrm3GGphe5jLGx/ouz4ATfp xHuFgzdb6fQ7u3hhx9fHYIrZ+vQKmhRZkJa1wP6xnP1XbAAv1Sys5O/R8BMT4YW35UeY2UffF 2Ocwxm5VmJVAHXke09xmB70aOANyDnFFPaN2gd8c80dZYTpVTSrxvBCqNurXxQ6yVs9IPIRza KyE6Kn9aWqZEWHP030EKoiZzht0TAA3QEYRWb+DDWMkEgCxBzrALD7PnVetXyln/jGPGmtBRr G1BcTbsiCpX4UTzR7y6bev30B5eSlvJsL8ezxWqS21AtnSAwrIu8Rha0GkktTCq/GC+WiQ==> FormaPago="99" NoCertificado="00001000000516193795" Certificado="MIIGPjC CBCagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYxOTM3OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYD VQDDbBdVVVRPUk1EQUQgQ0VSVELGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUgQUURNS U5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBg kqhkiG9w0BCQSGW2NbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEh JREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFU1JFUk8xZDjAMBGNVBBEMBTAA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZz MBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGA1UEBwwKQ01VBUUURU1PQzEVMBMGA1UEL RMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQU NJT04gQ0VOVFJBTCEBRSBTRVJWSUNJTT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUVzQ09OVFJJQ1VZRU5URTA eFw0YmJjExMTUwMDU3NDBaFw0YnJjExMTUwMDU3NDBaMIIBCzE4MDYGA1UEAxMvVEVSUkFDRVJJ QVMgWSBQQVZJTUVOVE9TIERFIEExBIFJJQk1FUkEgU0EgREUgQ1YxODA2BgNVBCKTl1RFU1JBQ0 VSSUFTIFkgUEFWSU1FTlRPUyBERSBMQSBSSUJRVJBIENBIERFIENWMTgWNgYDVQQKEy9URV JSQUNFUk1BUyBZIFBBVklNRU5UT1MgREUgTEEGUklCSUVSQSBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRM cVFBsMTgWnJAlOEMwIC8gQ0FTRTc4MDEExMOM4OTEeMBwGA1UEBRMVIC8gQ0FYUzC4MDEExM0hK Q0JYUjA5MRQwEgYDVQQLEw0ZXXJyYWN1cm1hc3CCAS1wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCA QoCggEBAJBx+5I+gY01+PNNVUEwtpe5+rgv5ayA8GbDJBv0jepOpfwasRbE7/FXIVRduW07eo 1u2hh8wTSH7udK2jOTnPVV9szVt6Rq6CCWma4+gTY4f4Bf1ff8A4gllXce2P8IWCxFOuVt67m VdpF++Y0ndYrcoAS2mFmuPbX2L5hWF9xz3+ANDiNe+eOftvmse1UBacEpoaaEhxC+ZolIGa8i 2lwUHTgx64jd9WLKd79aZ5ufhr/LJ52hTKsqfbb1xh3peoV6N9anDkjhr284lQ2CbeEh4vus 7eTrdfUgGrdCkU2RUX0X9QqTGDcz0fq5ZmrUvSshvFNybLWO+w1IZT/YBsCAwEAAAMdMBswDA YDVR0TAAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBALZDd3La8qKVFF/ 0yznXwnheSIgGqPJ9uDPCm3G2+yQ9K50jbF2n2iVx7F83VRR71ojYoJMn2bNtQWykaBWgxIC4 CLm/LFmeFpb6URWxSADqEcTAzOuLbIFwF5+y5EH3aaI5CCBOZSu+7rK/1ldyTTPBMcMIesr1Z OL/Pcl2yaQGRKPeFvHZBLwQDedUYILfGHHomD4VgO45ITXmXcqcoEoltTXwufOUDHzatbvfp6 IwcK4jQM4pG1H+Enr9qMYzgpzZnhGSs7Np2aVOK3DOvhDxPzWWTj9ppvOmbRvrLRaKnOmCu0 4zpVc1nnVunRlo/NEa/ub7NxCL6KHMdB3qPvbZxz1BaXz4XnoMkzCwyNn48bAUGYmMn1Qj/AP Unaj7XZas63KnCtjZgMICrb9X/aeS2TFIrEEL9um6aaBwp0gnR86o0Sv9jj9/3y+jZJ5jk9nPP KzXkJbqelIw/8z/Ca3fs6K3tXXThutJJWh88FvlnT+HEv8I3q96n0S37h0TKhlA9zbbUMUk0q 9W2K5iYa8RkoXE023HW43YLMHfyBuNJSVb2ZgJjf7RNd1lY7u3KrE9WFynm+vcWKvz5cbMR2C bFtLidaGsZ8RnGPPm16m8g5tdHkHAAyGgukv0IEEf7nuUB5I5RProeNADeDJgsKladYmfQbl9 X7YI29HFG0VQ" SubTotal="574456.59" Moneda="MXN" Total="666369.64" TipoDeC omprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45800"> <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TPR1806058C0" Nombre="TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA"/> <cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603" Usoc FDI="I01"/> <cfdi:Conceptos> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141205" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="SER0005" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQUITO OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE COLECTOR DE 18" " EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO CON CONTRATO NO.: CSS-OP-FAIS/RAMO33- 011/2024 PROGRAMA FAIS RAMO 33 FIANZA DE ANTICIPO: 3678-05893-1 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3678-05892-6 AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. BANCO: BANCOMER CLABE INTERBANCARIA: 012324001193899118 DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$2,872.28 MONTO PARA EFECTO DE PAGO:

\$663,497.36" ValorUnitario="574456.59" Importe="574456.59" ObjetoImp="02"
>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="574456.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="91913.05"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="91913.05">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="91913.05" Base="574456.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="AB0C1786-E2CE-4367-9B3A-B35101908749" FechaTimbrado="2024-09-10T09:16:19" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCFD="VCZfpR+mRfxaqA8MiEmc/NmlQ4wyMulrm3GGphe5jLGx/ouz4ATfpxHuFgzdb6fQ7u3hhx9fHYIrZ+vQKmhRZkJalwP6xnPlXbAAv1Sys50/R8BMT4YW35UeY2UffF2Ocwsm5VmJVAHXke09xmB70aOANyDnFFPaN2gd8c8OdZYTpVTSrxxvBCqNurXxQ6yVs9IPIRzaKyE6kN9aWqZEWH0P30EKoiZzht0TAa3QEYRWb+DDWMkEgCxBzrALD7PnVEtXylN/jGPGmtBRnG1BcTbsiCpX4UTzR7y6bev3OB5eS1vJsL8ezxWqS21AtnSAwrIu8Rha0GkktTCq/GC+WiQ==" NoCertificadoSAT="00001000000709182898" SelloSAT="FYVHSROF0jprvknkj3PgDkHCdXrF7ifekplBlvhHuLDi7JA4HYEvllr/TBqXFKvo6Hmo2bx8GRTSeGoJpSljV0CK9Wk8kv9ZtayuHez4lzJkyZ8tggZux/puD6thsDMc3mAzPiVZiWLPDo3kPqm27QpvnOYeBEHkxWfOv8mz4Nm2ObjHCh9ZckAK8kX6HZwmIo5JHAofgWmLYDjVO1ydKIlrOy9OIUEGCEAJVRUVDC9fm1gr/CAFlsImWdm3YW4A6eFYjULh/SoUCrmOFash62GyCn3M/mo8MpF6xZv8SaK0Vorzd20LXdALWwH8h74oCUcLUpwSkrwtandik5FAT8w==" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

TPR1806058C0	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
--------------	--	--------------	--------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

AB0C1786-E2CE-4367-9B3A-B35101908749	2024-09-10T09:16:18	2024-09-10T09:16:19	MAS0810247C0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$666,369.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
--------------	---------	---------	---------------------------



Imprimir

MORELOS PONIENTE 67E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: CSS-OP-FAIS/RAMO33-011/2024	HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINIQUITO PERIODO DE TRABAJO:
	OBRA : COLECTOR DE 18" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, (DEL KM 0+000 AL 0+640), EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	DEL: DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2024. FECHA: 15 DE JUNIO DE 2024
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL		

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN					
HOJA No.	P A R T I D A S			I M P O R T E S	
	LINEA COLECTOR			\$ -	
	EXCAVACIONES			\$ -	
	RELLENOS			\$ -	
	INSTALACION DE TUBERIA			\$ 574,456.59	
	PAVIMENTOS			\$ -	
	EXTRAORDINARIOS			\$ -	
				MONTO DE ESTIMACIÓN \$ 574,456.59	
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO % \$ -	
				SUBTOTAL \$ 574,456.59	
				I. V. A. 16% \$ 91,913.05	
				SUMA \$ 666,369.64	
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 2,872.28	
				NETO A PAGAR \$ 663,497.36	
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL		
ASIGNACIÓN	\$ 4,999,209.08	\$ 799,873.45	\$ 5,799,082.53		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 574,456.59	\$ 91,913.05	\$ 666,369.64		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 5,953,235.14	\$ 952,517.62	\$ 6,905,752.76		
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 6,527,691.73	\$ 1,044,430.68	\$ 7,572,122.41		
SALDO ADICIONAL	-\$ 1,528,482.65	-\$ 244,557.22	-\$ 1,773,039.88		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	
ANTICIPO %	\$ 1,499,762.72	\$ 239,962.04	\$ 1,739,724.76	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	 IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 1,499,762.72	\$ 239,962.04	\$ 1,739,724.76		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 1,499,762.72	\$ 239,962.04	\$ 1,739,724.76		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINIQUITO
PERÍODO: DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2024.
OBRA : COLECTOR DE 18" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, (DEL KM 0+000 AL 0+640), EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA : TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
COLECTOR												
A	LINEA DE DRENAJE DE 18"											
A01	EXCAVACIONES											
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	640.00	645.00	0.00	645.00	- 5.00	\$13.33	\$8,531.20	\$0.00	\$8,597.85	-\$66.65
JOCO-002	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3,828.69	6,162.47	0.00	6,162.47	- 2,333.78	\$122.76	\$470,009.98	\$0.00	\$756,505.25	-\$286,495.27
JOCO-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3,828.69	6,394.87	0.00	6,394.87	- 2,566.18	\$81.70	\$312,803.97	\$0.00	\$522,461.17	-\$209,657.20
JOCO-004	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	768.00	1,032.00	0.00	1,032.00	- 264.00	\$21.23	\$16,304.64	\$0.00	\$21,909.36	-\$5,604.72
JOCO-005	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	124.00	155.25	0.00	155.25	- 31.25	\$320.01	\$39,681.24	\$0.00	\$49,681.55	-\$10,000.31
JOCO-006	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	196.00	243.25	0.00	243.25	- 47.25	\$258.08	\$50,583.68	\$0.00	\$62,777.96	-\$12,194.28
A02	RELLENOS					EXCAVACIONES			\$897,914.72	\$0.00	\$1,421,933.15	-\$524,018.43
JOCO-007	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M2	768.00	1,032.00	0.00	1,032.00	- 264.00	\$101.53	\$77,975.04	\$0.00	\$104,778.96	-\$26,803.92
JOCO-008	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00	\$318.67	\$244,738.56	\$0.00	\$0.00	\$244,738.56
JOCO-009	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M3	3,060.69	4,238.12	0.00	4,238.12	- 1,177.43	\$484.40	\$1,482,598.24	\$0.00	\$2,052,943.42	-\$570,345.19
A03	INSTALACION DE TUBERIA					RELLENOS			\$1,805,311.84	\$0.00	\$2,157,722.38	-\$352,410.55
JOCO-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE ADS DE 18" DE DIAMETRO INCLUYE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	\$918.35	\$587,744.00	\$0.00	\$0.00	\$587,744.00
JOCO-011	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=300 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	3.00	0.00	3.00	11.00	\$16,335.76	\$228,700.64	\$0.00	\$49,007.28	\$179,693.36
A04	PAVIMENTOS					INSTALACION DE TUBERIA			\$816,444.64	\$0.00	\$49,007.28	\$767,437.36
JOCO-012	FORMACION DE CAPA SUBRASANTE DE 30 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	768.00	730.59	0.00	730.59	37.41	\$369.57	\$283,829.76	\$0.00	\$270,004.01	\$13,825.75

David Rodas V-

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS #67 D, COLONIA CENTRO JOCOTEPEC, C.P. 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

RFC: TPR1806058C0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2024.

OBRA : COLECTOR DE 18" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, (DEL KM 0+000 AL 0+640), EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA : TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2024


ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
COLECTOR												
JOCO-013	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	M3	512.00	487.06	0.00	487.06	24.94	\$603.40	\$308,940.80	\$0.00	\$293,891.86	\$15,048.94
JOCO-014	EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	M2	980.00	0.00	462.00	462.00	518.00	\$517.52	\$507,169.60	\$239,094.24	\$0.00	\$268,075.36
JOCO-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 6 DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	M3	74.40	0.00	65.73	65.73	8.67	\$5,102.12	\$379,597.73	\$335,362.35	\$0.00	\$44,235.38
E	EXTRAORDINARIOS					PAVIMENTOS			\$1,479,537.89	\$574,456.59	\$563,895.87	\$341,185.43
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE ADS DE 24" DE DIAMETRO INCLUYE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	M	0.00	520.00	0.00	520.00	- 520.00	\$1,628.47	\$0.00	\$0.00	\$846,804.40	-\$846,804.40
EXT-002	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 24", EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M	0.00	645.00	0.00	645.00	- 645.00	\$603.44	\$0.00	\$0.00	\$389,218.80	-\$389,218.80
EXT-003	EMPEDRADO ECOLOGICO EN CRUCEROS ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECCION.	M2	0.00	856.39	0.00	856.39	- 856.39	\$374.94	\$0.00	\$0.00	\$321,094.51	-\$321,094.51
						EXTRAORDINARIOS			\$0.00	\$0.00	\$1,557,117.71	-\$1,557,117.71
								SUMA	\$ 4,999,209.08	\$ 574,456.59	\$ 5,749,676.39	-\$ 1,324,923.90
								IVA	\$ 799,873.45	\$ 91,913.05	\$ 919,948.22	-\$ 211,987.82
								TOTAL	\$ 5,799,082.53	\$ 666,369.64	\$ 6,669,624.61	-\$ 1,536,911.72

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS





TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS PONIENTE 67E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

RFC: TYPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 15 DE JUNIO DE 2024

OBRA: COLECTOR DE 18" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, (DEL KM 0+000 AL 0+640), EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINIQUITO
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2024.

COLECTOR	
JOCO-014	EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
FOTOGRAFÍA	



SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez Valenzuela
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS





TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS PONIENTE 67E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

RFC: TYPR1806058C0

EMPRESA:

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA:

15 DE JUNIO DE 2024

OBRA: COLECTOR DE 18" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, (DEL KM 0+000 AL 0+640), EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.


LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2024.

COLECTOR		
JOCO-014	EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CROQUIS

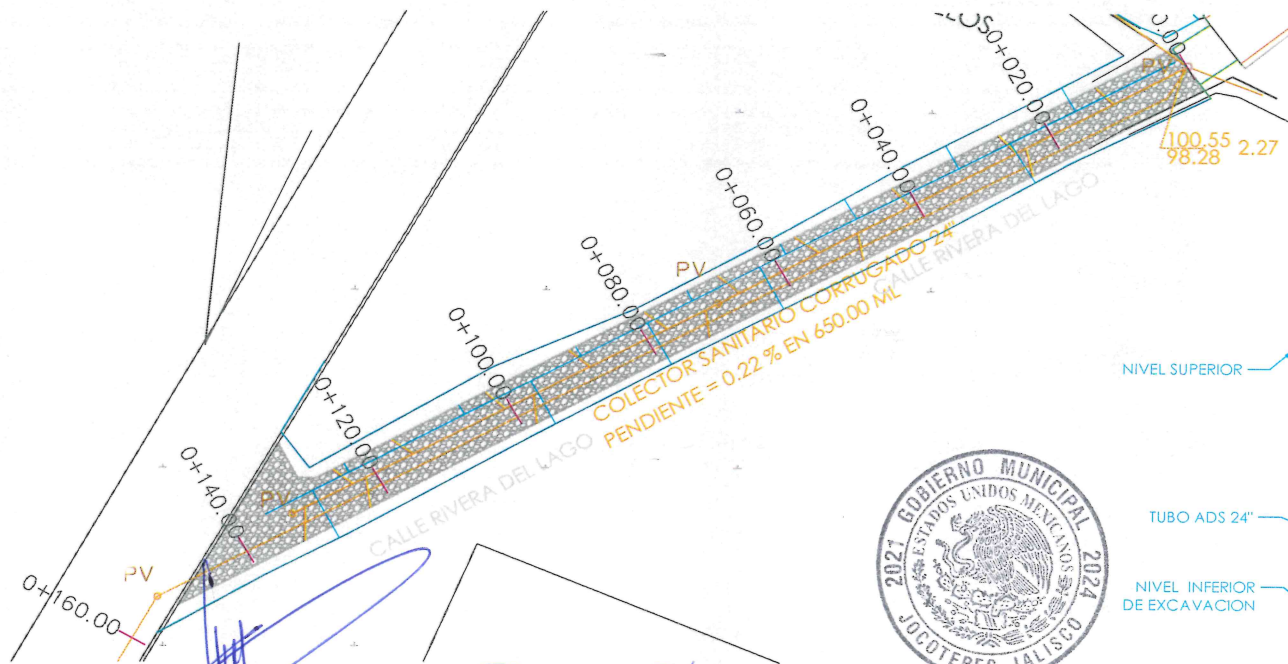


SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez Valenzuela
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

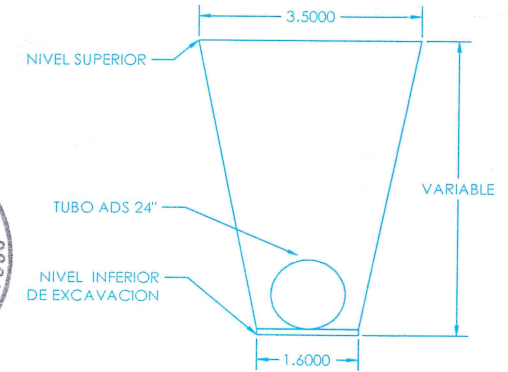

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS PONIENTE 67E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

RFC: TYPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	15 DE JUNIO DE 2024
OBRA: COLECTOR DE 18" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, (DEL KM 0+000 AL 0+640), EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO)-FINQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2024.

COLECTOR		
JOCO-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 6 DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS: PONIENTE 67E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

RFC: TYPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2024

OBRA: COLECTOR DE 18" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, (DEL KM 0+000 AL 0+640), EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2024.

COLECTOR

JOCO-015

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 6 DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CROQUIS

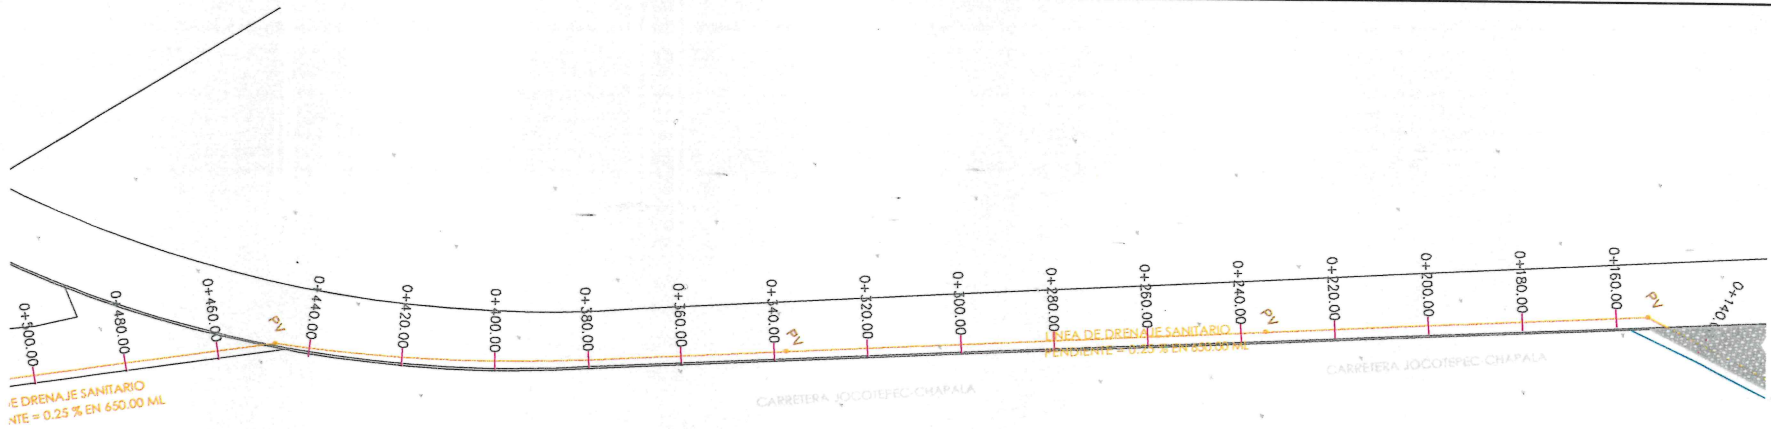


SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

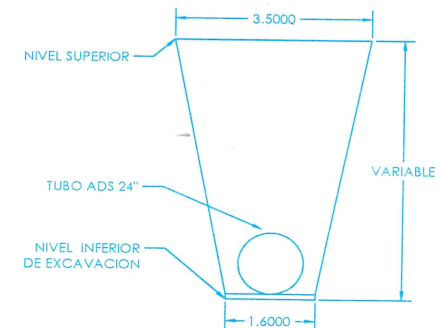



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

CONTRALORIA CIUDADANA
OFICIO No. 0527/2024
Asunto: Contestación

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC.

PRESENTE.

Por medio del presente extendiendo un cordial saludo, mismo que hago propio para dar contestación a su oficio No. **0336/2024** de fecha 19 de septiembre del presente año en donde se entrega a esta Contraloría a mi cargo para su revisión la documentación que ampara la estimación No. 5 y finiquito del contrato **GMJ-CSS-OP-011/2024**, "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE COLECTOR DE 18" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, **del Programa FAIS R-33, Ejercicio Fiscal 2024**, por lo que la revisión física y cumplimiento de los trabajos realizados como lo señala el contrato son responsabilidad de la dirección a su cargo, para lo cual le informo que es procedente su trámite.

Sin más por el momento, reciba cordial saludo.

ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS

CONTRALOR CIUDADANO

CONTRALORIA
CIUDADANA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

26 SEP. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

Tú decides mejorar

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 0336/2024

Jocotepec, Jal., a 19 de septiembre del 2024

527
LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS
CONTRALOR CIUDADANO
PRESENTE:

Con At' ING. José Villanueva Valadez
Asunto: Lo que se indica

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para entregar documentación para su revisión referente a la ESTIMACIÓN 05y Finiquito de la Obra Pública No **CSS-OP-FAIS/RAMO33-011/2024** de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR DE 18", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, del Programa Fais Ramo 33, Ejercicio Fiscal 2024.

Sin más por el momento, me despido quedando como su atento y seguro servidor.



RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Archivo
D.O.P./c.v.ch
