



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 1169/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: OCTAVA CUATRO VISTAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de; \$211,046.27 (Dochientos Once Mil Cuarenta y Seis Pesos 27/100 m.n.) por concepto del Estimación 16 y FINIQUITO, del programa CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2024 correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

No de Proyecto: 6121-2-11.1-050-299
Contrato: No CSS-OP-CC-024/2023

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
119	12/09/2024	\$184,341.82	\$213,836.51	\$2,790.24	\$211,046.27

Anexo:

1. Factura, xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 16 y Finiquito
4. Fianza Vicios Ocultos
5. Minute Termino de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Administrativa Extinción Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes



HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024

24 SEP. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

FOLIO INTERNO No. A 119
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 49275230-1EE2-4E51-A401-E1D6BCC930AD
Expedido en (C.P.): 45089

OCTAVA CUATRO VISTAS

RFC: OCV230921UH4
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal:
CORAL Num. Exterior 2756 Num. Interior 5 RESIDENCIAL VICTORIA ZAPOPAN
ZAPOPAN JALISCO

Fecha de emisión: 2024-09-12T09:45:11
Fecha de timbrado: 2024-09-12T09:47:35
CSD del emisor: 00001000000702691410
CSD del SAT: 00001000000709182898

Primerada
CC !

Receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

RFC: MJ850101KP8
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 45800
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72121101 - Servicio de construcción de edificios...	003	PAGO ESTIMACION 16 (FINQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA No GJM-OP-CSS-024/2023 "CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS AJUSTE DE RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO \$2,790.24 NETO A PAGAR \$211,046.27	\$ 184,341.82	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 29,494.69	\$ 184,341.82

Total con letra:
Doscientos trece mil ochocientos treinta y seis pesos mexicanos 51/100 MXN

Subtotal	\$ 184,341.82
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 29,494.69
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 213,836.51

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	29,494.69



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|49275230-1EE2-4E51-A401-E1D6BCC930AD|A|119|2024-09-12T09:45:11|03|00001000000702691410|184341.82|MXN|213836.51||01|PUE|45089|OCV230921UH4|OCTAVA CUATRO VISTAS|601|MJ850101KP8|MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO|45800|603|G03|72121101|003|1|E48|PAGO ESTIMACION 16 (FINQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA No GJM-OP-CSS-024/2023 "CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS AJUSTE DE RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO \$2,790.24 NETO A PAGAR \$211,046.27|184341.82|184341.82|02|184341.82|002|Tasa|0.160000|29494.69|184341.82|002|Tasa|0.160000|29494.69|29494.69]]

Sello digital del emisor

KpPINp39wbjzhM5S5iml0HSYQY6gV5e4klkL3e6asmEHUDEM7TBdU6fCkR+J6KNgew5aSAgN68afgewWfCoYBOtuW3bFBSI7b3nJsCN4AYKY15j6Jl1OxClaw1ia4DMnoV17E5XF83XMBCLeVMD+kbqY4JCM98TjbmVgFTLsOnFrR4qsgkXNjW8JULJOEqBACHq8XsRcERzVrcjESY13BRQ3SzhSOV11EczjMB8TWC8Q7u9ARb4ECFf09qIDT0VrZ2HE1BtC74JkPC1HS65pXDeqP0R8nprT8QSwWlpd3nhrCWSuylLJsXgWjA==


Sello digital del SAT

hca3atai9JZd9Th3KwGawE+cV6eUCTSqzTYPoXg3P14GsL9UNj+PZT5efY3LrSr5azL9y51N7QyNpyBDRIOeY9+EJpimV4LE6QGdM4UXYoClKne80XnWa2v19p5bQlLsSY7VwlogcaacsR+BIDCc3Kzcp5M3a7cq17gN8BurrkzMMNanRThvHZelWjMpcSleeXCZZdkRnzAZJ2EYsCSg5e16qyp5UB7H1n2lELWycjWG76XmTKRwUmSPjR3H82eCjWAAZEa+TjJmJkTdyu10DCM2gSsXA83Ym6R116nGDIqKe3Qz62SMjw==




This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" NoCertificado="0000100000702691410" LugarExpedicion="45089" MetodoPago="PUE"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDI2OTE0MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQDCCxBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQJ1VUQVJQTEUMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RS
TipoDeComprobante="I" FormaPago="03" Folio="119" Moneda="MXN" Serie="A" Exportacion="01" Fecha="2024-09-12T09:45:11" Total="213836.51" SubTotal="184341.82"
Sello="KpP1Nrp39wbjzhM5St5imt0fHSYQY6gV5e4kKLC3e6asrnEhUDem7TBcU6fOkR+J6KNgeW5aSagN68afqevWvFcQYBOiUW3L/bFBSI7b3nJsON4AYKY15j6JfI10viQfIaw1tia4DMbnoV17E5XFP83XWBOLe/WD+kbgyf4JQVi98TjbMivigFTTLsOnFrF14c
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OCTAVA CUATRO VISTAS" Rfc="OCV230921UH4" />
<cfdi:Receptor UsoCFDI="G03" Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" Rfc="MJJ850101KP8" DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto NoIdentificacion="003" ClaveProdServ="72121101" Descripcion="PAGO ESTIMACION 16 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA No GMJ-OP-CSS-024/2023 "CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN
PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS AJUSTE DE RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO $2,790.24 NETO A PAGAR $211,046.27" ClaveUnidad="E48"
ValorUnitario="184341.82" Cantidad="1" Importe="184341.82" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Impuesto="002" Base="184341.82" Importe="29494.69"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29494.69">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Impuesto="002" Base="184341.82" Importe="29494.69"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="0000100000709182898" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloSAT="hca3atai9JZ2d9Th3KwGzWE/+cM5eUCTSrQzTYPoXg3P14GsL9UNj+PZT5IetY3LJrSr5azL9y51N7QyNpyBDRiOXeY9+EjpirmV4LE6QGdV14UXYo01Kne80XxiWa2vr19/p5b/QtLzSY7VswkxgceacsR+BIDOCGKzvp5tVf3a7cqf17gN8Burrkz"
SelloCFDI="KpP1Nrp39wbjzhM5St5imt0fHSYQY6gV5e4kKLC3e6asrnEhUDem7TBcU6fOkR+J6KNgeW5aSagN68afqevWvFcQYBOiUW3L/bFBSI7b3nJsON4AYKY15j6JfI10viQfIaw1tia4DMbnoV17E5XFP83XWBOLe/WD+kbgyf4JQVi98TjbMivigFTTLsO
UUID="49275230-1EE2-4E51-A401-E1D6BC930AD" Version="1.1" FechaTimbrado="2024-09-12T09:47:35"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCV230921UH4	OCTAVA CUATRO VISTAS	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCÓTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49275230-1EE2-4E51-A401-E1D6BCC930AD	2024-09-12T09:45:11	2024-09-12T09:47:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$213,836.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023

CONTRATISTA: OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

UBICACIÓN: CALLE XOCHILT S/N

ESTIMACIÓN 16 (FINIQUITO)

FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024


PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024




RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No.	PARTIDAS	I M P O R T E S
1	CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC	\$ 58,702.21
2	ADICIONALES	\$ 125,639.61
		MONTO DE ESTIMACIÓN \$ 184,341.82
		MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30 % \$ -
		SUBTOTAL \$ 184,341.82
		I . V . A . 16% \$ 29,494.69
		SUMA \$ 213,836.51
		MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 2,790.24
		NETO A PAGAR \$ 211,046.27

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL:
ASIGNACIÓN	\$ 4,553,382.40	\$ 728,541.18	\$ 5,281,923.58
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 184,341.82	\$ 29,494.69	\$ 213,836.51
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 4,817,341.97	\$ 770,774.72	\$ 5,588,116.69
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 5,001,683.79	\$ 800,289.41	\$ 5,801,953.20
SALDO EXCEDENTE	-\$ 448,301.39	-\$ 71,728.22	-\$ 520,029.61
AMORTIZACION DE ANTICIPO			
ANTICIPO %	\$ 1,366,014.72	\$ 218,562.36	\$ 1,584,577.07
AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 1,366,014.72	\$ 218,562.36	\$ 1,584,577.08
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 1,366,014.72	\$ 218,562.36	\$ 1,584,577.08
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
 ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS	 OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	 C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 16 (FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023
PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024



OBRA : CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

UBICACIÓN :
CONTRATISTA : OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
1	Excavacion para meter cisternas en material tipo "B" a cielo abierto por medios mecanicos o manuales a una profundidad de 0.00 a 3.00 metros, incluye: mano de obra, trazo, afine de fondo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	37.50	80.9500	0.00	80.95	-43.45	\$ 380.00	\$ 14,250.00	\$ -	\$ 30,761.00	-\$	16,511.00
2	Colado de plantilla de concreto 150 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.75 : 3.25 : 1.00 (cemento-arena-grava-agua) de 10 cm de espesor tamaño maximo del agregado 3/4", incluye: trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado emparejado, materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	12.50	12.5000	0.00	12.50	0.00	\$ 240.0000	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$	-
3	Suministro y colocacion de cisterna prefabricada suplast 2.35 m de diametro x 2.90 m de altura +/- 3% de dilatacion de 10,000 litros de volumen de capacidad, incluye: materiales, mano de obra, flotador, tapa, accesorios para instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	2.00	2.0000	0.00	2.00	0.00	\$ 18,300.00	\$ 36,600.00	\$ -	\$ 36,600.00	\$	-
4	Construccion de muro de ladrillo adobon 6x14x28 cm colocado de sog a 14 cm de espesor, acabado comun asentado con mortero-arena en proporcion 1:3 para area de cisternas de 10,000 litros, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, andamios, acabado comun, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	60.00	22.9000	0.00	22.90	37.10	\$ 367.00	\$ 22,020.00	\$ -	\$ 8,404.30	\$	13,615.70
5	Cimbrado y colado de castillo de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor	ml	24.00	24.0000	0.00	24.00	0.00	\$ 283.61	\$ 6,806.64	\$ -	\$ 6,806.64	\$	-
6	Cimbrado y colado de dala de coronacion de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor	ml	20.00	0.0000	0.00	0.00	20.00	\$ 256.19	\$ 5,123.80	\$ -	\$ -	\$	5,123.80
7	Relleno compactado al 95% con material producto de excavacion en capas de 20 cm de espesor con ballarina, incluye: incorporacion de agua necesaria, tendido de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	37.50	66.9400	0.00	66.94	-29.44	\$ 320.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 21,420.80	-\$	9,420.80
8	Fabricacion y colocacion de boca de cisterna 0.90 x 0.90 m, marco y contra marco echo a base de angulo de acero de 1 1/2" x 1/4" y lamina antiderrapante calibre 12 incluye: materiales, mano de obra, trazo, cortes, soldadura, nivelacion, fondo anticorrosivo, detallado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	2.00	0.0000	2.00	2.00	0.00	\$ 4,418.285	\$ 8,836.57	\$ 8,836.57	\$ -	\$ -	

Fco. P. Herrera

[Signature]
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 16 (FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023
PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024



OBRA : CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

UBICACIÓN :
CONTRATISTA : OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PREBUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PREBUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
9	Cimbrado y colado de firme de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con doble malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado escobillado, desclimbado, curado, herramienta y equipo menor	m2	10.58	0.0000	0.00	0.00	10.58	\$ 270.00	\$ 2,866.60	\$ -	\$ -	\$ 2,866.60
10	Suministro y colocacion de bomba centrifuga Munich 110/220 V, potencia 1 HP, para bombear agua de cisternas, incluye: conexiones electricas, materiales, mano de obra, accesorios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	1.00	1.0000	2.00	0.00	1.00	\$ 11,900.00	\$ 11,900.00	\$ 23,800.00	\$ 11,900.00	\$ 11,900.00
11	Excavacion para cimentacion de locales en material tipo "B" a cielo abierto por medios mecanicos o manuales a una profundidad de 0.00 a 1.50 metros, incluye: mano de obra, trazo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	182.00	191.6800	0.00	191.68	-9.66	\$ 380.00	\$ 69,160.00	\$ -	\$ 72,830.80	-\$ 3,670.80
12	Aline y compactacion para cimiento con material producto de excavacion con ballarina, incluye: Incorporacion de agua necesaria, tendido de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	379.16	388.3600	0.00	388.36	-9.20	\$ 98.00	\$ 37,157.68	\$ -	\$ 38,059.28	-\$ 901.60
13	Construccion de cimentacion corrida 0.70 m x 1.50 m de altura en talud a base de muro piedra asentado con mortero-arena en proporcion 1:5 con una zapata a cada 11 m de seccion cuadrada 1.20x1.20 m x 0.20 m de espesor a cada 11 m de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzada con varilla corrugada del #3 a cada 20 cm en ambos sentidos con escuadras a 90° con anclaje al centro de columna de seccion 0.35x0.14 m x 4.50 m de altura reforzada con 4 varillas del #3 y estribos del #3 a cada 20 cm, incluye: cimbra muerta de columna y zapata hasta nivel de piso, relleno compactado, materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	379.16	388.3600	0.00	388.36	-9.20	\$ 554.00	\$ 210,054.64	\$ -	\$ 215,161.44	-\$ 5,096.80
14	Cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, desclimbado, herramienta y equipo menor	ml	274.76	274.7600	6.00	281.66	-6.80	\$ 256.19	\$ 70,390.76	\$ 1,742.09	\$ 70,390.76	-\$ 1,742.09
15	Construccion de muro de ladrillo adobon 6x14x28 cm (o block 11x14x28) colocado de soja 14 cm de espesor, acabado comun asentado con mortero-arena en proporcion 1:3 para locales comerciales, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, andamios, acabado comun, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	1,094.64	928.7500	15.00	944.35	150.29	\$ 367.00	\$ 401,732.88	\$ 5,725.20	\$ 340,851.25	\$ 55,156.43
16	Cimbrado y colado de dala de coronacion de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, desclimbado, herramienta y equipo menor	ml	379.16	387.9300	6.80	394.73	-15.57	\$ 256.19	\$ 97,137.00	\$ 1,742.09	\$ 99,383.79	-\$ 3,988.88

Handwritten signature

Handwritten mark



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 16 (FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023
PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024



OBRA : CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

UBICACIÓN :
CONTRATISTA : OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTRACION ACUMULADA	BALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTRACION ACUMULADA ANTERIOR	BALDO	
17	Cimbrado y colado de castillo de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor	ml	338.80	364.8000	9.60	374.40	-36.60	\$ 285.61	\$ 96,087.07	\$ 2,722.66	\$ 103,460.93	-\$	10,096.52
18	Suministro y colocacion de vigas IPS de acero de 4" 11.46 kg/m a cada 1.00 m en el lado corto para colocacion de boveduca como losa, incluye: materiales, mano de obra, trazo, cortes, soldadura, anclaje, fondo anticorrosivo, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	524.00	613.8700	0.00	613.87	-89.87	\$ 363.81	\$ 190,636.44	\$ -	\$ 223,332.04	-\$	32,696.60
19	Suministro y colocacion de boveduca 100x20x10 cm y colado de capa de compresion 6 cm de espesor f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzada con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, andamios, acabado comun, vibrado, curado de concreto, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	686.2300	0.00	686.23	-48.23	\$ 320.00	\$ 204,160.00	\$ -	\$ 219,593.60	-\$	15,433.60
20	Colado de hormigon de jalcreto en proporcion 1:5:2 (mortero-jal-arena) en losa de azotea con pendiente del 2% a 3 aguas, incluye: material, mano de obra, fabricacion de jalcreto en obra, nivelacion, acabado repellido, curado de jalcreto, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	700.1900	0.00	700.19	-62.19	\$ 297.00	\$ 189,486.00	\$ -	\$ 207,956.43	-\$	18,470.43
21	Construccion de pretil a base muro de ladrillo adobon 6x14x28 cm colocado de sogá 14 cm de espesor, acabado comun asentado con mortero-arena en proporcion 1:3, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, andamios, acabado comun, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	117.00	116.6200	0.00	116.62	0.38	\$ 291.77	\$ 34,137.09	\$ -	\$ 34,026.22	\$	110.87
22	Colocacion de ladrillo de azotea, aplicación de lechada cemento-arena en proporcion 1:6 para asentar ladrillo de azotes, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	674.5900	0.00	674.59	-36.59	\$ 297.00	\$ 189,486.00	\$ -	\$ 200,353.23	-\$	10,867.23
23	Aplicación en losa de azotes impermeabilizante acrilico fibratado con membrana de refuerzo, incluye: materiales, mano de obra, limpieza de superficie, sellado de grietas, aplicación de primer, dos manos de impermeabilizante, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	668.4400	0.00	668.44	-30.44	\$ 79.00	\$ 50,402.00	\$ -	\$ 52,806.76	-\$	2,404.76
24	Aplanados de muros a base de mortero-arena porporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelacion, construccion de boquillas en muros, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	2,189.28	2037.4000	31.29	2,068.60	120.68	\$ 395.00	\$ 864,765.60	\$ 12,324.00	\$ 804,773.00	\$	47,668.60
25	Aplanados de bovedas a base de mortero-arena porporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelacion, construccion, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	618.6600	0.00	618.66	19.44	\$ 395.00	\$ 252,010.00	\$ -	\$ 244,331.20	\$	7,678.80
26	Afine y compactacion para firmes en locales con material producto de excavacion con bailarina, incluye: incorporacion de agua necesaria, tendido de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	512.3200	0.00	512.32	125.68	\$ 98.00	\$ 62,524.00	\$ -	\$ 50,207.36	\$	12,316.64

J. Be. toin





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 16 (FINQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

OBRA : CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

UBICACIÓN :
CONTRATISTA : OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	BALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	BALDO
27	Colado en locales de firme de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado escobillado, descimbrado, curado, herramienta y equipo menor	m2	638.00	0.0000	0.00	0.00	638.00	\$ 270.00	\$ 172,260.00	\$ -	\$ -	\$ 172,260.00
28	Suministro y colocacion de tuberia de PVC sanitaria 8" para descarga a drenaje municipal, incluye: materiales, mano de obra, conexiones, excavacion de zanja, tendido de tuberia, prueba hidrostatica, relleno compactado con material producto de excavacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	122.00	122.0000	0.00	122.00	0.00	\$ 190.00	\$ 23,180.00	\$ -	\$ 23,180.00	\$ -
29	Suministro y colocacion de tuberia de PVC sanitaria 4" para descarga de wc y traja hacia lines principal, incluye: materiales, mano de obra, conexiones, excavacion de zanja, tendido de tuberia, prueba hidrostatica, relleno compactado con material producto de excavacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	156.60	275.4400	0.00	275.44	-118.84	\$ 98.00	\$ 15,346.80	\$ -	\$ 26,993.12	-\$ 11,646.32
30	Construccion de registro sanitario de dimensiones 0.80x0.80x1.00 m a base de ladrillo adobon 6x14x28 colocado de soga 14 cm de espesor, asentado y aplanado con mortero-arena 1:4, marco y contramarco de 1 1/2" x 3/16" y tapa de concreto de 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzado con varilla del #3 a cada 20 cm en ambos sentidos, incluye: materiales, mano de obra, excavacion, trazo, nivelacion, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	4.00	7.0000	0.00	7.00	-3.00	\$ 4,118.30	\$ 16,473.20	\$ -	\$ 28,828.10	-\$ 12,354.90
31	Suministro y colocacion de piso Navia gris 37x37 cm G236 en interior de locales comerciales, incluye: materiales, mano de obra, trazo, cortes, nivelacion, limpieza, junteo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	522.7700	0.00	522.77	115.23	\$ 245.00	\$ 156,310.00	\$ -	\$ 128,078.65	\$ 28,231.35
32	Colocacion de zoclo de piso Navia gris 37x37 cm G236 en interior de local comercial, incluye: materiales, mano de obra trazo, cortes, nivelacion, limpieza, junteo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	498.80	461.4400	0.00	461.44	37.36	\$ 97.00	\$ 48,383.00	\$ -	\$ 44,759.68	\$ 3,623.92
33	Aplicación de pintura vinilica acrilica color blanco marca Casther lines Tonal a dos manos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	2,827.28	1750.4600	31.20	1,781.66	1045.62	\$ 58.00	\$ 163,962.24	\$ 1,809.60	\$ 101,526.68	\$ 60,645.96
34	Suministro y colocacion de red hidraulica con tuberia de PVC hidraulico 1 1/2" cedula 40 , incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	156.60	0.0000	0.00	0.00	156.60	\$ 180.00	\$ 28,188.00	\$ -	\$ -	\$ 28,188.00
35	Suministro y colocacion de mueble de baño WC blanco marca Cato, incluye: ranuras, canalizaciones, tuberia hidraulica, taza de baño, tanque, asiento de baño, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	32.0000	0.00	32.00	-3.00	\$ 2,100.00	\$ 60,900.00	\$ -	\$ 67,200.00	-\$ 6,300.00
36	Suministro y colocacion de llave de chorro, incluye: ranuras, canalizaciones, tuberia hidraulica en CPVC 1/2", accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	0.0000	0.00	0.00	29.00	\$ 670.00	\$ 19,430.00	\$ -	\$ -	\$ 19,430.00
37	Suministro y colocacion de tinaco 1100 litros Suplast bicapa negro 1.08 m de diametro x 1.50 m de altura, incluye: suministro y colocacion de base para tinaco de 1.00 m de altura, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	14.00	16.0000	0.00	16.00	-2.00	\$ 3,900.00	\$ 54,600.00	\$ -	\$ 62,400.00	-\$ 7,800.00

Fco. B. Herin



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 16 (FINIQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

OBRA : CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

UBICACIÓN :
CONTRATISTA : OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
38	Suministro e instalacion de luminaria led tecnolite 4" de diametro 6 W 120/240 V color blanca, incluye: ranuras, canalizaciones con tuberia de PVC conduit 3/4", cable cal. 12 hacia centro de carga, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	87.00	96.0000	0.00	96.00	-9.00	\$ 780.00	\$ 67,860.00	\$ -	\$ 74,880.00	-\$ 7,020.00
39	Suministro e instalacion de contacto duplex 2 polos, 3 modulos Estevez N1328 con tapadera, incluye: ranuras, canalizaciones con tuberia de PVC conduit 3/4", cable cal. 12 hacia centro de carga, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	58.00	64.0000	0.00	64.00	-6.00	\$ 780.00	\$ 45,240.00	\$ -	\$ 49,920.00	-\$ 4,680.00
40	Suministro e instalacion de apagador sencillo con placa Estevez 250 V 10 A color blanco, incluye: ranuras, canalizaciones con tuberia de PVC conduit 3/4", cable cal. 12 hacia centro de carga, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	58.00	32.0000	0.00	32.00	26.00	\$ 780.00	\$ 45,240.00	\$ -	\$ 24,960.00	\$ 20,280.00
41	Suministro e instalacion de centro de carga de 1 circuito para empotrar monofasico 50 A Bticino 120/240 V, incluye: suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1 polo 20 amperes Bticino, ranuras, canalizaciones, conexión de cable alimentador, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	32.0000	0.00	32.00	-3.00	\$ 270.00	\$ 7,830.00	\$ -	\$ 8,640.00	-\$ 810.00

Fco. Baltrín





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 16 (FINIQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

OBRA : CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC



UBICACIÓN :
CONTRATISTA : OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PREBUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PREBUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
42	Suministro y tendido subterráneo de línea de cable 2x1 calibre 6 de conexión CFE a centros de carga de locales de centro de carga, incluye: suministro e instalación de acometida, base para medidor, ranuras, canalizaciones, conexión de cable alimentador, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	214.60	0.0000	0.00	0.00	214.60	\$ 121.00	\$ 25,966.60	\$ -	\$ -	\$ 25,966.60
43	Suministro e instalación de acometida en locales comerciales con muña roscada, tubería de acero roscado de pared gruesa, base para medidor 4 terminales, reducción bushing de 1 1/4" a 1/2" conector para tubo conduct 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	29.00	0.0000	0.00	0.00	29.00	\$ 236.67	\$ 6,863.43	\$ -	\$ -	\$ 6,863.43
44	Suministro y colocación de puerta de tambor con triplay de 6 mm de espesor, incluye: bastidor, marco de madera, bisagras, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	29.00	32.0000	0.00	32.00	-3.00	\$ 2,100.00	\$ 60,900.00	\$ -	\$ 67,200.00	-\$ 6,300.00
45	Suministro y colocación de ventana de aluminio de sección 0.30 m de alto x 0.90 m de ancho gama básica una hoja corrediza y un fijo acabado color blanco cristal 6 mm, incluye: herrajes, materiales, sello, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	29.00	31.0000	0.00	31.00	-2.00	\$ 2,100.00	\$ 60,900.00	\$ -	\$ 65,100.00	-\$ 4,200.00
46	Suministro y colocación de cortina enrollable de lamas de lámina de acero galvanizado, panel ciego de 2.50 x 3.00 m acabado natural, apertura manual con cerradura de seguridad al suelo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	29.00	32.0000	0.00	32.00	-3.00	\$ 15,300.00	\$ 443,700.00	\$ -	\$ 489,600.00	-\$ 45,900.00
SUBTOTAL								\$ 4,666,274.64	\$ 58,702.21			

2.- ADICIONALES

AD-1	Suministro y colocación de tubería de PVC sanitaria 6" para descarga de agua pluvial, incluye: materiales, mano de obra, conexiones, excavación de zanja, tendido de tubería, prueba hidrostática, relleno compactado con material producto de excavación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	0.00	122.0000	0.00	122.00	-122.00	\$ 190.00	\$ -	\$ -	\$ 23,180.00	-\$ 23,180.00
AD-2	Construcción de registro pluvial de dimensiones 0.60x0.60 m medida exterior hasta 50 cm de profundidad base de bloque de jalisco 11x14x28 colocado de capuchino, asentado y aplanado con mortero-arena 1:4, tapa de concreto de 200 kg/cm ² en proporción 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño máximo del agregado 3/4" reforzado con varilla #3 a cada 20 cm en ambos sentidos, incluye: materiales, mano de obra, excavación, trazo, nivelación, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	0.00	13.0000	0.00	13.00	-13.00	\$ 3,126.70	\$ -	\$ -	\$ 40,647.10	-\$ 40,647.10
AD-3	Colado en locales de firme de jalisco en proporción 1.00 : 2 : 15 : 10 : 8 (cemento-mortero-jal-arena-agua), incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelación, fabricación de jalisco en obra, acabado escobillado, desmbrado, curado, herramienta y equipo menor	m2	0.00	512.3200	0.00	512.32	-512.32	\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ 117,833.60	-\$ 117,833.60
AD-4	Aplicación de pasta textupint en muros y bóvedas de locales comerciales acabado floateado, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, colocación de andamios, y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	0.00	1341.1500	31.29	1,372.35	-1372.35	\$ 90.00	\$ -	\$ 2,808.00	\$ 120,703.50	-\$ 123,511.50

Handwritten signature: Flo. Bertrán



Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 16 (FINIQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

OBRA : CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC


UBICACIÓN :
CONTRATISTA : OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PREBUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PREBUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
AD-5	Construcción de muro de block 11x14x28 colocado de capuchino 11 cm de espesor, asentando con mortero-arena en proporción 1:3 para área de cisterna de 10,000 litros, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelación, andamios, acabado común, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	0.00	22.9000	0.00	22.90	-22.90	\$ 327.00	\$ -	\$ -	\$ 7,488.30	-\$ 7,488.30
AD-6	Construcción de muro de ladrillo 6x14x28 colocado de capuchino 6 cm de espesor, asentando con mortero-arena en proporción 1:3, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelación, andamios, acabado común, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	0.00	144.9700	0.00	144.97	-144.97	\$ 324.96	\$ -	\$ -	\$ 47,109.46	-\$ 47,109.46
AD-7	Colocacion de adoquín sobre cama de arena fuera de locales comerciales, incluye: trazo, nivelacion, compactacion mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	0.00	421.9200	0.00	421.92	-421.92	\$ 86.95	\$ -	\$ -	\$ 36,885.94	-\$ 36,885.94
AD-8	Suministro y colocacion de lavabo marca Cato color blanco, incluye: ranuras, canalizaciones, tubería hidráulica en tuboplus 1/2", bajada hidráulica de tinaco en tuboplus 1", derivacion de línea de bajada de tinaco en tuboplus 3/4", accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	0.00	32.0000	0.00	32.00	-32.00	\$ 1,812.93	\$ -	\$ -	\$ 58,013.76	-\$ 58,013.76
AD-9	Construccion de barra de concreto de 1.80 m x 0.80 m x 10 cm de espesor f'c= 200 kg/cm2 en proporción 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arenagrava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzado con varillas del #4 a cada 15 cm en ambos sentidos, incluye: mano de obra, trazo, cimbrado, armado, colado de firme de concreto, acabado de concreto pulido, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	0.00	2.0000	0.00	2.00	-2.00	\$ 8,958.25	\$ -	\$ -	\$ 17,916.50	-\$ 17,916.50
AD-10	Fabricacion y colocacion de puerta de dimensiones 0.90 x 2.20 m de acero echa a base de marco perfil T 40 E 1 1/2" c.18, perfil interior tubular R 40, revestida con lamina negra lisa cal. 18, refuerzos de solera de 1/2" x 3/16", ventana en parte superior 0.15x0.90 m con mosquired galvanizado y chapa instala facil Phillips 715, incluye: trazo, nivelacion, cortes, soldadura, detallado, fondeado, pintura, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	0.00	0.0000	4.00	4.00	-4.00	\$ 8,979.74	\$ -	\$ 35,918.96	\$ -	-\$ 35,918.96
AD-11	Fabricacion y colocacion de puerta de acero de dimensiones 1.20 x 2.20 m echa a base de marco perfil T 40 E 1 1/2" c.18, perfil interior tubular R 40, revestida con perfil persiana tipo Z cal. 18, refuerzos de tubular de 1/2" x 1/2" cal. 18, chapa Dexter tipo paleta, incluye: trazo, nivelacion, cortes, soldadura, detallado, fondeado, pintura, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	0.00	0.0000	1.00	1.00	-1.00	\$ 10,436.96	\$ -	\$ 10,436.96	\$ -	-\$ 10,436.96
AD-12	Fabricacion y colocacion de ventana de acero de dimensiones 1.90 x 0.80 m echa a base de marco perfil tubular R 40, revestida con perfil persiana tipo Z cal. 18, refuerzos de tubular de 1/2" x 1/2" cal. 18, incluye: trazo, nivelacion, cortes, soldadura, detallado, fondeado, pintura, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	0.00	0.0000	2.00	2.00	-2.00	\$ 7,472.10	\$ -	\$ 14,944.20	\$ -	-\$ 14,944.20
AD-13	Fabricacion y colocacion de puerta de acero de dimensiones 0.75 x 2.10 m echa a base de marco perfil T 40 E 1 1/2" c.18, perfil interior tubular R 40, revestida con perfil persiana tipo Z cal. 18, refuerzos de tubular de 1/2" x 1/2" cal. 18, pasador prefabricado, incluye: trazo, nivelacion, cortes, soldadura, detallado, fondeado, pintura, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	0.00	0.0000	2.00	2.00	-2.00	\$ 8,392.55	\$ -	\$ 16,785.10	\$ -	-\$ 16,785.10



Fco. R. Ortiz

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 16 (FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ-OP-CSS-024/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024


OBRA : CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

UBICACIÓN :
CONTRATISTA : OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
AD-14	Construccion de losa de concreto de 8 cm de espesor f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: mano de obra, afino, trazo, cimbrado, armado, colado de firme de concreto, acabado de concreto pulido y semipulido, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	0.00	0.0000	4.03	4.03	-4.03	\$ 938.72	\$ -	\$ 3,783.04	\$ -	\$ -	\$ 3,783.04
AD-15	Suministro y conexon de toma de agua 1/2" con abrazadera desde tubería principal, valvulas y conexiones, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	partida	0.00	0.0000	1.00	1.00	-1.00	\$ 3,968.05	\$ -	\$ 3,968.05	\$ -	\$ -	\$ 3,968.05
AD-16	Suministro y colocacion de rejillas de acero 0.60 x 0.60 m echas a base de angulo de 1" x 1/8" y solera de 1" x 3/16" con 4 partas de angulo para registros pluviales, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	0.00	0.0000	6.00	6.00	-6.00	\$ 1,372.87	\$ -	\$ 8,237.22	\$ -	\$ -	\$ 8,237.22
AD-17	Conexión de línea principal de drenaje de locales comerciales a pozo de visita de drenaje municipal existente, incluye: retiro de empedrado con recuperacion, retiro de adoquin con recuperacion, corte y demolicion de huella de concreto, excavacion, afine de excvacion, tendido tubería de PVC sanitario de 8", conexiones, relleno con tepetate, compactacion, colocacion de empedrado, colocacion de adoquin, colado de huella de concreto, retiro de escombros, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	lote	0.00	0.0000	1.00	1.00	-1.00	\$ 28,758.08	\$ -	\$ 28,758.08	\$ -	\$ -	\$ 28,758.08
SUBTOTAL								\$ -	\$ 125,639.81				
TOTAL								\$ 4,666,274.64	\$ 184,341.82	\$ 4,817,341.97	\$ -	\$ 311,612.39	


OCTAVA CUATRO VISTAS S.A. DE C.V.
JUAN PABLO ENRIQUEZ CASILLAS
CONTRATISTA


ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS





DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

LOCALIDAD: CHANTEPEC

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Fabricacion y colocacion de boca de sistema 0.90 x 0.90 m, marco y contra marco echo a base de angulo de acero de 1 1/2" x 1/4" y lamina antiderrapante calibre 12 incluye: materiales, mano de obra, trazo, cortes, soldadura, nivelacion, fondo anticorrosivo, detallado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion


Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	W-X	1	2	2.00

Total (piezas)= 2.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING.J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

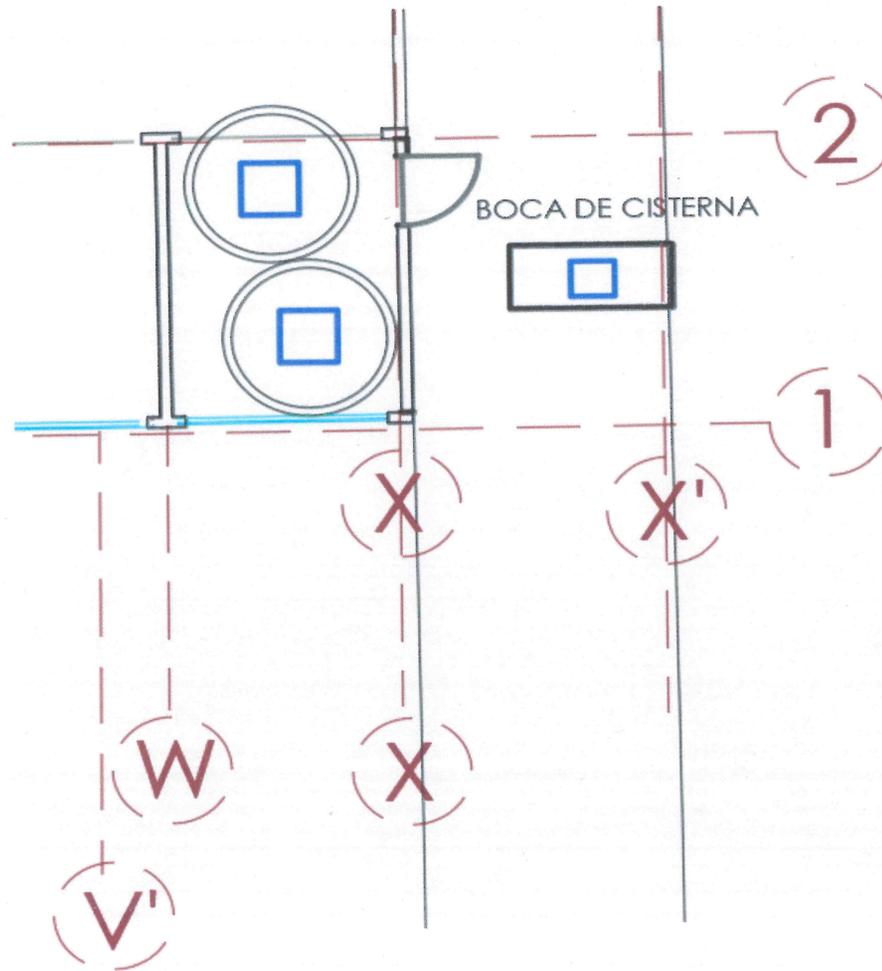

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ <i>Imelda</i>	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ <i>J. Ibarra</i>	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS <i>Luis Beltrán</i>	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC


LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

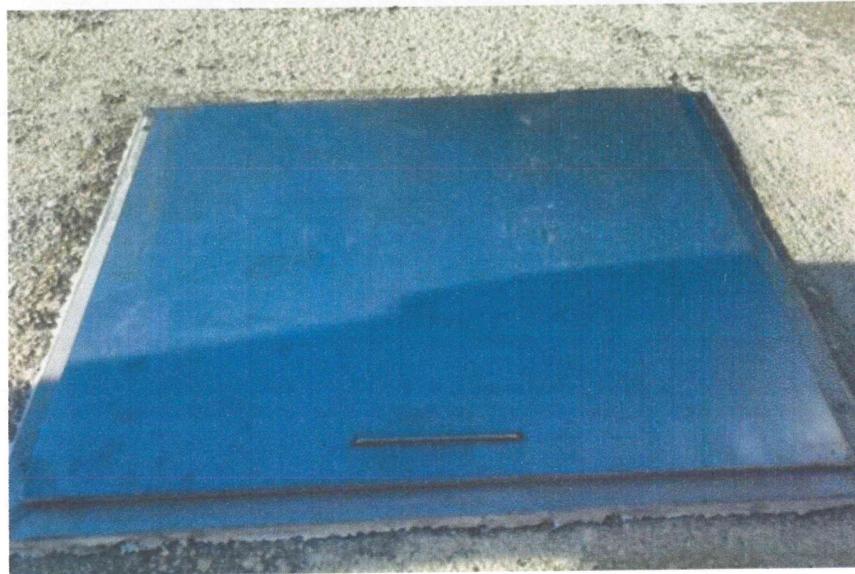

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING.J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA





FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

LOCALIDAD: CHANTEPEC

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO:



Suministro y colocacion de bomba centrifuga Munich 110/220 V, potencia 1 HP, para bombear agua de cisternas, incluye: conexiones electricas, materiales, mano de obra, accesorios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	W-X	1	2	2.00
Total (piezas)=				2.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

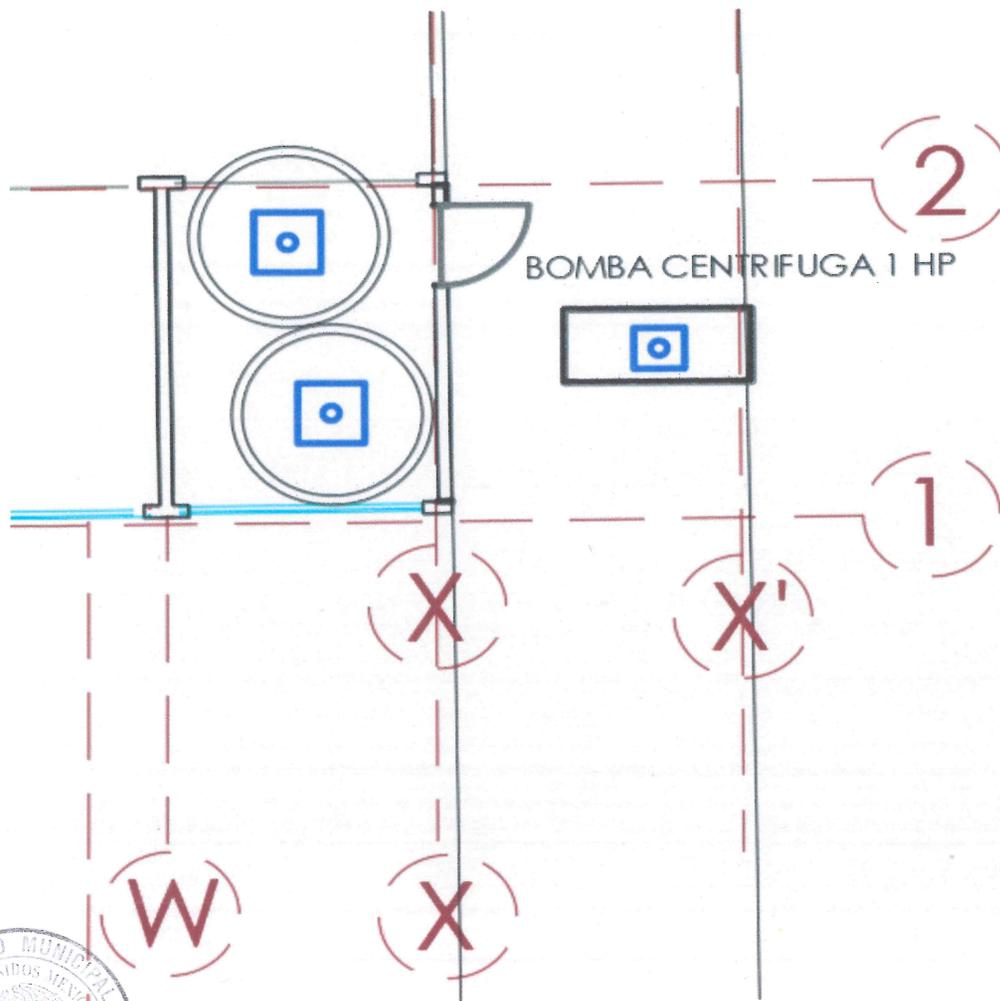

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS  RESIDENTE DE OBRA	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA:

4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO


LOCALIDAD: CHANTEPEC

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 29/04/2024 AL
03/05/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

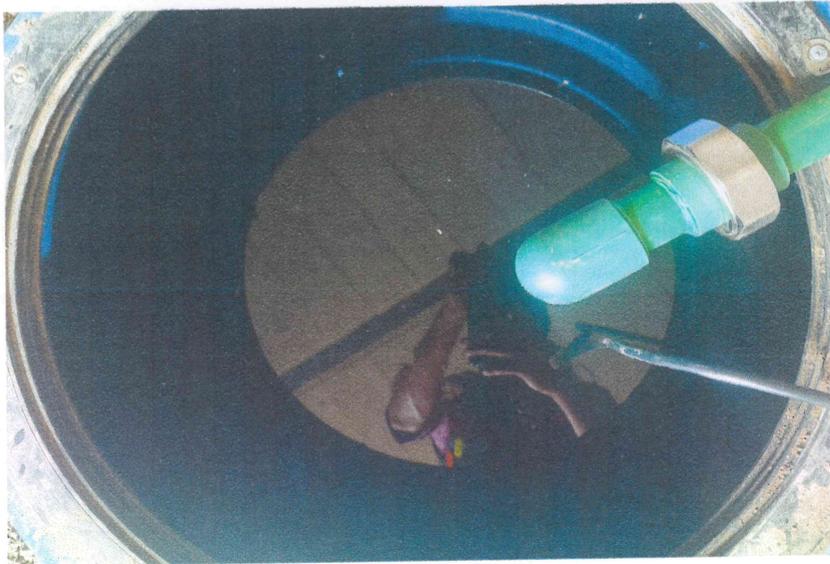

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RÉSIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024



NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:


Cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor


Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Longitud (ml)
ml	V'	6	7	2.00
ml	2	Q	R	2.00
ml	2	I	J	2.80

Total (ml)= 6.80

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

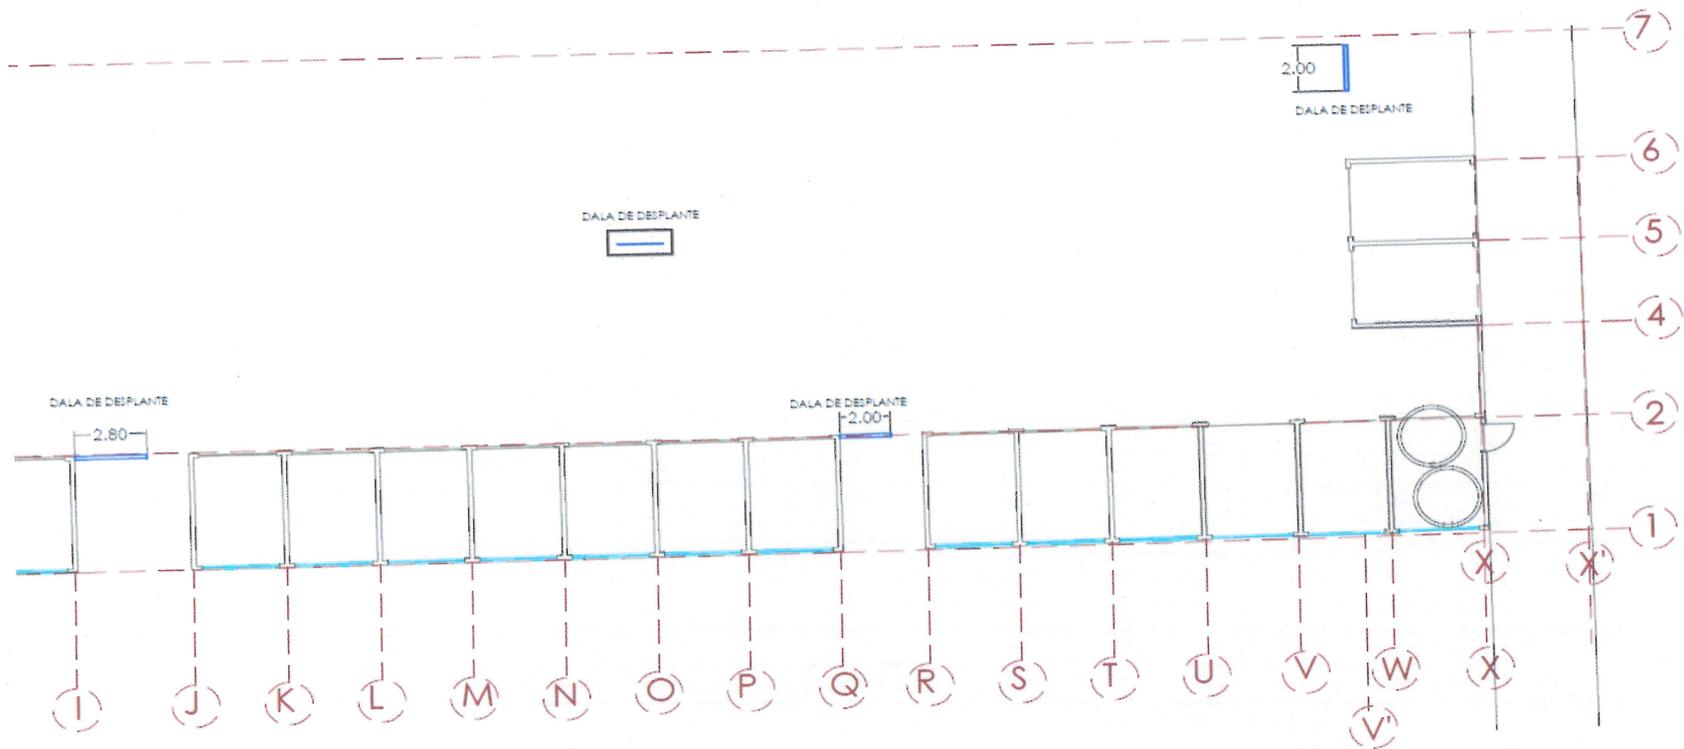

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRÁN CAMPAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

LOCALIDAD: CHANTEPEC

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO:

Construccion de muro de ladrillo adobon 6x14x28 cm (o block 11x14x28) colocado de soga 14 cm de espesor, acabado comun asentado con mortero-arena en proporcion 1:3 para locales comerciales, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, andamios, acabado comun, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Alto (m)	Area (m2)
m2	V'	6	7	1.60	2.60	4.16
m2	2	Q	R	1.80	2.60	4.68
m2	2	I	J	2.60	2.60	6.76
Total (m2)=						15.60

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

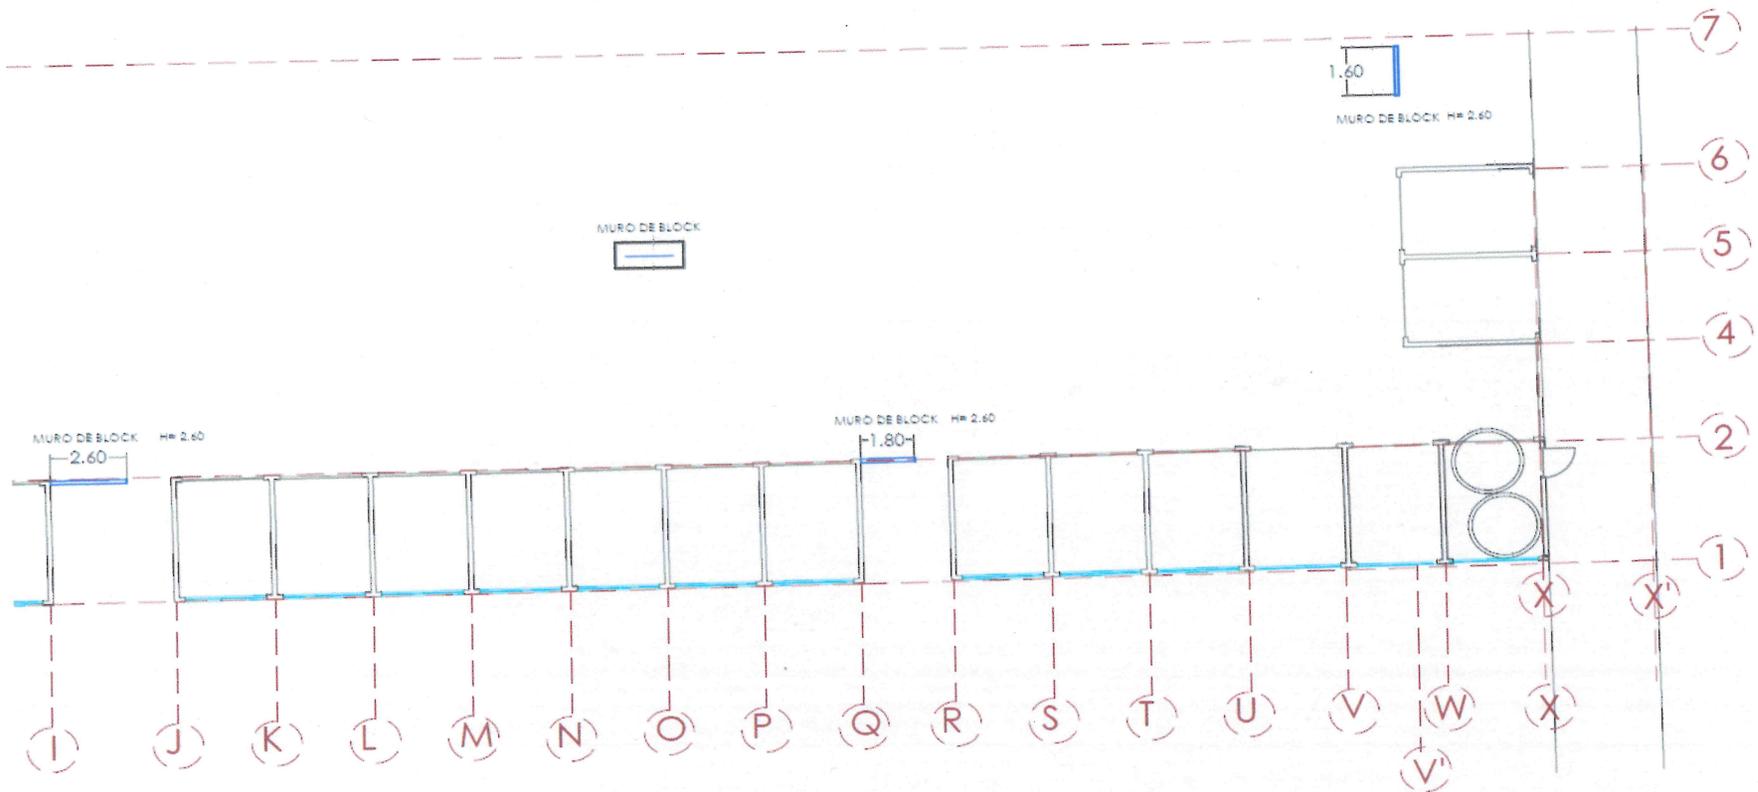

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ <i>[Signature]</i>	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ <i>[Signature]</i>	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS <i>[Signature]</i>	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS <i>Luis Francisco Beltrán</i> RESIDENTE DE OBRA
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

LOCALIDAD: CHANTEPEC

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO:



Cimbrado y colado de dala de coronacion de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Longitud (ml)
ml	V'	6	7	2.00
ml	2	Q	R	2.00
ml	2	I	J	2.80
Total (ml)=				6.80

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

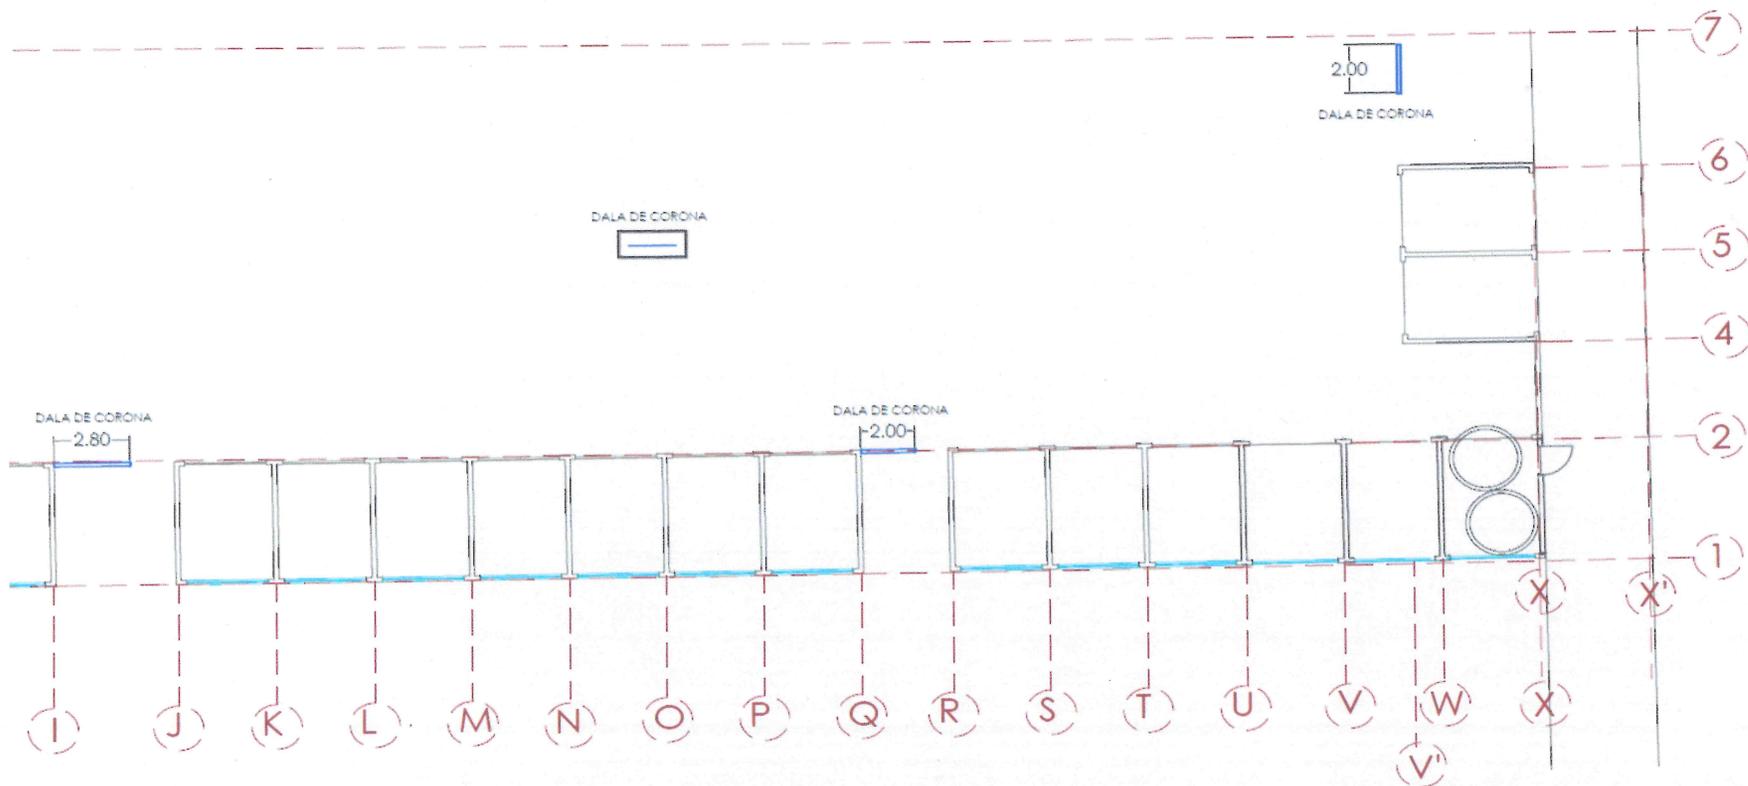

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS  RESIDENTE DE OBRA	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC



LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

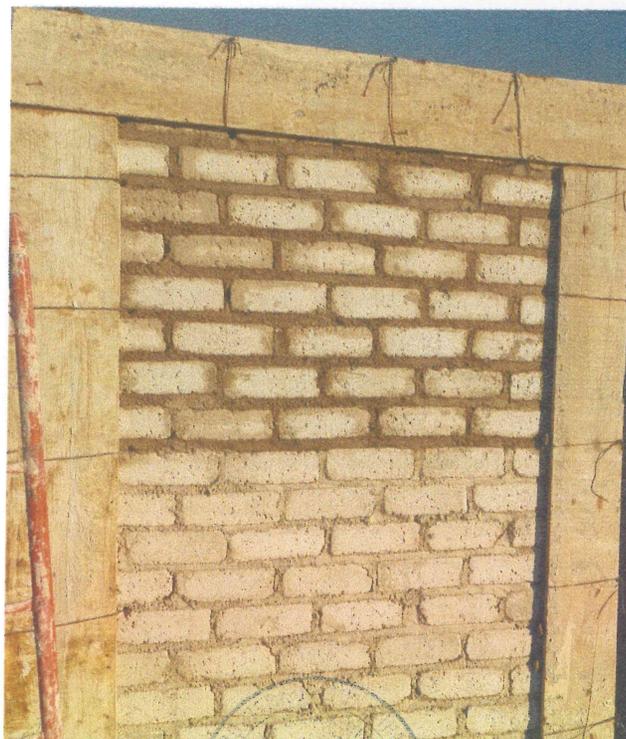

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS  RESIDENTE DE OBRA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO:

Cimbrado y colado de castillo de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado inculye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas	Altura (ml)	Longitud total (ml)
ml	V'	6	7	2.00	2.40	4.80
ml	2	Q	R	1.00	2.40	2.40
ml	2	I	J	1.00	2.40	2.40
Total (ml)=						9.60

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

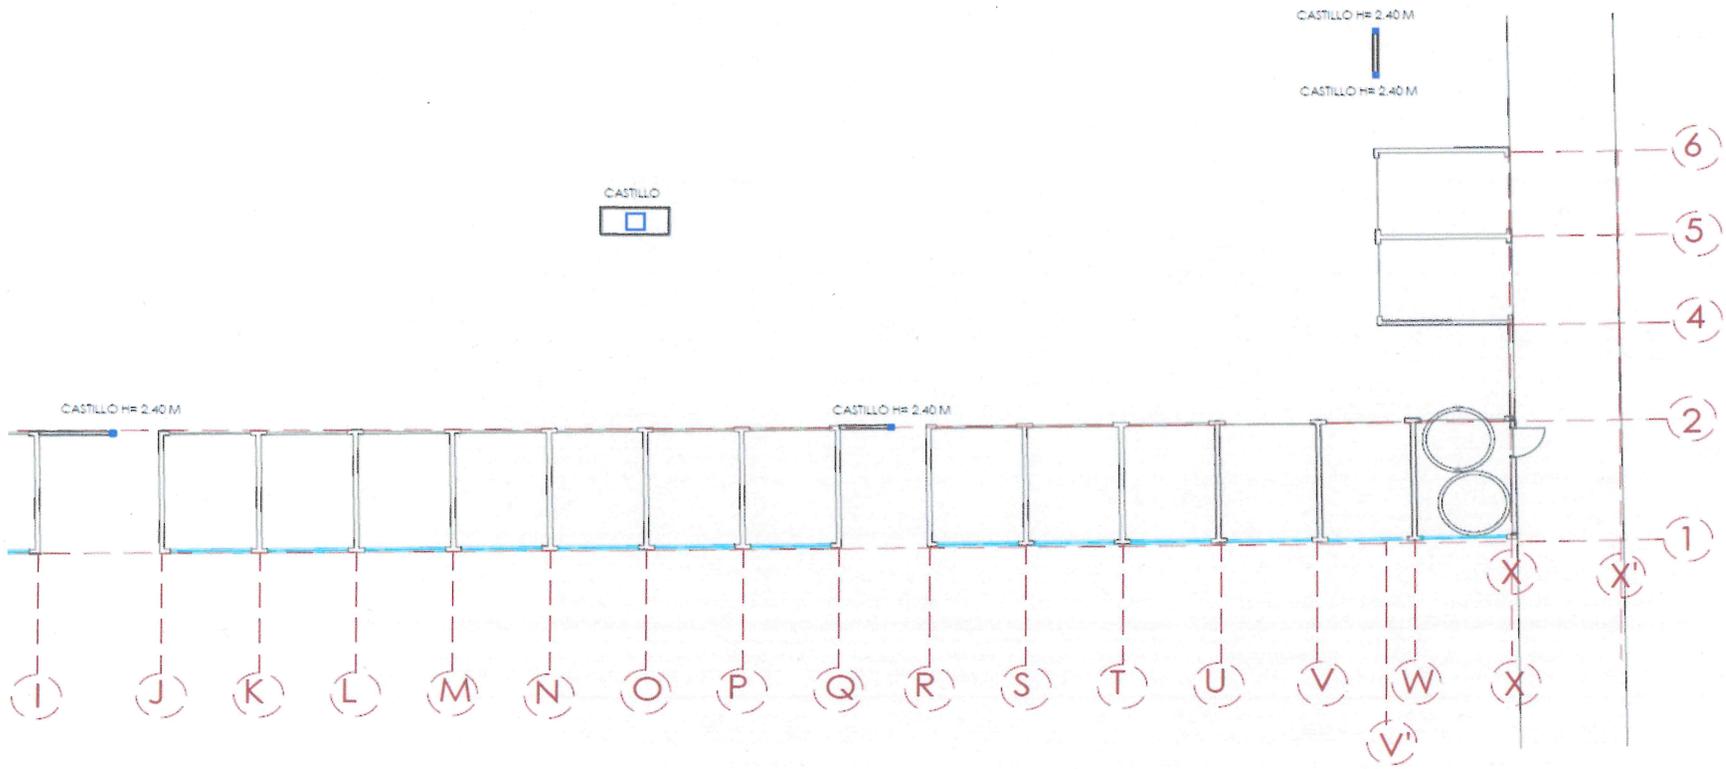

<p>C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ</p> 	<p>ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ</p> 	<p>ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS</p> 	
<p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA</p>	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA:

4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 29/04/2024 AL
03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:



DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO:

Aplanados de muros a base de mortero-arena porporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelacion, construccion de boquillas en muros, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Alto (m)	Caras	Area (m2)
m2	V'	6	7	1.60	2.60	2.00	8.32
m2	2	Q	R	1.80	2.60	2.00	9.36
m2	2	I	J	2.60	2.60	2.00	13.52
Total (m2)=							31.20

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

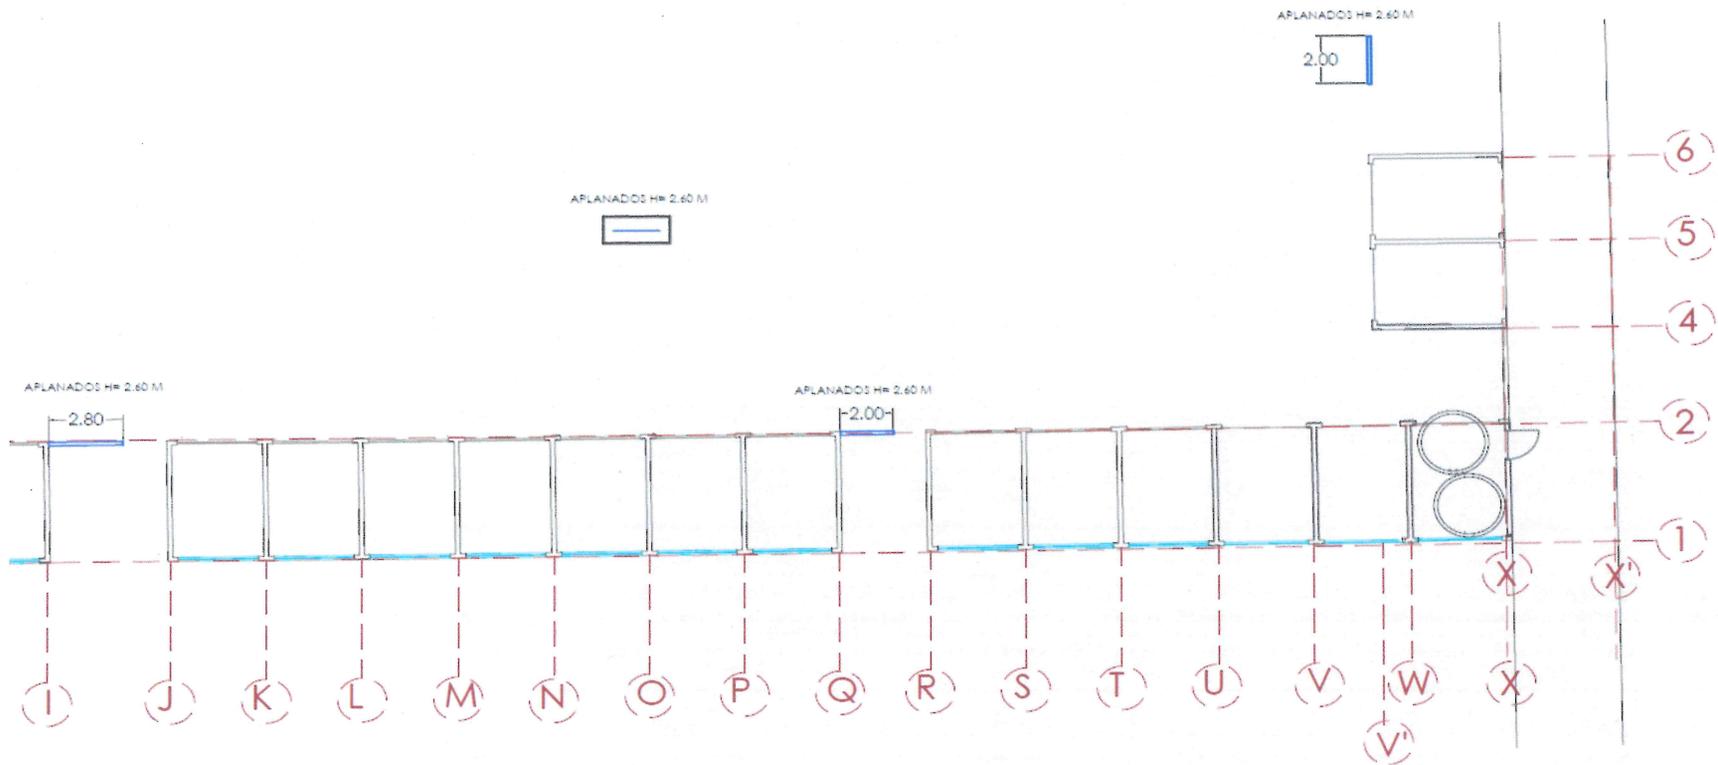

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ <i>Imelda</i>	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ <i>J. Ibarra</i>	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS <i>L. Beltrán</i>	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO:

Aplicación de pasta textupint en muros y bovedas de locales comerciales acabado foteado, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, colocacion de andamios, y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Alto (m)	Caras	Area (m2)
m2	V'	6	7	1.60	2.60	2.00	8.32
m2	2	Q	R	1.80	2.60	2.00	9.36
m2	2	I	J	2.60	2.60	2.00	13.52
Total (m2)=							31.20

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

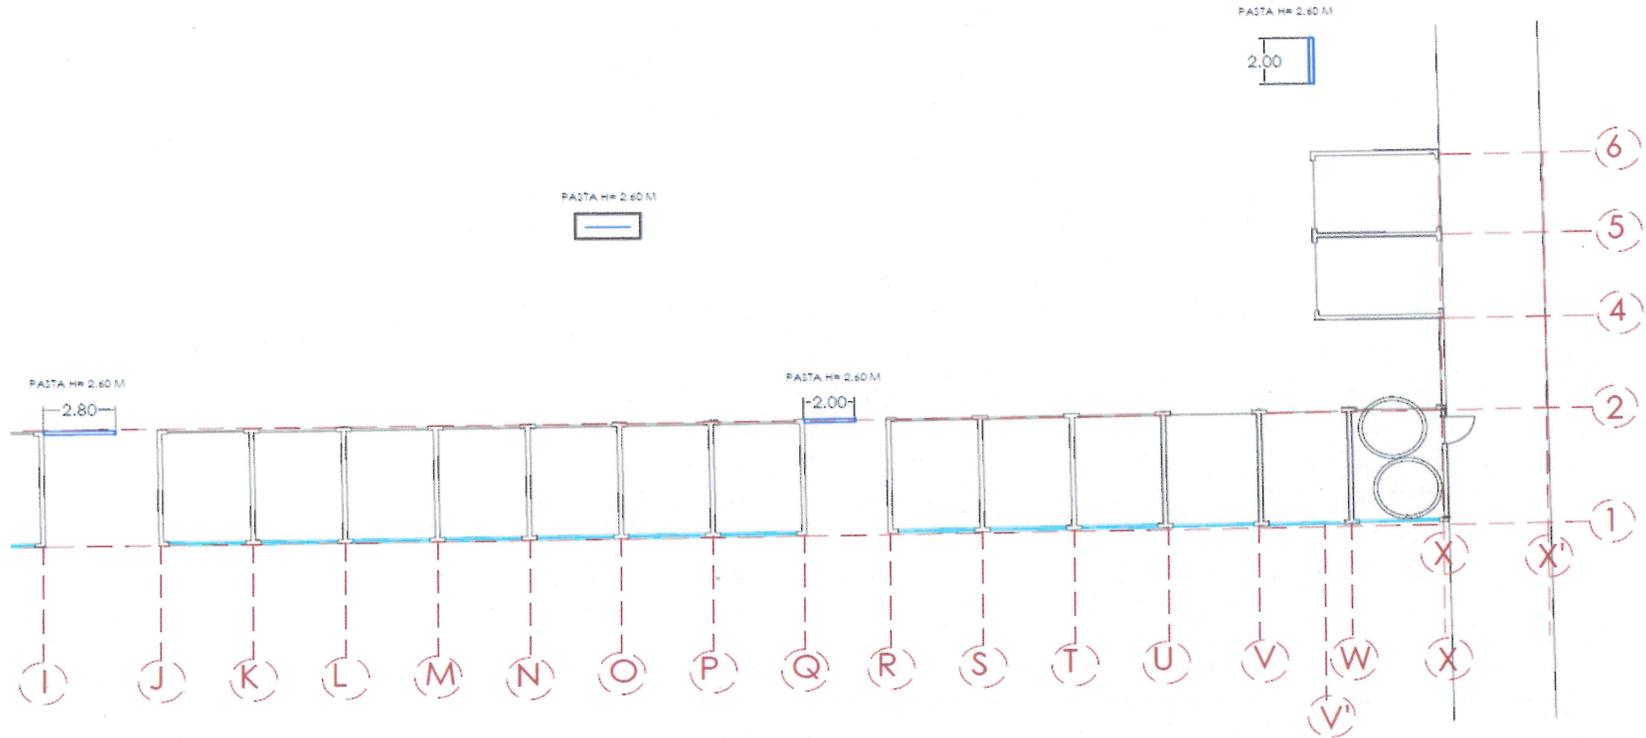

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Aplicación de pintura vinílica acrílica color blanco marca Casther línea Tonal a dos manos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Alto (m)	Caras	Area (m2)
m2	V'	6	7	1.60	2.60	2.00	8.32
m2	2	Q	R	1.80	2.60	2.00	9.36
m2	2	I	J	2.60	2.60	2.00	13.52
Total (m2)=							31.20

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ


ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

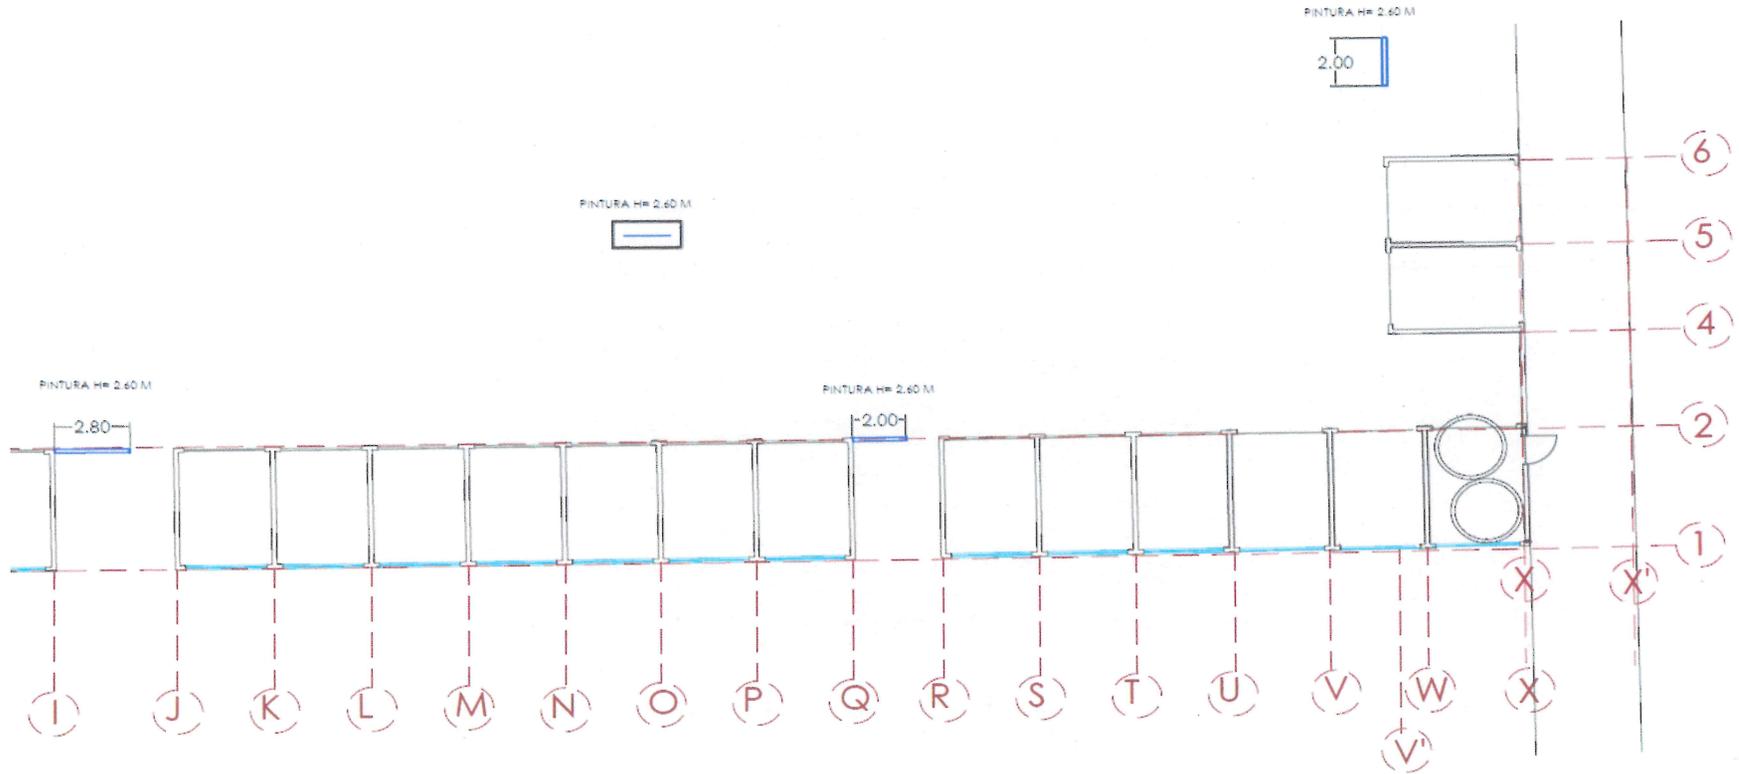

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ <i>[Signature]</i>	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ <i>[Signature]</i>	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS <i>[Signature]</i>
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Fabricacion y colocacion de puerta de dimensiones 0.90 x 2.20 m de acero echa a base de marco perfil T 40 E 1 1/2" c.18, perfil interior tubular R 40, revestida con lamina negra lisa cal. 18, refuerzos de solera de 1/2" x 3/16", ventana en parte superior 0.15x0.90 m con mosquired galvanizado y chapa instala facil Phillips 715, incluye: trazo, nivelacion, cortes, soldadura, detallado, fondeado, pintura, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	7	B'	-	1.00
pieza	7	C	-	1.00
pieza	6	B'	-	1.00
pieza	6	C	-	1.00

Total (piezas)= 4.00


C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


8

7

6

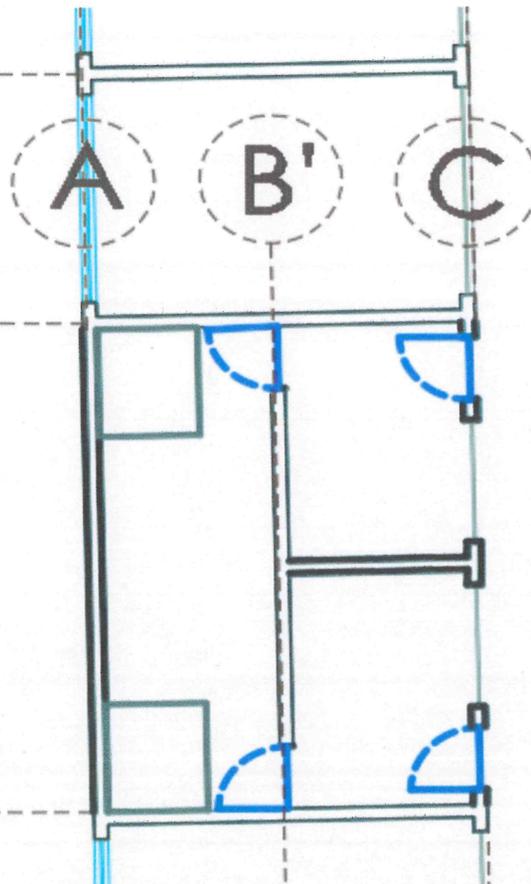

PUERTA DE ACERO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC


LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

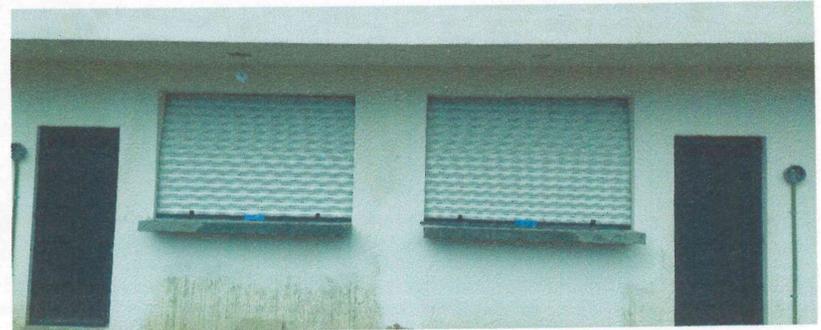

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024



NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:


Fabricacion y colocacion de puerta de acero de dimensiones 1.20 x 2.20 m echa a base de marco perfil T 40 E 1 1/2" c.18, perfil interior tubular R 40, revestida con perfil persiana tipo Z cal. 18, refuerzos de tubular de 1/2" x 1/2" cal. 18, chapa Dexter tipo paleta, incluye: trazo, nivelacion, cortes, soldadura, detallado, fondeado, pintura, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	X	1	2	1.00

Total (piezas)= 1.00

 C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS  RESIDENTE DE OBRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

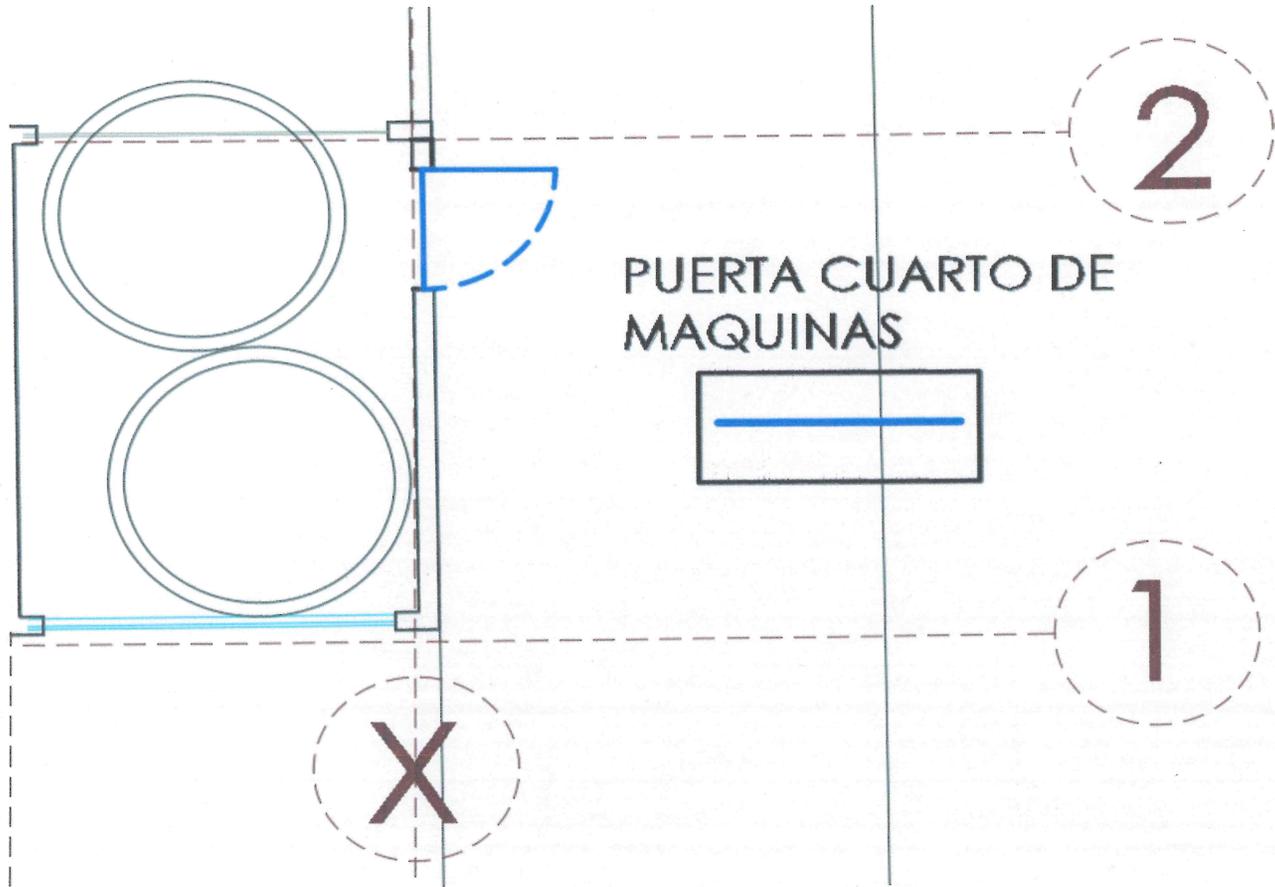

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS  RESIDENTE DE OBRA	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC


LOCALIDAD: CHANTEPEC


ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

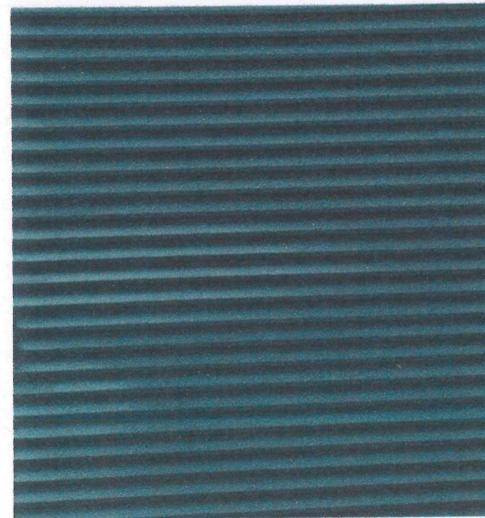

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA





FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024


NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:


Fabricacion y colocacion de ventana de acero de dimensiones 1.90 x 0.80 m echa a base de marco perfil tubular R 40, revestida con perfil persiana tipo Z cal. 18, refuerzos de tubular de 1/2" x 1/2" cal. 18, incluye: trazo, nivelacion, cortes, soldadura, detallado, fondeado, pintura, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	X	1	2	2.00

Total (piezas)= 2.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
		
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

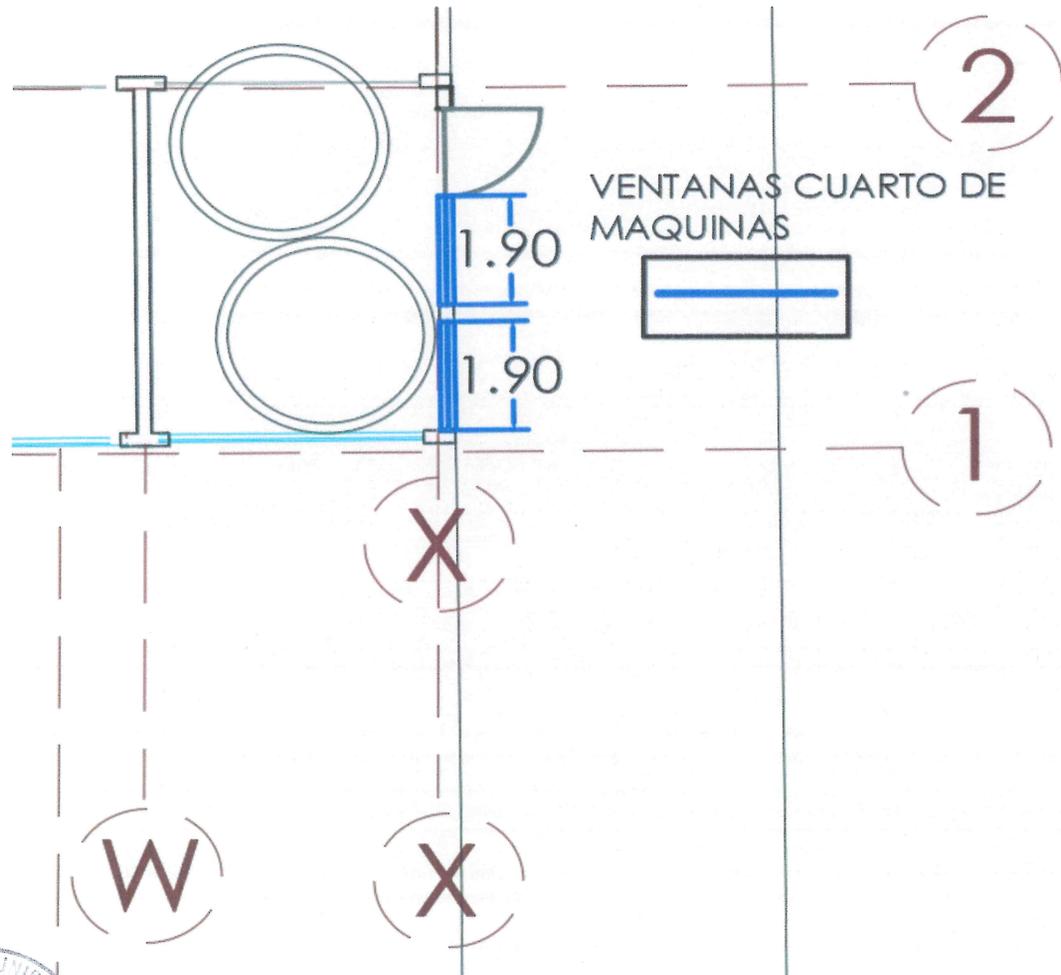

 <p>C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ</p>	<p>ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ</p>	<p>ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS</p>	
<p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA</p>	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC




LOCALIDAD: CHANTEPEC


ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

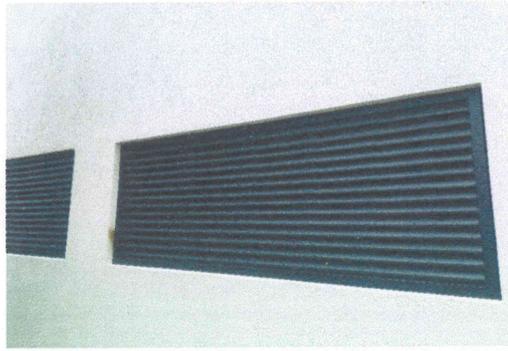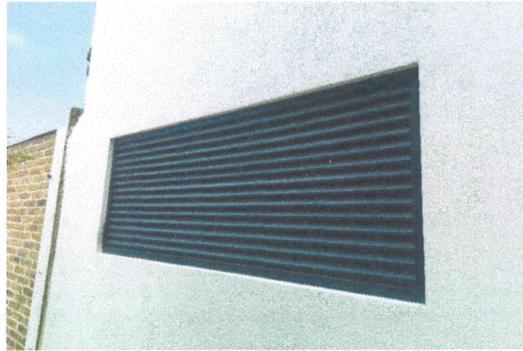

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

LOCALIDAD: CHANTEPEC

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:


Fabricacion y colocacion de puerta de acero de dimensiones 0.75 x 2.10 m echa a base de marco perfil T 40 E 1 1/2" c.18, perfil interior tubular R 40, revestida con perfil persiana tipo Z cal. 18, refuerzos de tubular de 1/2" x 1/2" cal. 18, pasador prefabricado, incluye: trazo, nivelacion, cortes, soldadura, detallado, fondeado, pintura, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion


Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	A-B'	6	7	2.00

Total (piezas)= 2.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

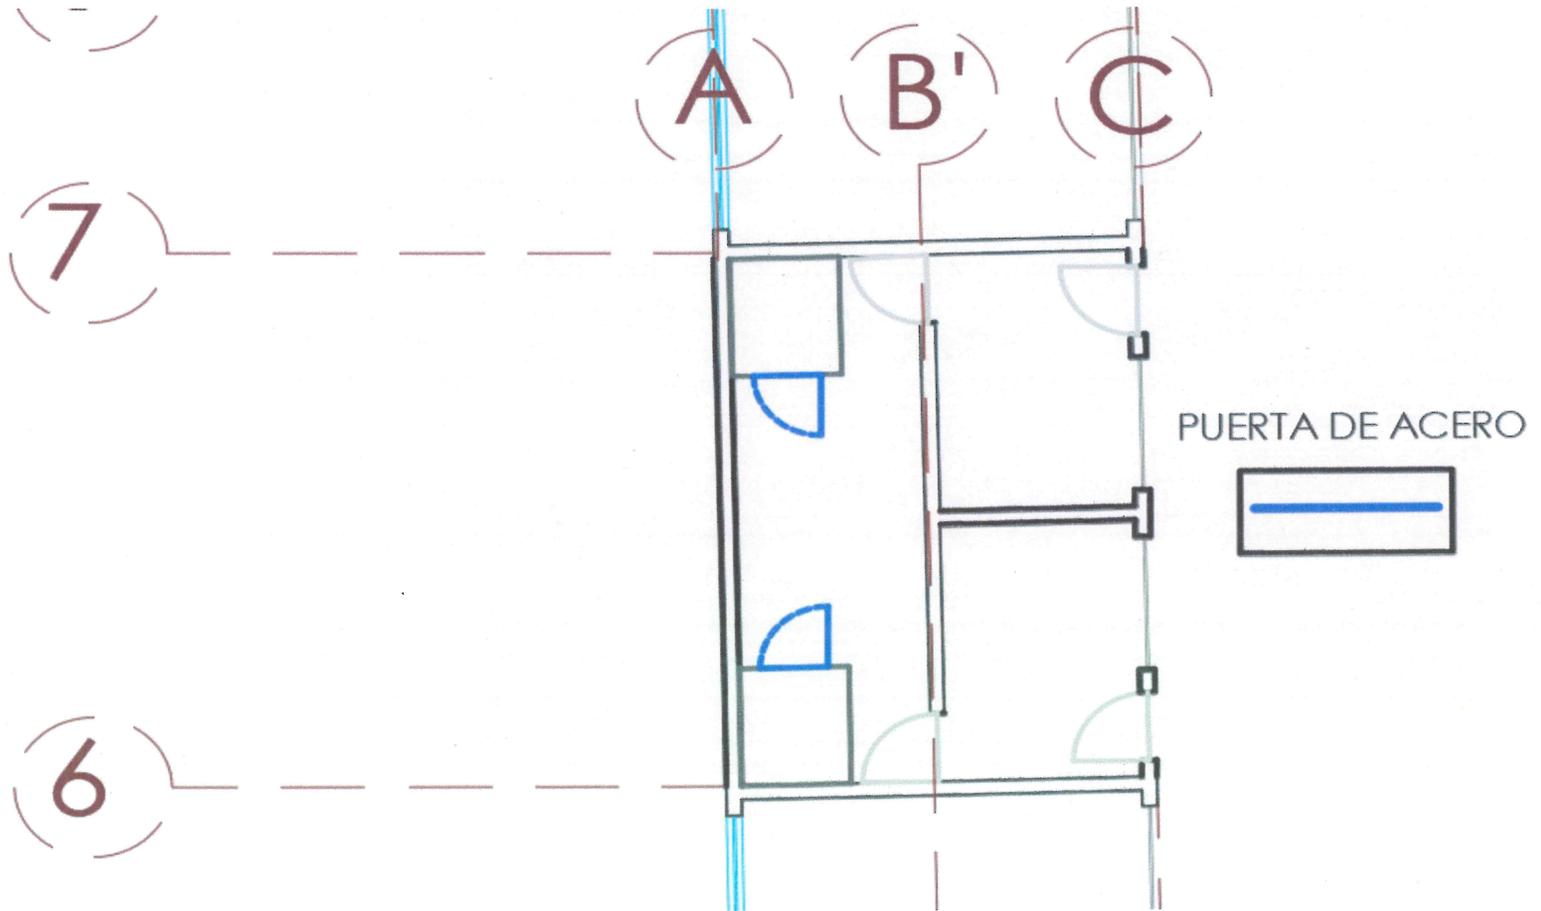

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:


Construccion de losa de concreto de 8 cm de espesor $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: mano de obra, afine, trazo, cimbrado, armado, colado de firme de concreto, acabado de concreto pulido y semipulido, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion



Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)
pieza	6	A	B'	1.55	1.30	2.015
pieza	7	A	B'	1.55	1.30	2.015

Total (piezas)= 4.03

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
		
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

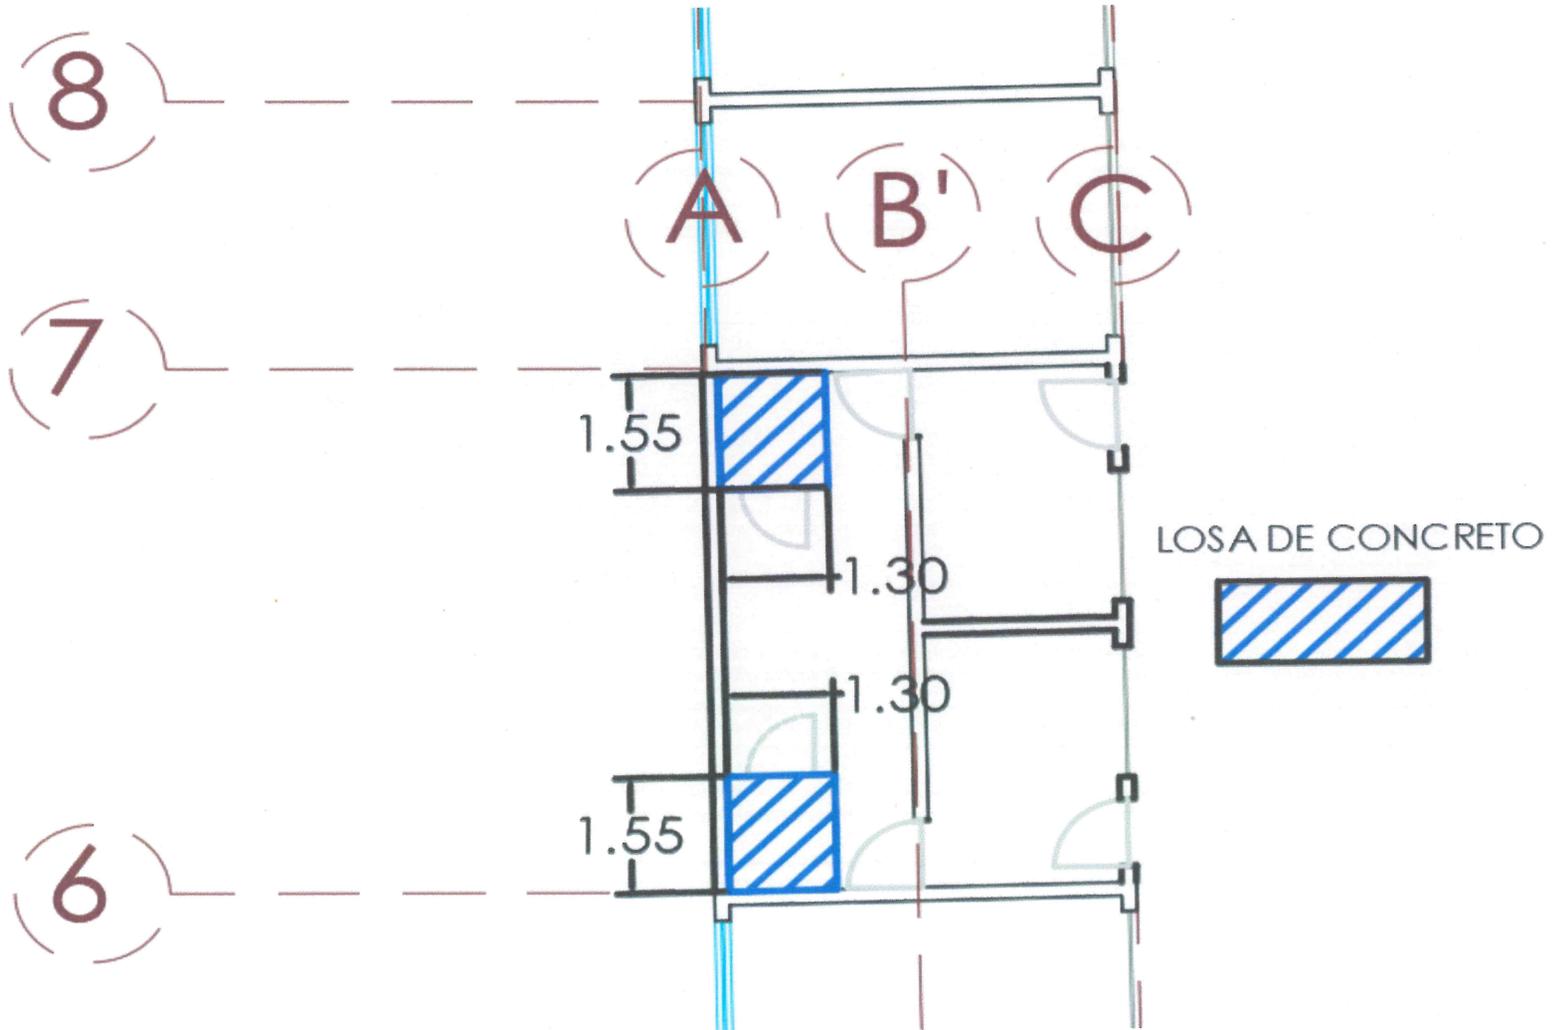

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS  RESIDENTE DE OBRA	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA:

4 DE MAYO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 29/04/2024 AL
03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Suministro y colocacion de toma de agua 1/2" con abrazadera desde tuberia principal, valvulas y conexiones, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion


Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	X-X'	1	2	1.00


Total (piezas)= 1.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

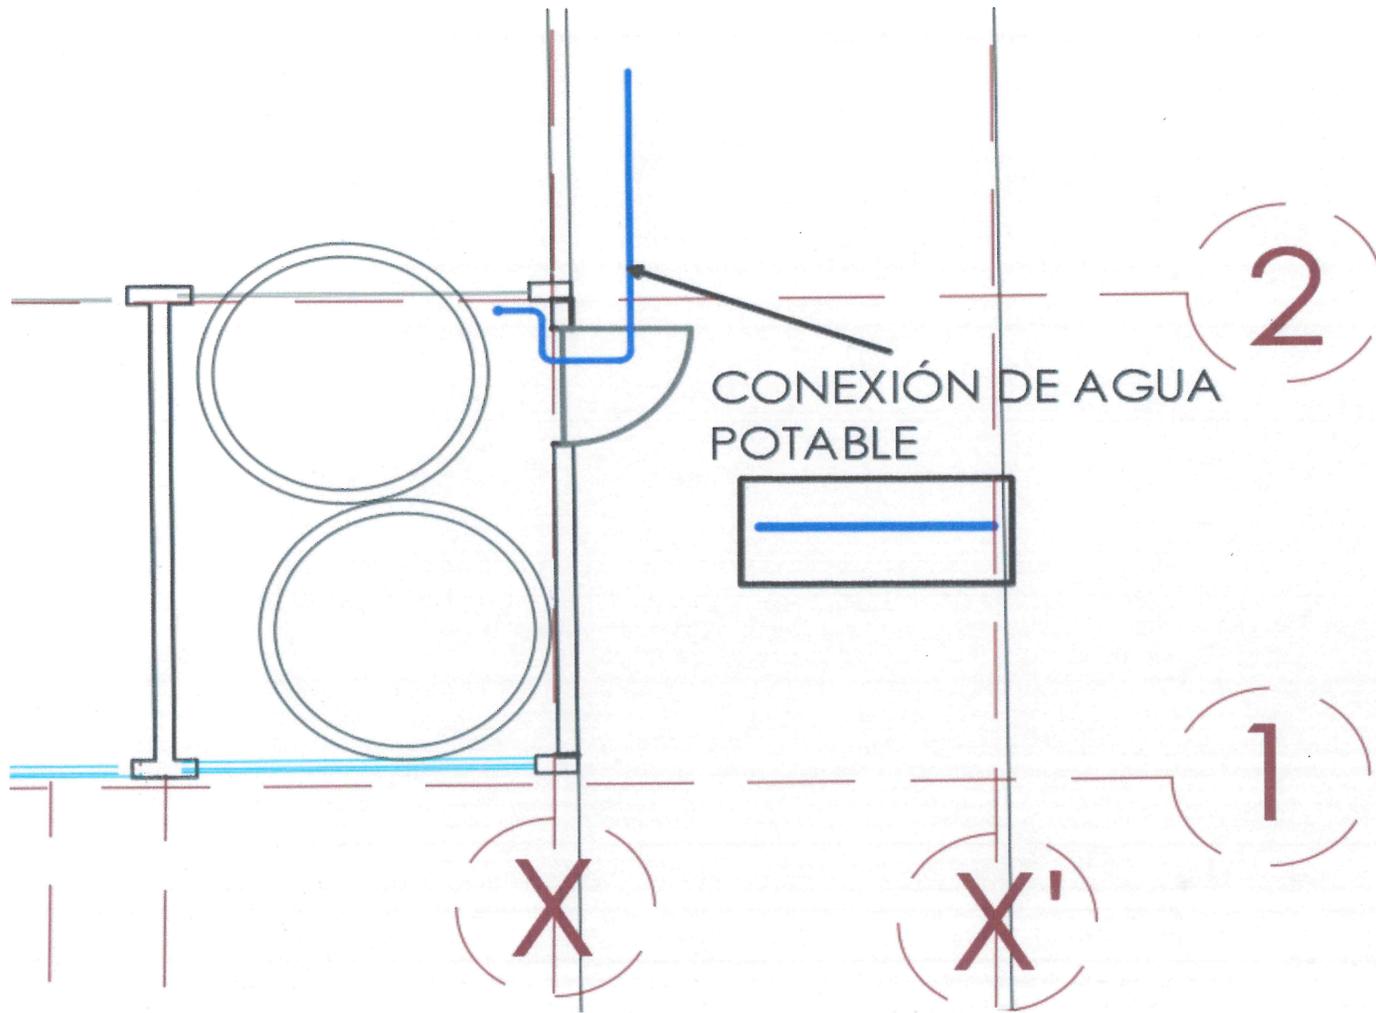

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS  RESIDENTE DE OBRA	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC


LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

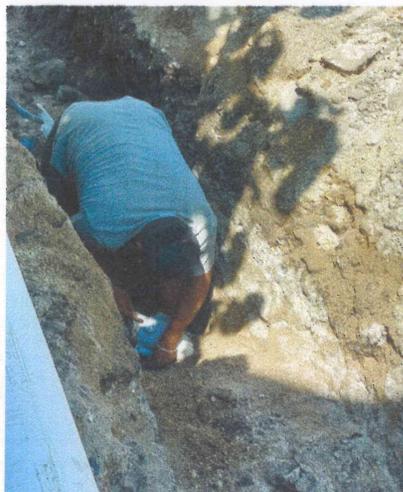

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024


NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:


Suministro y colocacion de rejillas de acero 0.60 x 0.60 m echas a base de angulo de 1" x 1/8" y solera de 1" x 3/16" con 4 partas de angulo para registros pluviales, incuye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo neceario para su correcta ejecucion


Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	3.00	D	-	1.00
pieza	3.00	E	-	1.00
pieza	3.00	G	-	1.00
pieza	3.00	K	-	1.00
pieza	3.00	M	-	1.00
pieza	3.00	O	-	1.00

Total (piezas)= 6.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

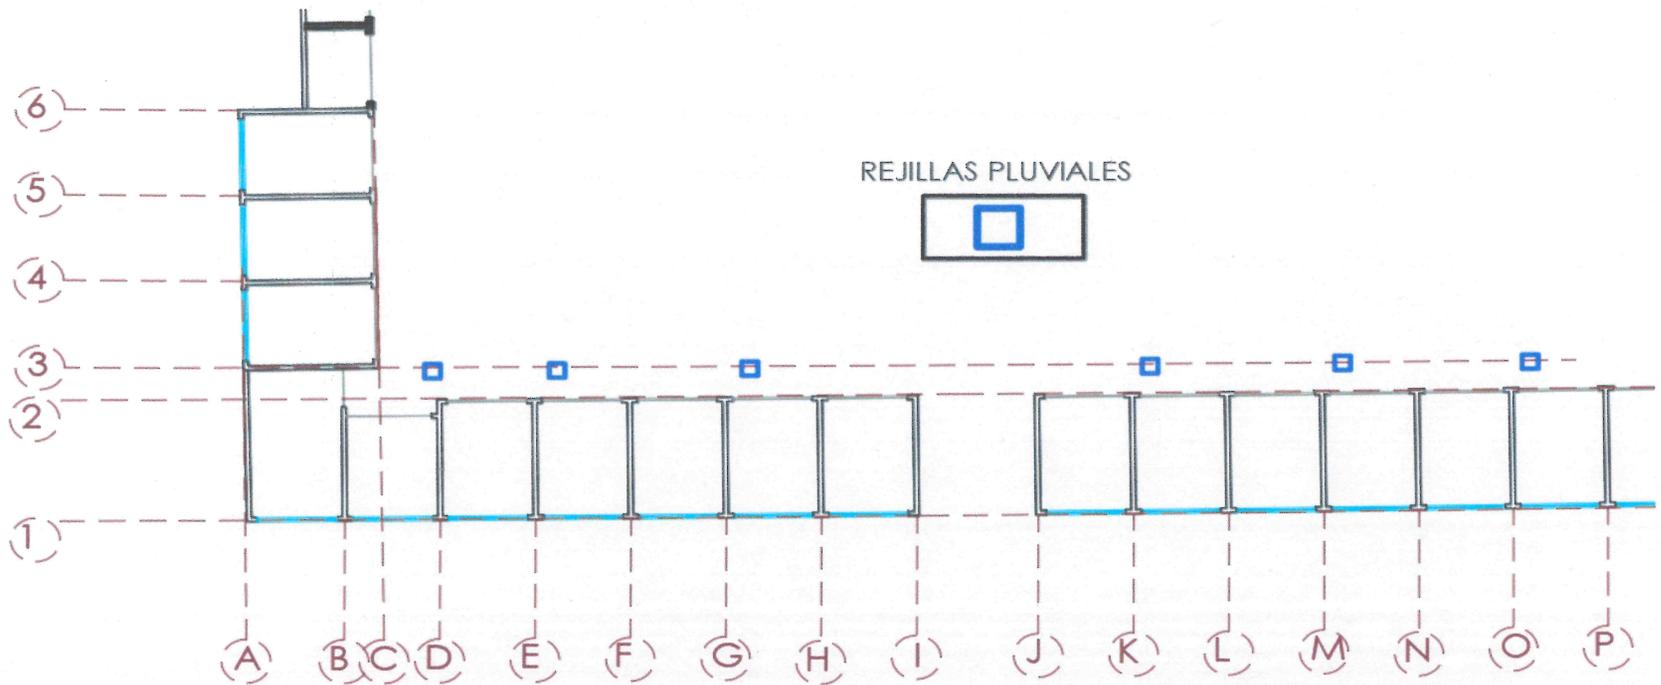

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:


DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Conexión de línea principal de drenaje de locales comerciales a pozo de visita de drenaje municipal existente, incluye: retiro de empedrado con recuperacion, retiro de adoquon con recuperacion, corte y demolición de huella de concreto, excavacion, afine de excvacion, tendido tubería de PVC sanitario de 8", conexiones, relleno con tepetate, compactacion, colocacion de empedrado, colocacion de adoquin, colado de huella de concreto, retiro de escombros, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Piezas
pieza	X-X'	2	5	1.00
Total (piezas)=				1.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 4 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA CHANTEPEC



LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/04/2024 AL 03/05/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

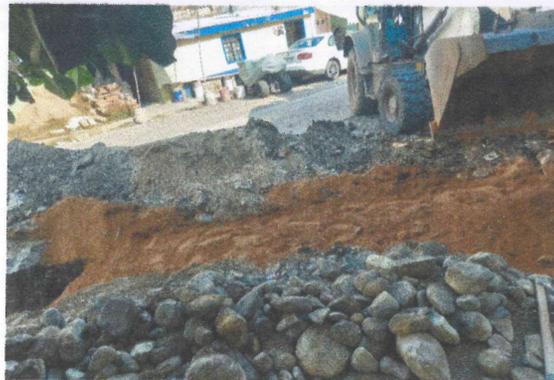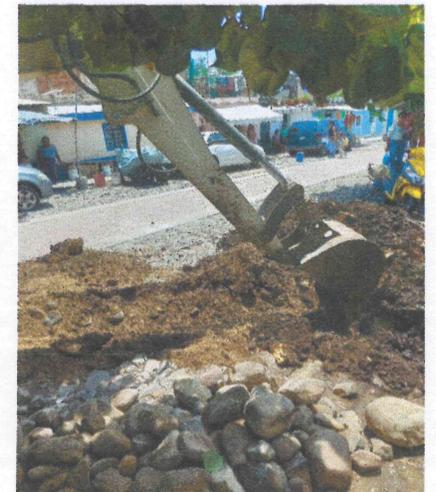

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ


[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA

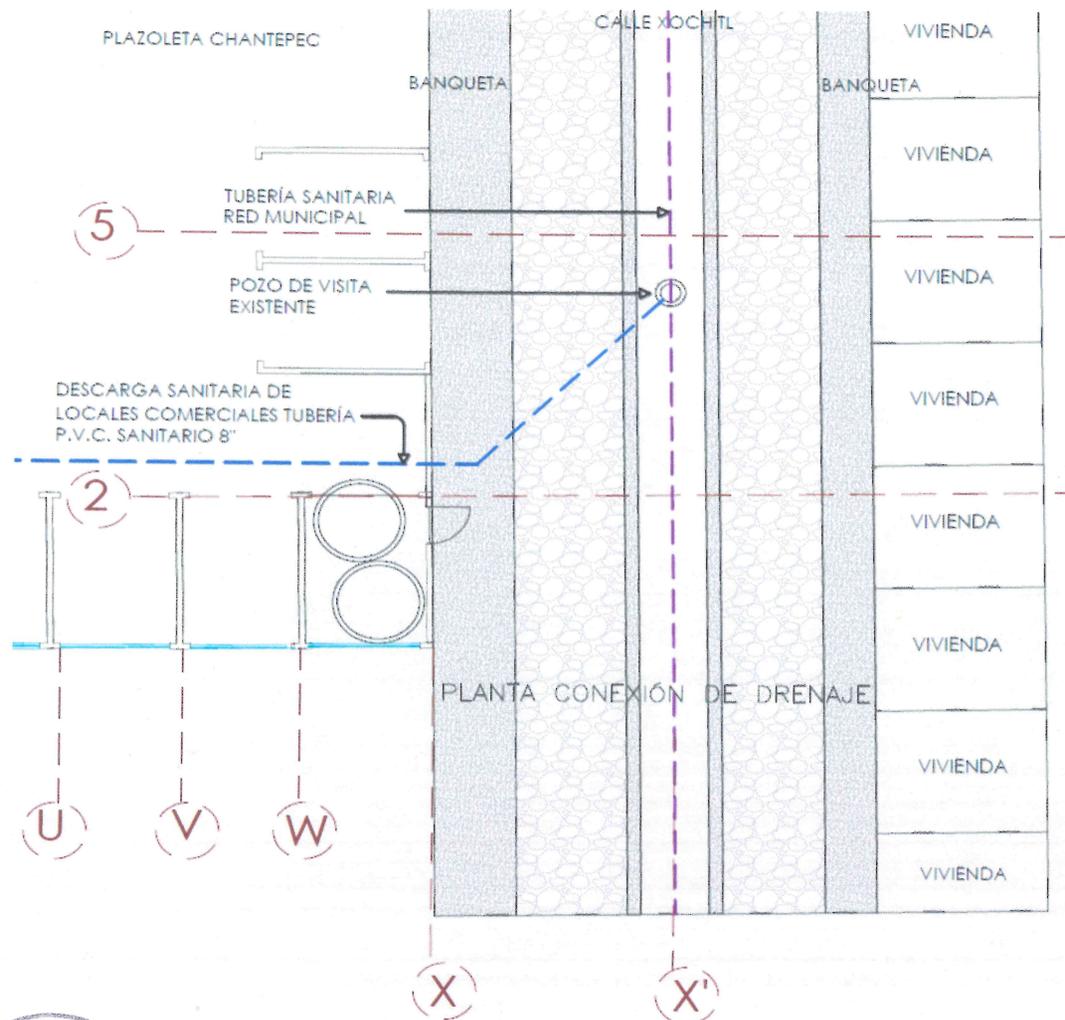

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ <i>[Signature]</i>	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ <i>[Signature]</i>	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS <i>[Signature]</i>	
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
