



LIC. BERTHA MARCELÁ GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **SOLEC ENERGY SAS, DE C.V.**, por la cantidad de; **\$699,956.66 (Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 66/100 M.N.)** por concepto de **ESTIMACIÓN 01 y FINIQUITO**, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6231-2-11.1-050-411

Contrato: GMJ 009C- OP/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
95	06/06/2024	\$607,085.11	\$704,218.72	\$4,262.06	\$699,956.66

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 01 y Finiquito
4. Minuta Término de Obra
5. Acta Entrega Recepción
6. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones
7. D32 Opinión de Cumplimiento

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.



HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024

14 JUN. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 06 DE JUNIO DEL 2024
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"



C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA JIMÉNEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.p. Archivo
D.O.P./cvch



SOLEC ENERGY

SEN2107086M0
(601) General de Ley Personas Morales
3310276917
solecenergy01@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 95
Versión: 4.0

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: (44987)
No. Certificado: 0000100000508875554

Receptor

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
MJJ850101KP8
Domicilio fiscal: 45800
Régimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2024-06-06T14:40:56
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (99) Por definir
Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Exportación: (01) No aplica

Total del CFDI: \$ 704,218.72

Table with 5 columns: Descripción, Cantidad, Valor unitario, Importe, Objeto Imp. Row 1: Pago de Estimacion No. 1(unos) FINIQUITO, relativo a la obra; "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO." MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 4,262.06 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; \$ 699,956.66

Clave de producto o servicio: 81101700 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Table with 3 columns: Impuestos trasladados del concepto, Base, Importe. Row 1: (002) IVA - Tasa 0.160000, \$ 607,085.11, \$ 97,133.61

Table with 3 columns: Impuestos trasladados del comprobante, Base, Importe. Row 1: (002) IVA - Tasa 0.160000, \$ 607,085.11, \$ 97,133.61

Importe con letra:

SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 MXN

Table with 2 columns: Subtotal, Total de impuestos trasladados, Total. Values: \$ 607,085.11, \$ 97,133.61, \$ 704,218.72



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2024-06-06T14:40:57 UUID: 61213DC8-BD30-4328-B328-9E436AA5CDE2

No. Certificado del SAT: 00001000000516053874 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

dUf5mDO1QnG1FC15IFaVwU9Te9UQJkMfP+hkjQIZf1F1GlxK2zQV+dLQJCjx7h07L6rY4ZHzKj4RGLqmJknAuPTW2O1DK1xFrPmbHLcCKQVOXkq8LrgW2X2PV6us...

Sello digital del SAT:

BH0PEgmJfi+9VJKH4Ek2frg0EInlbgKEexgk9ZpgnNBIDjauvZPv77VXP6PM/Qh2u8rCWRIxpumXJXoE9RMvh+L1aZOnis7IT7Cr4r/cMHwsCJEF1WbMFaXh376aDo3RJ...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1161213DC8-BD30-4328-B328-9E436AA5CDE212024-06-06T14:40:57IFCG840618N51dUf5mDO1QnG1FC15IFaVwU9Te9UQJkMfP+hkjQIZf1F1GlxK2zQV+dLQJCjx7h07L6rY4ZHzKj4RGLqmJknAuPTW2O1DK1xFrPmbHL...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE SOLEC ENERGY EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 44987 A LA ELECCIÓN DEL DÍA LA CANTIDAD DE \$ 704,218.72 (SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO RFC: MJJ850101KP8


#FACTURA: 95

ACEPTO (AMOS)


Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NzU1NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GEMSAwHgYDVQODDBdVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUgQURNS
U5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B
CQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25yY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzc5IENPTC4
gR1VFU1JFUK8xDjAMBGNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQGEwJNwDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIERFIE1FWE
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBUUhuRUU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE
01yZXNwb25zYWJsZSogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1Mg
QUwgQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTA5MDIyMDIyMjRlRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0y
TT0xRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0y
QKExZTT0xRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0yNTA5MDIyMDIyMjRlRm0y
1UxMR4wHAYDVQQFEExUgYyBDQVVKOTewODAzR1UxMR4wHAYDVQQFEExUgYyBDQVVKOTewODAzR1UxMR4wHAYDVQQFEExUgYy
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAQAgadDojXrRftfHdYIjRf1s7XbF1iZ0WNjMt2hq8YofI/1N8g
0CWJFjoz+Mwhw9CIX7mmJ9wP66yvc0oWzism80AjlRT77USyWS0C0pX09X3ScD8v8m49LEXqfRqcE9fqxek
D2fbTg8/CGAhS5h1lHkBMn+Qa9ZLnegZ/geudK5hhwgMjnazg2k4df7erfwG2sevCXrPfr/Y8I3MPJXLIB
Ti5NRzoejhFVBpaQX8p/HPuI1DurQem1NbmSR+82ChrV01Nrz8UV7fL4kUYrISIA4espuKdgZF2xlgumh1A
Shfhq+w5kTmt84FRRtn2/Uno5kng1ZSWzrZzobs5foxj7wIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAJAAMASGA1U
dDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcfmV0CRwc5Cp+jFOQ63QqUJb2hImrpiVY/U0xBQukYvBbg
uJrTOvODGfneJst42ZQZxFuhsHII+LM8klydl1mY2GJm384Np7vrCtmyTw5zLJtzR0NGQIEmVehE01qn769
UEFH9bc9WWM/sIVTuv5zzfifkh4CEd5L4gm/93nxFImD0ik9DcNsUoSsIOzLJ0jeF1ejaDpOZGI0LBIjnc
+F9eZjJKIFpHzG4yd1gtb9xb6ij+WdcqBJAQNywZtgn+/I8/o+Clmk1PwhxrDIHLNctJkGQZMPp0zENIa0t
UK+WaZQb01kDEBTHMcdyNzmudKoKuR8QBgpV5gAexstlOH3TU2Zs5CetUF0kzaGrwY+7PN8/PY+s73tWJbK
TZVagmcd9h5FrwfgWwylHkHsPdLir9yAeTQdZ3AefgeqY54F1jkj8WS90t4b0iK9Mvi0+4uSFZE7w0p1t6j
9tQk5hNbdqQhdvioAs4JcJGMnH9mJMPUIas8cqIbVrkf1XL04qfGf+7+q6Eo2SRbwuOFQajTTh/Dgq+2PJy
PFTXkGbHXj81L8MQJP6wbcTBVYL1d0LOYxrJ2Pd/eQjyu4JQuEK+yms/GR7lcaKMAcRJDQU4FODuM+G9f
RW/tbleezMWR7tPNCizNm1PCTqFu10tJXA4bt1V76ct2X+hEwvnk21M8=" Exportacion="01"
Fecha="2024-06-06T14:40:56" Folio="95" FormaPago="99" LugarExpedicion="44987"
MetodoPago="PPD" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000508875554"
Sello="duft5mDO1QnG1FC15fFaVwU9Te9UQtJKmFP+hkjQiZfi1F1G1xtK2zQV+dLOJcJx7h07L6rY4ZHq
zKj4RGLqmJknAuPTlw20IDK1xFrPxmblHLoCKQVOXkq8LrgW2X2PV6uscxncBrRrfdyS0cc4nMYB520PHJnc
KxETaAowz3vtKUGPlbZAFKniI6Sieh8Z90RwabCidLZhV2580V5R4npXanni6HISqVpF8sNtCcRu/PoFZ
/hs+GlsRSba0Hf65ooGmvNnQ90fnK56M39OXfI5zvtFM53fHd6M5fspBXlB/3bKW2nlygU0xFnYIg55qyCu
vv4RcZv8C17a06FCQ==" SubTotal="607085.11" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I"
Total="704218.72" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="SOLEC ENERGY" RegimenFiscal="601" Rfc="SEN2107086M0"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="45800" Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
JALISCO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MJJ850101KP8" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="81101700" ClaveUnidad="E48"
Descripcion="Pago de Estimacion No. 1(uno) FINIQUITO, relativo a la obra;"ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL
LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO." MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 4,262.06 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; \$
699,956.66" Importe="607085.11" ObjetoImp="02" Unidad="Unidad de servicio"
ValorUnitario="607085.11">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>



```
<cfdi:Traslado Base="607085.11" Importe="97133.61" Impuesto="002"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="97133.61">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="607085.11" Importe="97133.61" Impuesto="002"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2024-06-06T14:40:57" NoCertificadoSAT="00001000000516053874"
RfcProvCertif="FCG840618N51"
SelloCFD="dUft5mD01QnG1FC15fFaVwU9Te9UQtJKmfP+hkjQiZfi1F1GlxTK2zQV+dL0JCjx7h07L6rY4
ZHqzKj4RGLqmJknAuPTlw20IDK1xFrPxmbHL0cKQVOXkq8LrgW2X2PV6uscxncBrRrfydS0cc4nMYB520PH
JncKxETaAowz3vtKUgPlbZAFKniI6Siehih8Z9ORWabCidLZhV2580V5R4npXanni6HISqVpF8sNtCcRu/P
oFZ/hs+GlsRSba0Hf65ooGmvNnQ90fnK56M390XfI5zvtFM53fHd6M5fspBX1B/3bKW2nlygU0xFnYIg55q
yCuvv4RcZv8C17a06FCQ=="
SelloSAT="BH0PEgmJfi+9VJKH4Ek2frg0EtnIbgKEexgk9ZpgnNBfDjauvyZPv77VXP6PM/Qh2u8rCWRfX
pumXJXoE9RMvh+L1aZQniz7IT7Cr4r/icMHwsCjEF1WbMFaXh376aDo3RJNpn5lLgwV0hi/9b+f4QUZ7fp
k9+dwSJqPw+YABoGYkRySNkwpGScpctq9bhFO4GcrMsfyKdbCI8CZhUngYZFYnyhMxDoMt0iR2UiJ6ZVEmr
8AfmDRs/9CWbSUy0880fwgJmTPI2dLudyKxZ6s/eK5NHbA3z2dnp/P0he7Hbtfme1hGScrZ/QBV1UPIpHkj
iqYmLVCR5alt+jXwycjw==" UUID="61213DC8-BD30-4328-B328-9E436AA5CDE2" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd"/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>
```



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEN2107086M0	SOLEC ENERGY	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61213DC8-BD30-4328-B328-9E436AA5CDE2	2024-06-06T14:40:56	2024-06-06T14:40:57	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$704,218.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Imprimir



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

SOLEC ENERGY, S.A.S. DE C.V.

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C. SEN2107086M0



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	No. DE CONTRATO: GMJ 009C-OP/2024	HOJA DE RELACIÓN	HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: SOLEC ENERGY, S.A.S. DE C.V.	ESTIMACIÓN No.	01 (UNO)FINIQUITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	PERÍODO DE TRABAJO:	
	UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL	DEL: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024	FECHA: 03 DE MAYO DE 2024

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES	
	ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO					
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 852,412.47
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ 245,327.36
					SUBTOTAL	\$ 607,085.11
					I. V. A. 16%	\$ 97,133.61
					SUMA	\$ 704,218.72
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 4,262.06
					NETO A PAGAR	\$ 699,956.66
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL	EL CONTRATISTA	
ASIGNACIÓN	\$	817,757.87	\$ 130,841.26	\$ 948,599.13		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$	852,412.47	\$ 136,386.00	\$ 988,798.47		
ACUMULADO ANTERIOR			\$ -	\$ -		
ACUMULADO A LA FECHA	\$	852,412.47	\$ 136,386.00	\$ 988,798.47		
SALDO EXCEDENTE	-\$	34,654.60	-\$ 5,544.74	-\$ 40,199.34		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO		
ANTICIPO %	\$	245,327.36	\$ 39,252.37	\$ 284,579.73	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN	\$	245,327.36	\$ 39,252.37	\$ 284,579.73		
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$	-	\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$	245,327.36	\$ 39,252.37	\$ 284,579.73		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$	-	\$ -	\$ -	C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
 PERÍODO: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024
 OBRA : ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO
 UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATISTA : SOLEC ENERGY, SAS DE CV
 FECHA: 03 DE MAYO DE 2024



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA														
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO	
ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO														
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCALADO DE POSTE EN LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO CON CRUCETA VOLADA	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ -	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ -	
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE, CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO (POSTE PARTICULAR)	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ -	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ -	
3	TENDIDO DE LINEA MEDIA TENSION CON CABLE ACSR CAL 1/0 POR FASE 20 MTS POR LINEA	M	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	\$ 155.00	\$ 9,300.00	\$ -	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00	\$ -	
4	MONTAJE EN BASE Y CONEXIONES GENERALES EN TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220-127	SERV	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 12,500.01	\$ 12,500.01	\$ -	\$ 12,500.01	\$ 12,500.01	\$ -	
5	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220- 127V CON NORMA J	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 69,050.00	\$ 69,050.00	\$ -	\$ 69,050.00	\$ 69,050.00	\$ -	
6	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (INCLUYE, HERRAJES PARA TENSIONADO DE LINEA ELECTRICA, TIRANTE, APARTARRAYOS, COTACIRCUITOS, CONECTOR PERICO, CONECTOR ESTRIBO, ALAMRE DE ALUMINIO Y DE COBRE, CABLE ACSR 3F-3H 1/0, ABRAZADERA UC Y ABRAZADERA UL, BAJANTES DE TIERRA, GRAPA RAL, OJO RE, AISLADOR DE SUSPENSION, PERNOS DOBLE ROSCA, TORNILLO MAQUINA, PLACA 1 PC, ABRAZADERA 1 BS ABRAZADERA 2BS, BASE 7-200, TUBO CONDUIT ROSCADO 2" COPLER ROSCADO, MONITOR 2, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL, ETC.	JGO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 132,698.87	\$ 132,698.87	\$ -	\$ 132,698.87	\$ 132,698.87	\$ -	
7	GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE, CON ENTREGA DE 4 PLANOS, DIAGRAMA UNIFILAR, PLANO PREPROYECTO, PLANO DEPRORED Y TRASLADOS	SERV	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	
8	PAGOS A CFE (APROBACION DE PROYECTO Y CONEXIÓN DEL SERVICIO)	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	
9	CUARTO DE CONTROL PARA EQUIPOS DE CONTROL DE MOTORES MANO DE OBRA	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	38,239.00	\$ 38,239.00	\$ -	\$ 38,239.00	\$ 38,239.00	\$ -	
10	MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA, LADRILLOS, GRAVA, CEMENTO, MORTERO, CASTILLOS	JGO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	86,758.00	\$ 86,758.00	\$ -	\$ 86,758.00	\$ 86,758.00	\$ -	
11	PUERTA PARA CUARTO DE CONTROL	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 5,758.00	\$ 5,758.00	\$ -	\$ 5,758.00	\$ 5,758.00	\$ -	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signatures and marks]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
 PERÍODO: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024
 OBRA : ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO
 UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATISTA : SOLEC ENERGY, SAS DE CV
 FECHA: 03 DE MAYO DE 2024



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO													
12	INSTALACION DE ARRANCADORES DE MOTOR PARA CONTROL DE CARCAMO	JGO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 389,953.99	\$ 389,953.99	\$ -	\$ 389,953.99	\$ 389,953.99	\$ -
EXTRAORDINARIOS													
EXT-1	PAGO A CFE PARA APROBACION, SUPERVISION, CONEXIÓN Y SERVICIO	SERV			1.00	1.00	-1.00	\$ 44,154.60	\$ -	\$ -	\$ 44,154.60	\$ 44,154.60	-\$ 44,154.60
SUMA								\$ 817,757.87	\$ -	\$ -	\$ 852,412.47	\$ 852,412.47	-\$ 34,654.60
IVA								\$ 130,841.26	\$ -	\$ -	\$ 136,386.00	\$ 136,386.00	-\$ 5,544.74
TOTAL								\$ 948,599.13	\$ -	\$ -	\$ 988,798.47	\$ 988,798.47	-\$ 40,199.34

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
 REPRESENTANTE LEGAL

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCALADO DE POSTE EN LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO CON CRUCETA VOLADA

Reporte Fotográfico

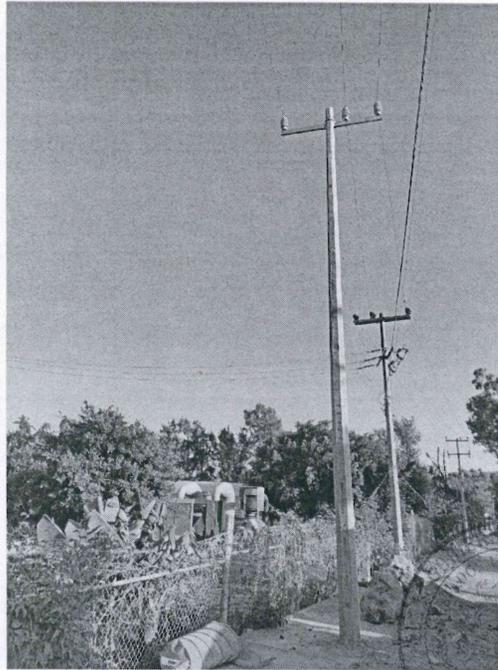

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCALADO DE POSTE EN LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO CON CRUCETA VOLADA

CROQUIS

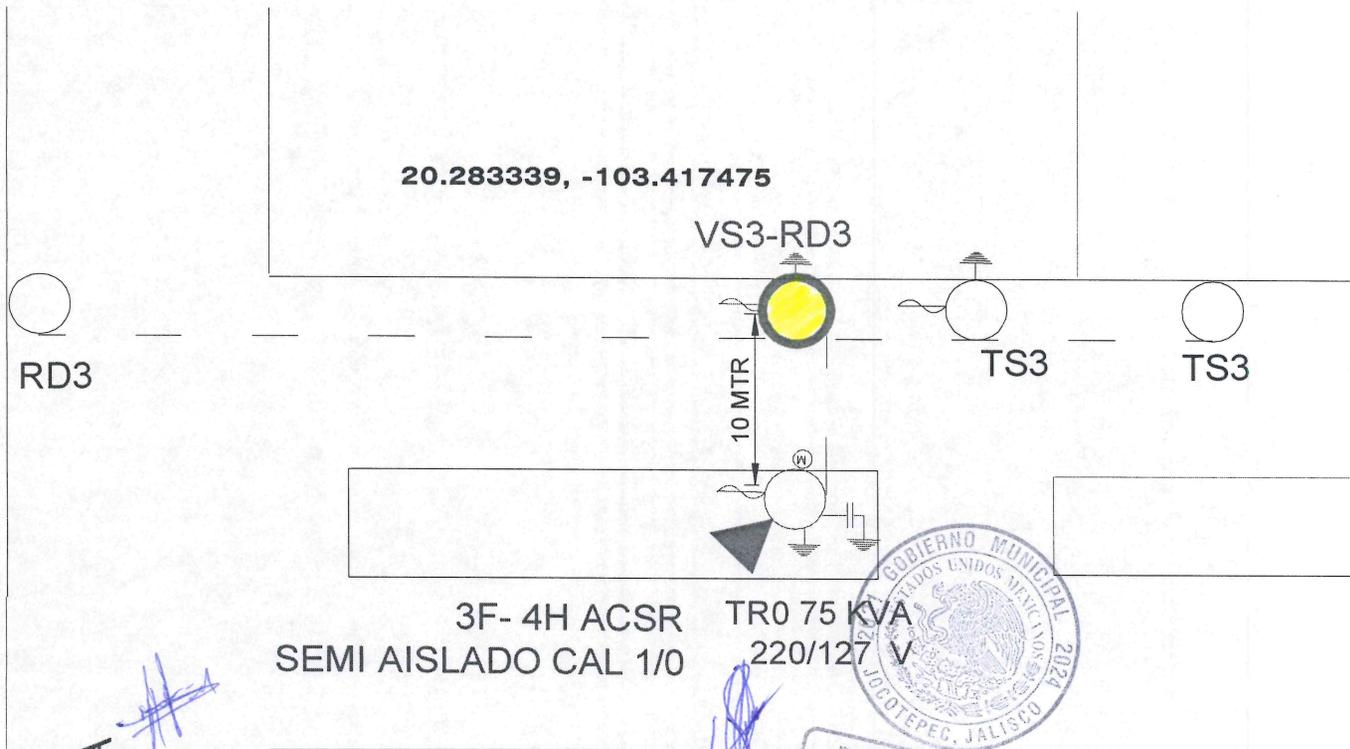

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE, CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO (POSTE PARTICULAR)

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA PROM	PZA	TOTAL
PZA					1.00	1.000
					SUMA	1.000

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO



MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE, CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO (POSTE PARTICULAR)

Reporte Fotográfico

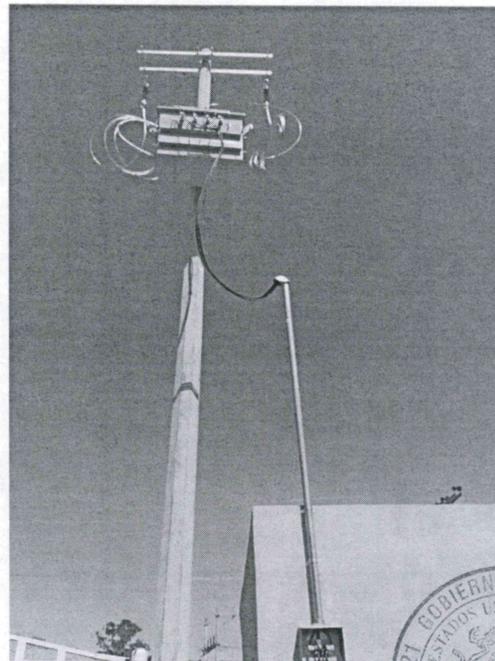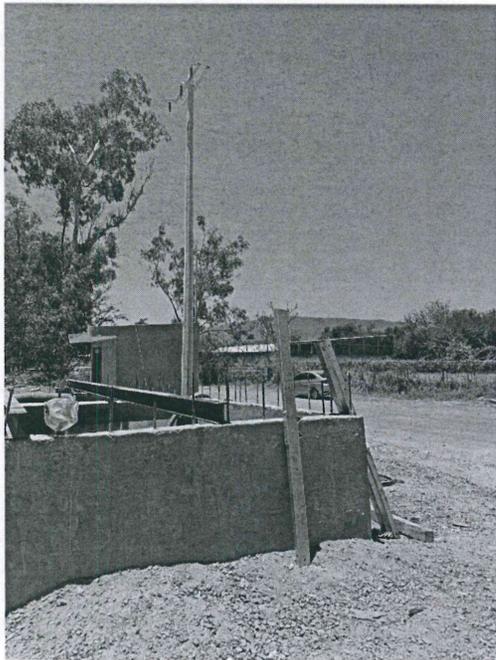

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE, CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO (POSTE PARTICULAR)

CROQUIS

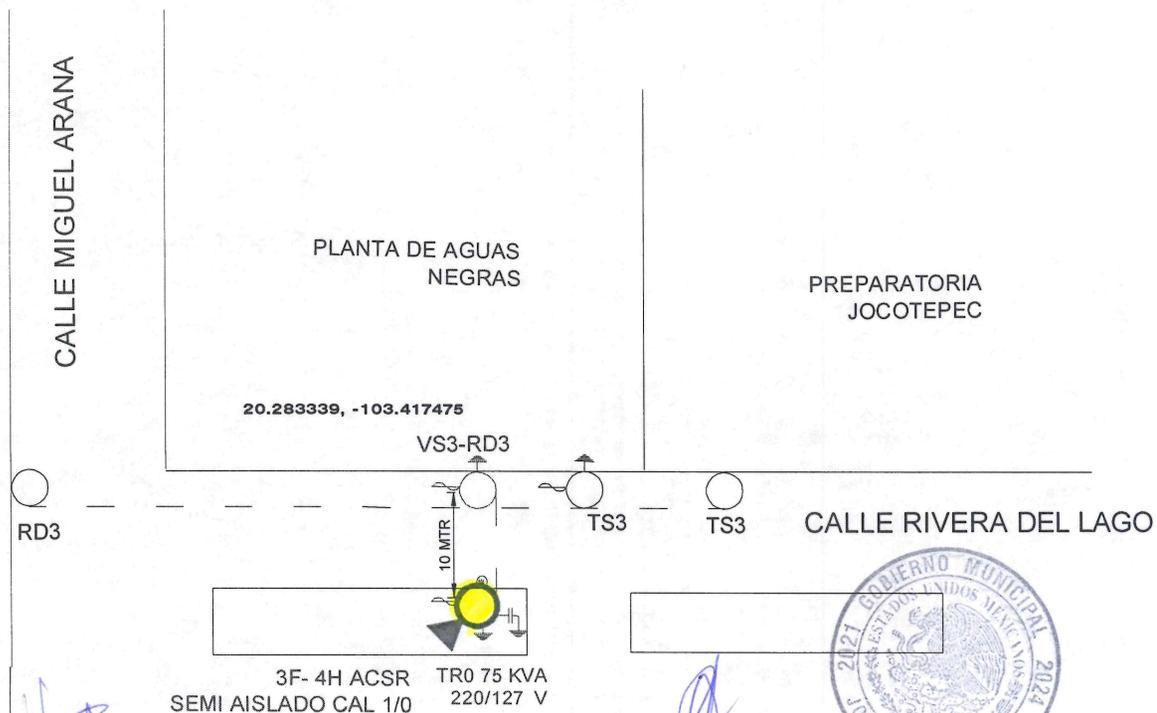

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO






GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.


ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

3


TENDIDO DE LINEA MEDIA TENSION CON CABLE ACSR CAL 1/0 POR FASE 20 MTS POR LINEA

Reporte Fotográfico

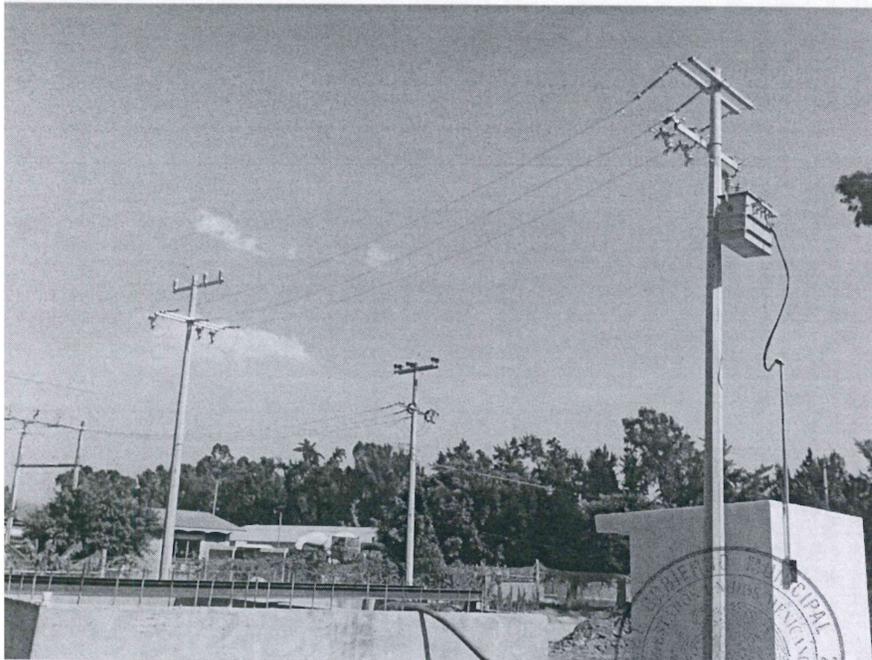

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO






GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

3

TENDIDO DE LINEA MEDIA TENSION CON CABLE ACSR CAL 1/0 POR FASE 20 MTS POR LINEA

CROQUIS

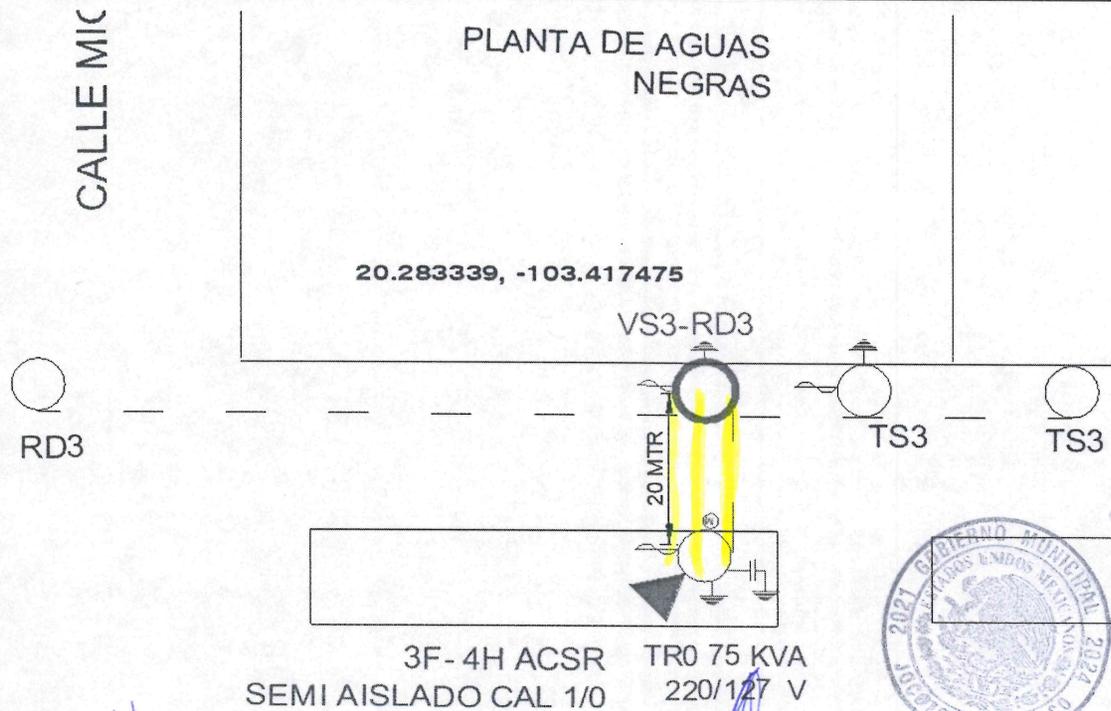

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

4

MONTAJE EN BASE Y CONEXIONES GENERALES EN TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220-127


Reporte Fotográfico



ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA




C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

4

MONTAJE EN BASE Y CONEXIONES GENERALES EN TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220-127

CROQUIS

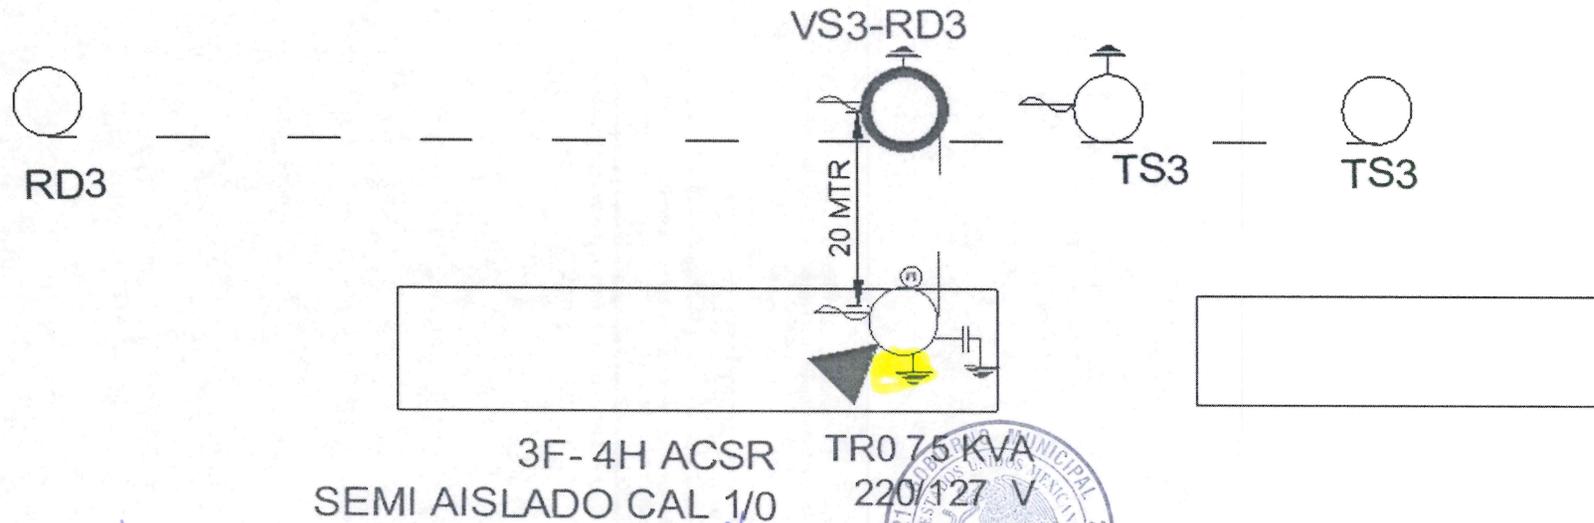

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO






GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

5

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220- 127V CON NORMA J

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA PROM	PZA	TOTAL
PZA					1.00	1.000
					SUMA	1.000

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.



ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220- 127V CON NORMA J

5

Reporte Fotográfico

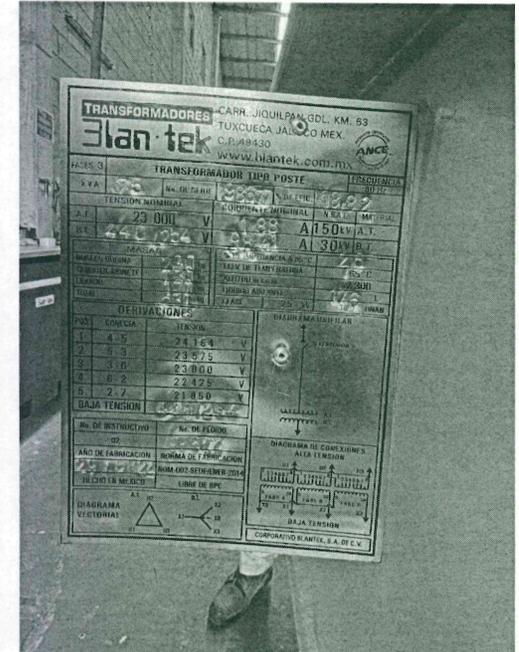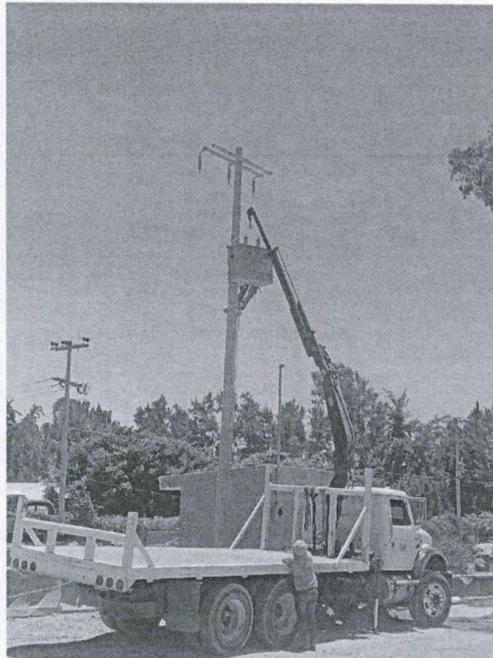

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO






GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.


ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220- 127V CON NORMA J

5

CROQUIS

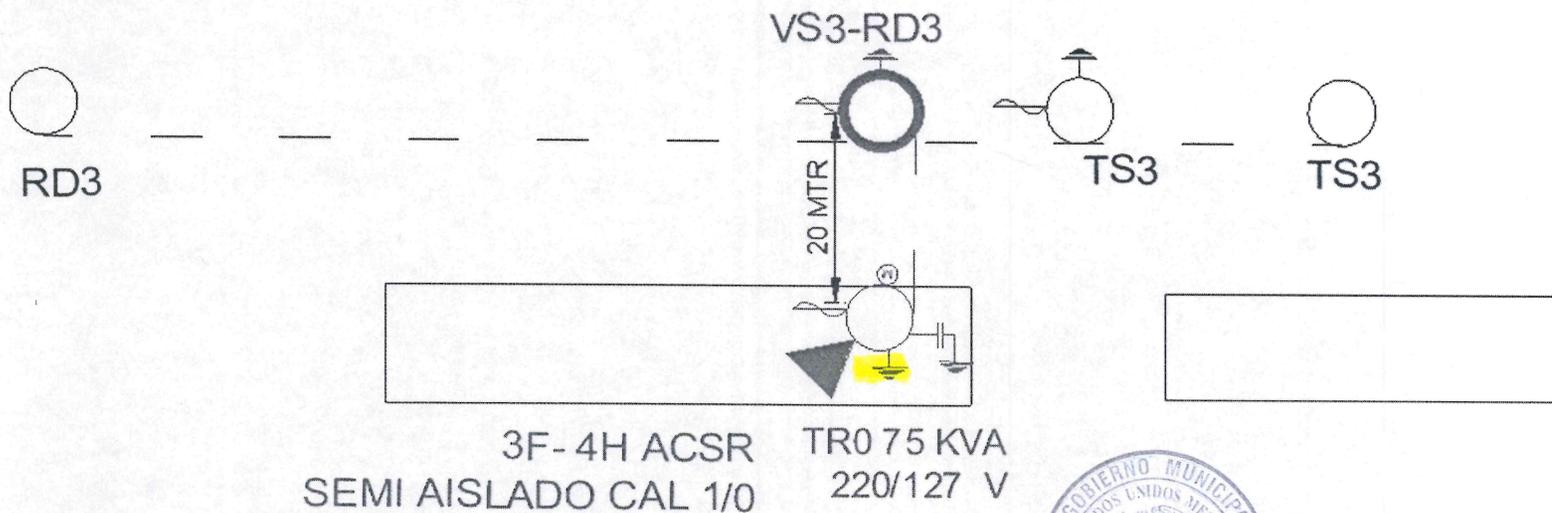

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

MUNICIPIO: Jucotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

6

SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (INCLUYE, HERRAJES PARA TENSIONADO DE LINEA ELECTRICA, TIRANTE, APARTARRAYOS, COTACIRCUITOS, CONECTOR PERICO, CONECTOR ESTRIBO, ALAMRE DE ALUMINIO Y DE COBRE, CABLE ACSR 3F-3H 1/0, ABRAZADERA UC Y

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA PROM	PZA	TOTAL
JGO					1.00	1.000
					SUMA	1.000



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024


6

SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (INCLUYE, HERRAJES PARA TENSIONADO DE LINEA ELECTRICA, TIRANTE, APARTARRAYOS, COTACIRCUITOS, CONECTOR PERICO, CONECTOR ESTRIBO, ALAMRE DE ALUMINIO Y DE COBRE, CABLE ACSR 3F-3H 1/0, ABRAZADERA UC Y

Reporte Fotográfico



ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

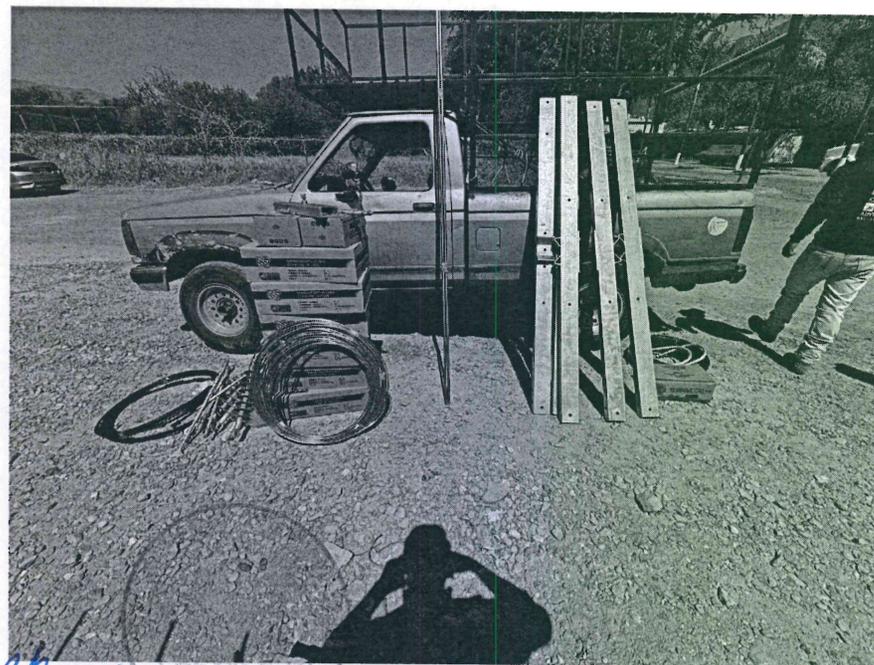


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

6

SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (INCLUYE, HERRAJES PARA TENSIONADO DE LINEA ELECTRICA, TIRANTE, APARTARRAYOS, COTACIRCUITOS, CONECTOR PERICO, CONECTOR ESTRIBO, ALAMRE DE ALUMINIO Y DE COBRE, CABLE ACSR 3F-3H 1/0, ABRAZADERA UC Y

CROQUIS

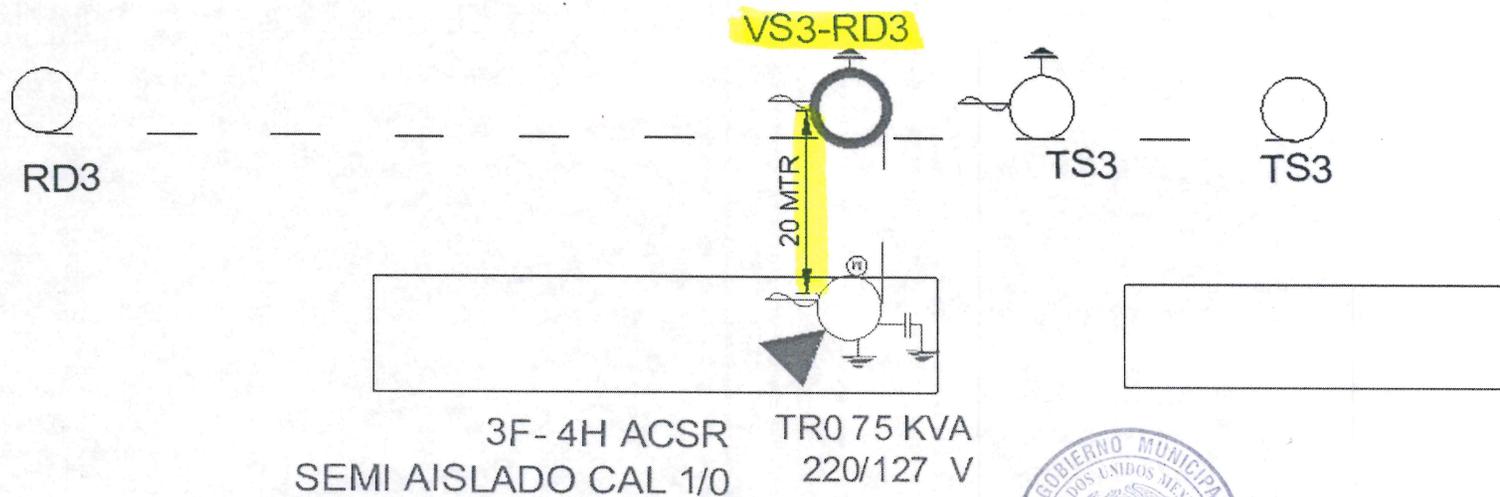

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



Descripción del proyecto: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Análisis de precios unitarios

Clave: 6

Unidad: JGO

Cantidad: 1.00

Precio unitario: 132,698.87

Total 132,698.87

SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (INCLUYE, HERRAJES PARA TENSIONADO DE LINEA ELECTRICA, TIRANTE, APARTARRAYOS, COTACIRCUITOS, CONECTOR PERICO, CONECTOR ESTRIBO, ALAMRE DE ALUMINIO Y DE COBRE, CABLE ACSR 3F-3H 1/0, ABRAZADERA UC Y ABRAZADERA UL, BAJANTES DE TIERRA, GRAPA RAL, OJO RE, AISLADOR DE SUSPENSION, PERNOS DOBLE ROSCA, TORNILLO MAQUINA, PLACA 1 PC, ABRAZADERA 1 BS ABRAZADERA 2BS, BASE 7-200, TUBO CONDUIT ROSCADO" COPLE ROSCADO, MONITOR 2, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL, ETC.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	2M	CABLE DE THW -LS CALIBRE 1/0	m	49.000000	125.00	6,125.00
	3M	CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA	m	26.000000	110.00	2,860.00
	B-7200	BASE DE MEDICION 7-200	pza	1.000000	20,000.00	20,000.00
	7M	CABLE DE COBRE CALIBRE 2	m	55.000000	96.37	5,300.35
	8M	TORNILLOS DOBLE ROSCA	pza	16.000000	15.00	240.00
	9M	TORNILLO MAQUINA	pza	30.352000	7.00	212.46
	10M	VARILLA A TIERRA DE 3 MTS X 3/8"	pza	2.000000	235.00	470.00
	11M	CONECTOR PARA VARILLA	pza	2.000000	7.00	14.00
	12M	CONECTOR MECANICO	pza	8.000000	8.00	64.00
	13M	CONECTOR PERICO	pza	12.000000	148.90	1,786.80
	14M	CONECTOR ESTRIBO	pza	6.000000	141.04	846.24
	15M	GRAPA RAL	pza	12.000000	156.00	1,872.00
	16M	OJO RE	pza	12.000000	60.00	720.00
	17M	AISLADORES DE SUSPENSION	pza	12.000000	150.00	1,800.00
	18M	ALUMINIO SUAVE	m	34.000000	15.00	510.00
	19M	CORTACIRCUITOS	pza	6.000000	1,461.30	8,767.80
	20M	LISTON FUSIBLE 3 Y 5 A	pza	6.000000	97.99	587.94
	21M	APARTARRAYOS 23 K	pza	3.000000	2,245.00	6,735.00
	22M	CRUCETA PR 200	pza	6.000000	1,298.26	7,789.56
	23M	CRUCETA PT 200	pza	2.000000	2,500.00	5,000.00
	AIS-22 PD	AISLADOR 22 PD	pza	3.000000	5,500.00	16,500.00
	24M	CONECTOR PURO DE UN 1/0	pza	12.000000	121.00	1,452.00
	25M	PIJAS DE 3/8	pza	25.000000	8.27	206.75
	26M	TUBO DE MEDIA	pza	1.000000	120.00	120.00
	27M	TUBO DE 2 PULGADAS CONDUIT	pza	1.000000	155.00	155.00
	28M	MUFA DE 2 PULGADAS	pza	1.000000	156.98	156.98
	29M	CONTRA PARA TUBO DE 2 PULGADAS	pza	1.000000	12.00	12.00
	30M	CONTRA PARA TUBO DE 1 1/2 PULGADAS	pza	1.000000	8.00	8.00
	33M	COPLE PARA TUBO ROSCADO DE 2 PULGADAS	pza	1.000000	73.90	73.90



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO REPRESENTANTE LEGAL



DIVISION JALISCO
ZONA CHAPALA
OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA

"2024 Año de Felipe Carrillo Puerto,
Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio No. : 0474/2024
Solicitud No. 00000423/2024

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Asunto : Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación.

Fecha Oficio: 2024-04-11

0962

11 ABR. 2024

Con relación a la solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No. 00000423 de fecha 2024-04-04 para su servicio a nombre de MUNICIPIO DE JOCOTEPEC que se localiza en CALLE RIBERA DEL LAGO # 123|||, en la colonia JOCOTEPEC entre y , Municipio de JOCOTEPEC, Estado de JALISCO, con el presente, nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

1.- CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes:

Carga conectada inicial	0 kVA 0 kW
Carga conectada final	53 kVA 47 kW
Demanda inicial	0 kVA 0 kW
Demanda final	53 kVA 47 kW
Tensión de suministro	23 kV
Tolerancia en la tensión	± 5 %
Frecuencia	60 HERTZ
Tolerancia en la frecuencia	± 0,5 %
Número de fases e hilos	3F4H
Tarifa	O-M8
La medición de energía y potencia se efectuará en el nivel de	Baja Tensión

2.- OBRAS NECESARIAS

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, las obras específicas , cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS

INTERCALADO DE POSTE PCR 13-600 CON EST TS3N, SUM E INST DE UNA EST 3CF3A, SUM E INST DE UN SISTEMA DE TIERRA, ROTULADO DE POSTE DE ACUERDO A NORMA	\$29,549.37
1 MEDIDOR KL28	\$9,400.88



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024

9

CUARTO DE CONTROL PARA EQUIPOS DE CONTROL DE MOTORES MANO DE OBRA

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA PROM	PZA	TOTAL
PZA					1.00	1.000

CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	PIEZAS	SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
EXCAVACION PARA CIMENTACION	3.56	0.60	0.80		2.00	3.42	5.73	M3
	2.41	0.60	0.80		2.00	2.31		
CIMENTACION DE PIEDRA	3.56	0.60	0.80		2.00	3.42	5.73	M3
	2.41	0.60	0.80		2.00	2.31		
LOSA DE DESPLANTE DE 30 CM	3.56	2.41					8.58	M2
DALA DE DESPLANTE	3.56				2.00	7.12	11.94	M
	2.41				2.00	4.82		
MURO DE BLOCK	3.56			2.68	2.00	19.08	32.00	M2
	2.41			2.68	2.00	12.92		
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM	3.56	2.41				8.58	8.58	M2
APLANADOS	3.56			2.68	4.00	38.16	72.58	M2
	2.41			2.68	4.00	25.84		
	3.56	2.41				8.58		
PRETEL DE 25 CM	3.56			0.25	2.00	1.78	2.99	M2
	2.41			0.25	2.00	1.21		
LADRILLO DE AZOTEA	3.56	2.41				8.58	8.58	M2
PINTURA	3.56			2.68	4.00	38.16	72.58	M2
	2.41			2.68	4.00	25.84		
	3.56	2.41				8.58		

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024

9

CUARTO DE CONTROL PARA EQUIPOS DE CONTROL DE MOTORES MANO DE OBRA

CROQUIS

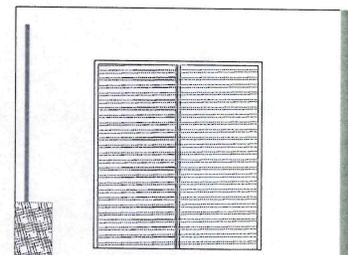

CUARTO DE MAQUINAS



[Handwritten signature]

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA


[Handwritten signature]

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GÓBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

CUARTO DE CONTROL PARA EQUIPOS DE CONTROL DE MOTORES MANO DE OBRA

9

Reporte Fotográfico

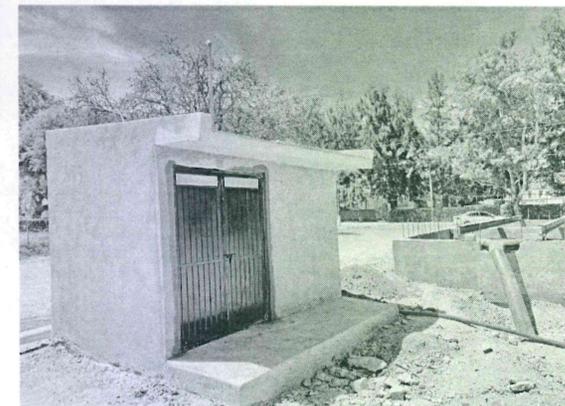

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
CONTRATACIONES PUBLICAS

Descripción del proyecto: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOGOTEPEC, JALISCO

Análisis de precios unitarios

Clave: 10

Unidad: JGO

MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA, LADRILLOS, GRAVA, CEMENTO, MORTERO, CASTILLOS

Cantidad: 1.00

Precio unitario: 86,757.99

Total 86,757.99

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	MAT-ARERIO	ARENA DE RIO	M3	28.000000	350.00	9,800.00
	00720	GRAVA DE 1/2" ó 3/4" BUENA CALIDAD.	M3	14.000000	400.00	5,600.00
	00101	CEMENTO GRIS.	TON	5.000000	4,700.00	23,500.00
	MORTERO	MORTERO EN SACO DE 50 KG	TON	3.000000	4,000.00	12,000.00
	ARMEX11/32	CASTILLO 11/32 15 X 20 X 4	pieza	20.000000	380.00	7,600.00
Total de Materiales						58,500.00
Equipo						
H	AMAIN-003	Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos, motor agasolina-eléctrico de 1460 lt.	hora	44.331578	260.99	11,570.10
Total de Equipo						11,570.10
Costo directo						70,070.10
Indirectos de campo					12.0000%	8,408.41
Utilidad					10.0000%	7,847.85
Cargos adicionales					0.5000%	431.63
Precio unitario						86,757.99

(* OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN *)




ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA, LADRILLOS, GRAVA, CEMENTO, MORTERO, CASTILLOS

10

Reporte Fotográfico



ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.



ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024

10

MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA, LADRILLOS, GRAVA, CEMENTO, MORTERO, CASTILLOS

CROQUIS

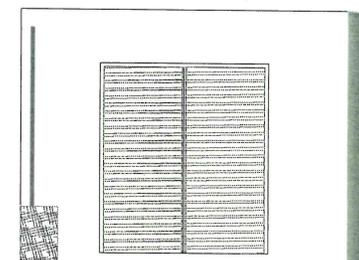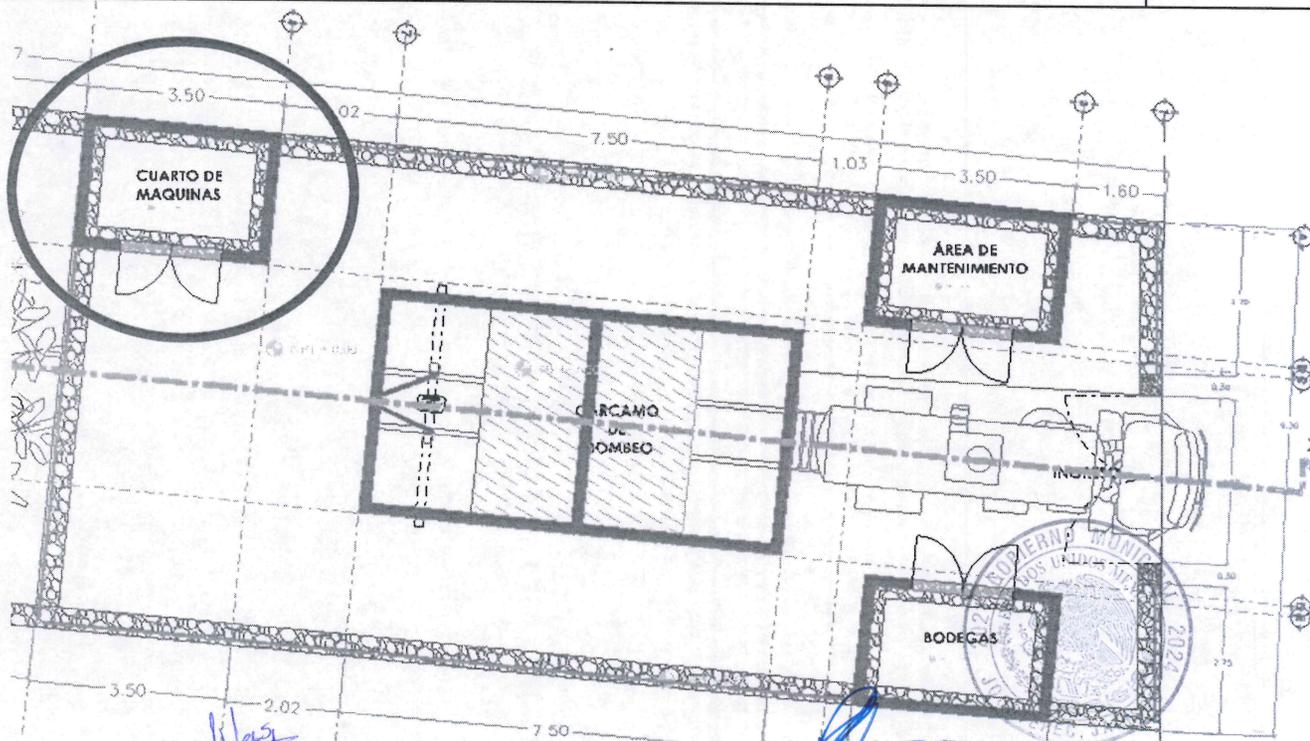

CUARTO DE MAQUINAS

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO



R.F.C. SEN2107086M0

EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

11 PUERTA PARA CUARTO DE CONTROL

Reporte Fotográfico

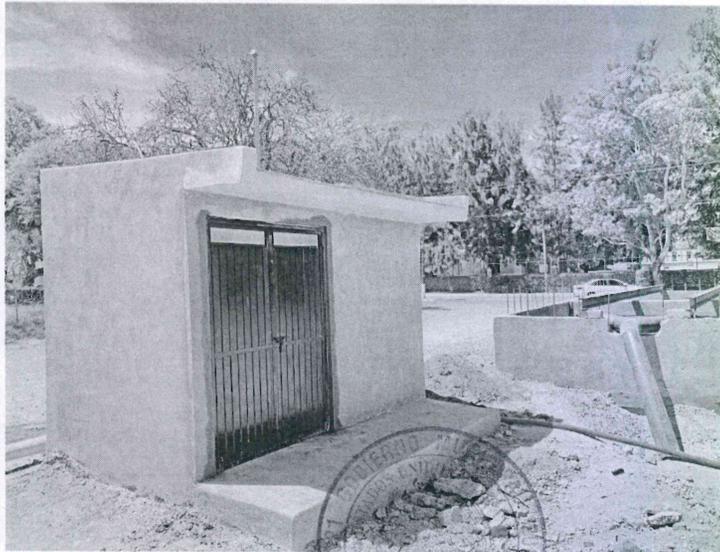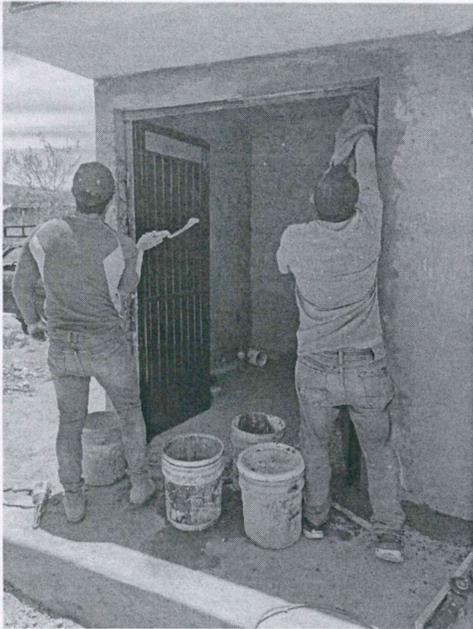

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

11

PUERTA PARA CUARTO DE CONTROL

CROQUIS

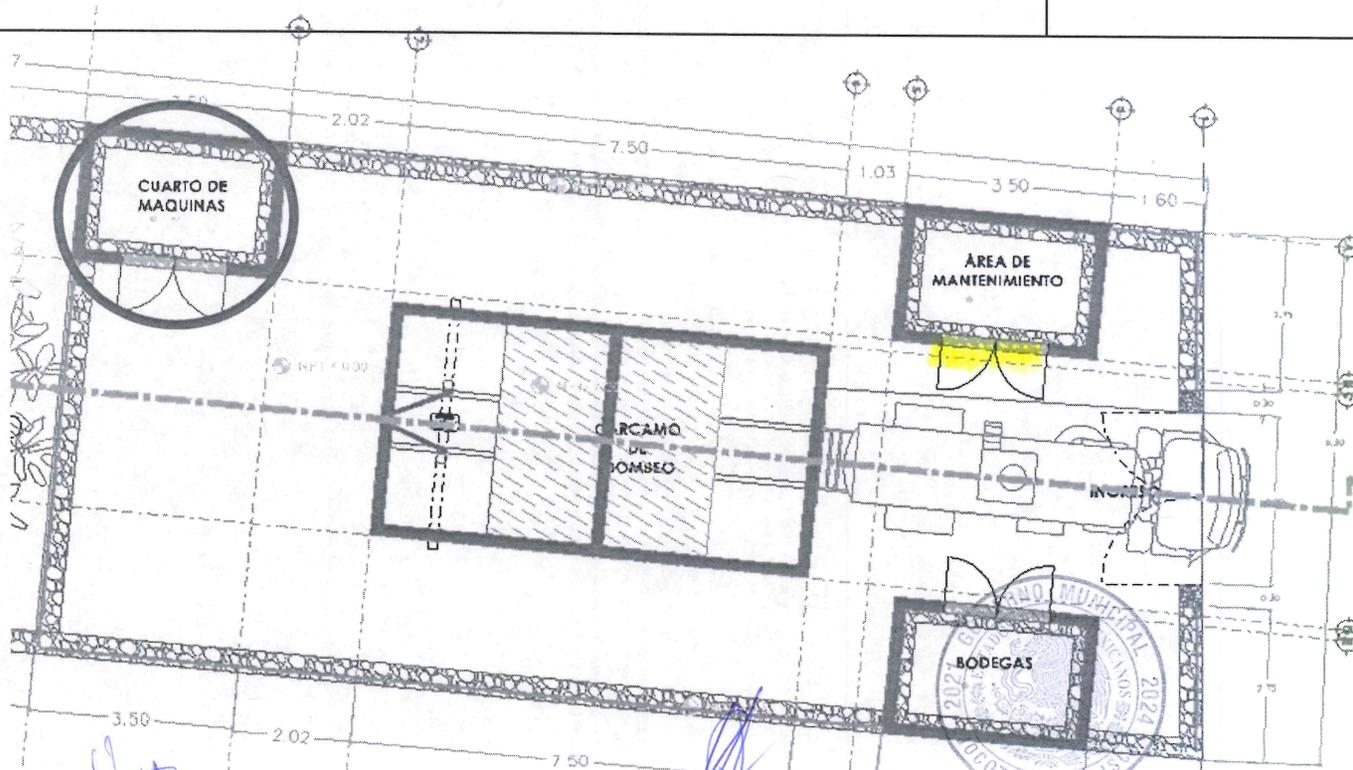

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086MO



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO

MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.


PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024

12

INSTALACION DE ARRANCADORES DE MOTOR PARA CONTROL DE CARCAMO

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA PROM	PZA	TOTAL	
JGO					1.00	1.000	SIEMENS 40 HP VOLTAJE 440
					SUMA	1.000	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

C. ISLA SOCORRO #2613 COL. VILLA VICENTE GUERRERO C.P. 44987 GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. SEN2107086M0



EMPRESA: SOLEC ENERGY S.A.S. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2024

OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO


LOCALIDAD: Cabecera Municipal
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024

12 INSTALACION DE ARRANCADORES DE MOTOR PARA CONTROL DE CARCAMO

Reporte Fotográfico

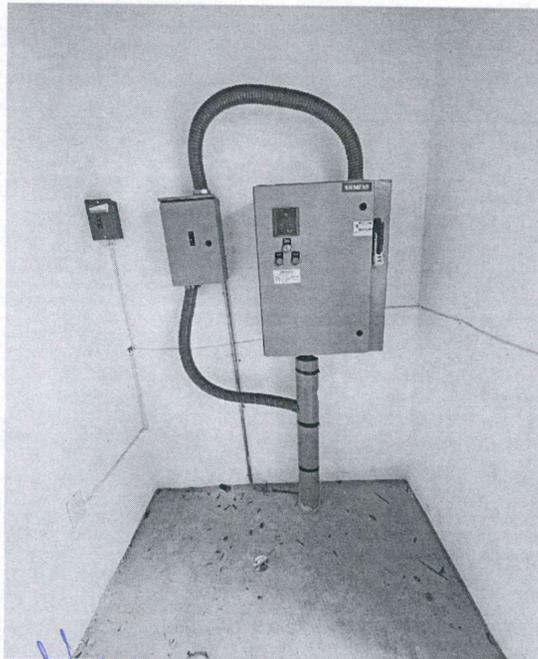

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



LOCALIDAD: Cabecera Municipal

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) FINIQUITO


MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: DEL 02 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024

INSTALACION DE ARRANCADORES DE MOTOR PARA CONTROL DE CARCAMO

12

CROQUIS

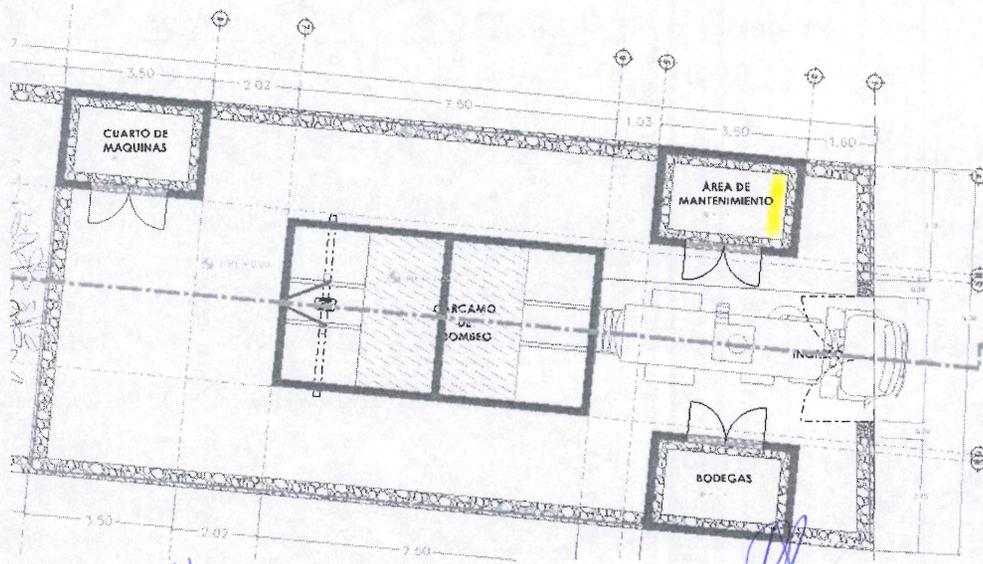

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
EL CONTRATISTA

C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIVISION JALISCO
ZONA CHAPALA
OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA

"2024 Año de Felipe Carrillo Puerto,
Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio No. : 0474/2024
Solicitud No. 00000423/2024

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Asunto : Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación. 0962

Fecha Oficio: 2024-04-11

11 ABR. 2024

Con relación a la solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No. 00000423 de fecha 2024-04-04 para su servicio a nombre de MUNICIPIO DE JOCOTEPEC que se localiza en CALLE RIBERA DEL LAGO # 123|||, en la colonia JOCOTEPEC entre y , Municipio de JOCOTEPEC, Estado de JALISCO, con el presente, nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

1.- CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes:

Carga conectada inicial	0 kVA 0 kW
Carga conectada final	53 kVA 47 kW
Demanda inicial	0 kVA 0 kW
Demanda final	53 kVA 47 kW
Tensión de suministro	23 kV
Tolerancia en la tensión	± 5 %
Frecuencia	60 HERTZ
Tolerancia en la frecuencia	± 0,5 %
Número de fases e hilos	3F4H
Tarifa	O-M8
La medición de energía y potencia se efectuará en el nivel de	Baja Tensión

2.- OBRAS NECESARIAS

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, las obras específicas , cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS

INTERCALADO DE POSTE PCR 13-600 CON EST TS3N, SUM E INST DE UNA EST 3CF3A, SUM E INST DE UN SISTEMA DE TIERRA, ROTULADO DE POSTE DE ACUERDO A NORMA	\$29,549.37
1 MEDIDOR KL28	\$9,400.88

