



ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E  
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: V SURESTE  
PROGRAMA: FONDEREG  
EJERCICIO: 2018  
NOMBRE DEL PROYECTO:  
MUNICIPIO: JOCOTEPEC  
NOMBRE DE LA ACCION:

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

MONTO ASIGNADO: \$ 2'724,218.37

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MOVILIDAD, PEATONAL, ALUMBRADO PUBLICO Y COLOCACION DE BANCAS Y BOTES PARA BASURA.

Fecha de Inicio: 11 DE JUNIO DE 2018      Fecha de Termino Real: XXX  
Metas Proyectadas: 3338.90 M2      Metas Alcanzadas: XXX  
Beneficiarios Directos: 4,000      Beneficiarios Indirectos: 4,000

AVANCE	JUNIO		JULIO		AGCSTO		SEPTBRE		OCTUBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Fisico	10%										10.0%
Financiero	0%										0.0%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FISICO:

FABRICACION DE BASES EN AREAS PEATONALES

DESCRIPCIÓN DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:

Situación de la Obra:    No Iniciada (    )      Terminada sin Operar: (    )  
                                  En Proceso ( X    )      Terminada y Operando: (    )  
                                  Suspendida (    )

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Coordinador Regional

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 15 de JUNIO de 2018



PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

SUB SECRETARIA DE PLANEACION  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

REGION

CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA

PROGRAMA: FONDEREG  
EJERCICIO: Fondereg 2018  
NOMBRE DEL PROYECTO:  
MUNICIPIO: JOCOTEPEC LOCALIDAD: JOCOTEPEC  
NOMBRE DE LA ACCION:

MONTO ASIGNADO: \$ 2'724,218 37


ANTES

INICIO



PROCESO

FINAL

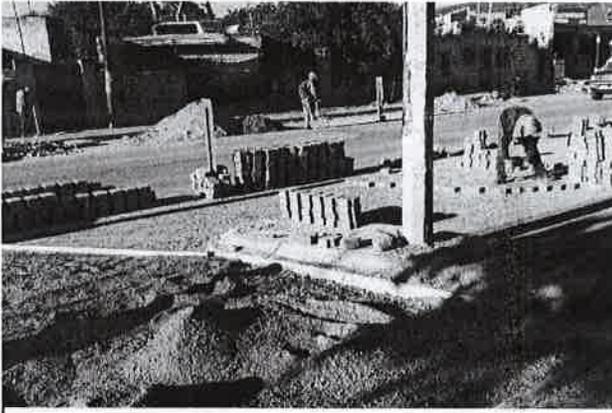

GOBIERNO DEL ESTADO  
REGIÓN No. V SURESTE

GOBIERNO MUNICIPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO  
COORDINADOR REGIONAL

*[Handwritten signature]*

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Cargo Director de Obras Públicas



SELLO MPAL

DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

Fecha de reporte a 15 de JUNIO de 2018
